



VINÇOTTE CERTIGO - Association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE -
Siège social : Diamant Building - Boulevard A. Reyers 80 - B-1030 Bruxelles
Numéro d'entreprise : BE 0821.076.888 - Internet : www.vincotte.com
 Safety, quality and environmental services

Contrat géré par : **SIEGE DU BRABANT**
Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde
Tél. : - Fax : - E-Mail :
Personne à contacter :

• Nos coordonnées
Rapport N° : AUD / 19 / 30296339 / 00 / FR / 000
Réf. client : BTOCAUD
Réf. contrat :

Multi Construction

Molenweidestraat 24
9070 Heusden
Belgique

• Vos coordonnées
Ref. :

• Données d'intervention
Lieu : Oude Houtlei 13 - appartement L6 - à 9000 Gent
Date : 14/10/2013
Effectuée par : AV4334 - CLARINVAL CAROLINE

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

INSTALLATION

Nom : Multi Construction Prénom : bvba
Adresse : Oude Houtlei 13 - appartement L6 CP: 9000 Commune : Gent
Tél :

- Propriétaire ou gestionnaire

idem

- Responsable de l'exécution du travail

Nom : EGEM Prénom : SCS
N° TVA : BE BE 0845.451.010

- Type de local

Unité d'habitation

BASE DE L'EXAMEN

- Règlement : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)
- Art 270 : mise en usage
- Art 86

CONCLUSION

- La nouvelle installation est conforme au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE).
- Le dispositif différentiel général a été plombé.
- L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 14/10/2038.(*)

(*): Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation. Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Ing. J. Winder
Directeur Général

CONTENU DE L'EXAMEN

- Contrôle visuel

- Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs.
- Etat (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe.
- Matériel fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens.
- Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent.
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas.
- Continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection.

- Mesures - tests

- Résistance de dispersion de la prise de terre : 1.12 Ohm.
- Isolement général : 276 MOhm.

DONNÉES GÉNÉRALES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Données du distributeur

N° EAN :	541448860009436804
Compteur kWh n° :	31499255
Index jour :	3
Index nuit :	9
Protection branchement :	50 A

- Données de l'installation

Installation conçue pour une tension nominale de :	230 V
Courant nominal maximum :	63 A
Câble d'alimentation du tableau principal - type :	EXVB
Câble d'alimentation du tableau principal - section :	4 x 10 mm ²
Type de prise de terre :	boucle de terre

- Description de l'installation

Dispositif différentiel général :	63A/300mA
Nombre de tableaux :	1
Nombre de circuits terminaux :	15
Schéma(s) de position :	voir annexe(s)
Schéma(s) unifilaire(s) :	voir annexe(s)

INFRACTIONS - REMARQUES


- Nouvelle installation

R-O-F	Remarque : l'inspection a été réalisée sur les parties visibles et accessibles de l'installation
R-O-F	Remarque : compteur GRD placé mais non raccordé au moment de la visite (test dispositif DiFFs + test boucles de défaut non testable)

- Installation existante

AUTRE(S) ANNEXE(S)

PRISE TRIPLE SALON

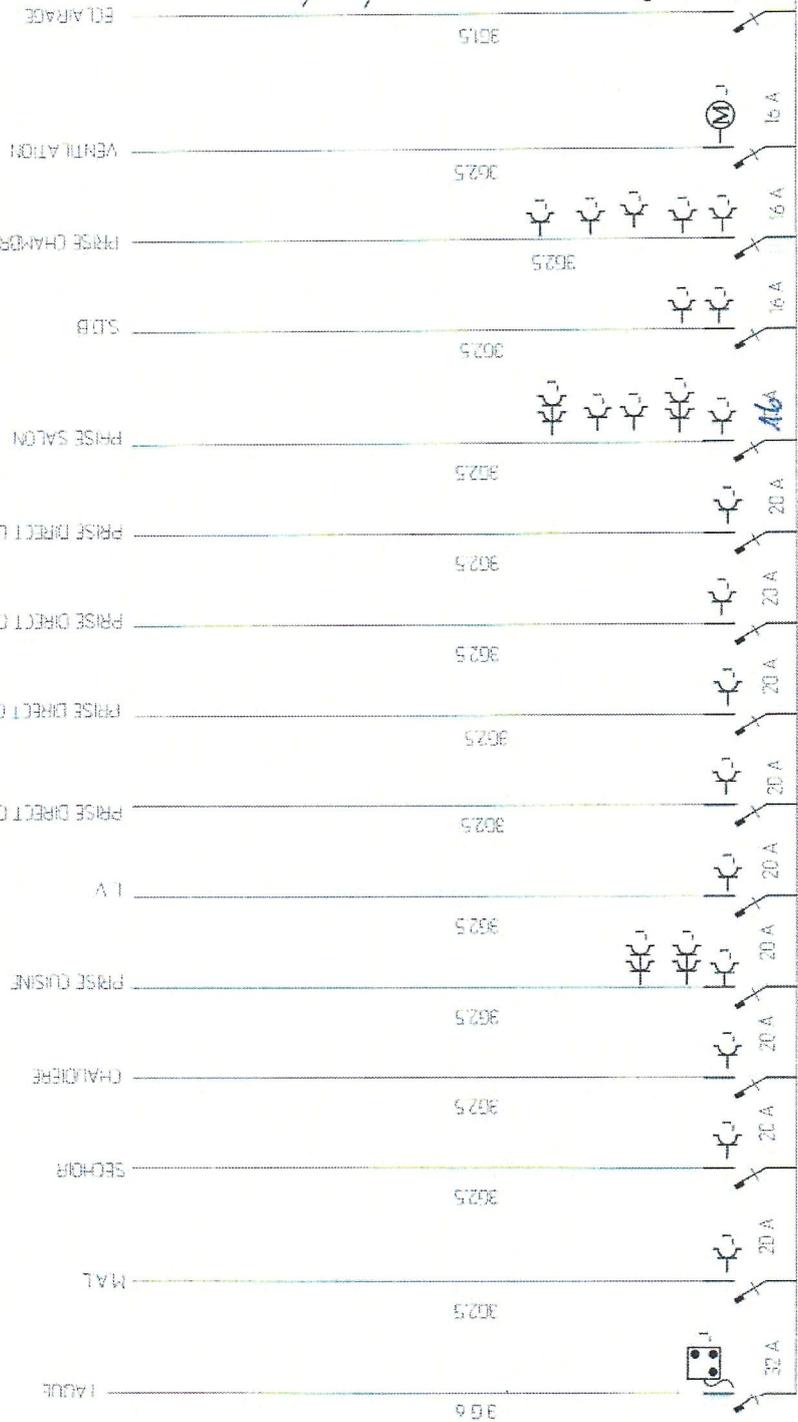

VINCOTTE
 Caroline CLARINVAL
 nr.4334
 Project Engineer
 GSM 0491/35.69.31

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

APPARTEMENT 10

INSTALLATEUR
 Naam/Nom ESEM SCS
 BTW/ TVA 0845-451-010
 Datum/Date 23-09-2013
 Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE
 Organis. -
 Naam/Nom VINCOTTE
 Datum/Date
 Handtek/Sign

WERF/HANTIER
 Naam/Nom COLLEGE HOTEL
 Straat/Rue Oude Markt 13
 Gemeen/Comm 9000 GENT
 Handtek/Sign

2X270V
FIX-O-CAD
 WYNNEDIGER
 02541

Schéma d'implantation L6.


EGEM SCS
Rue de BRAY, 30

7120 Estinnes

TVA : 0845 451 010

VINCOTTE
Caroline CLARINVAL
nr.4334
Project Engineer
GSM 0491/35.69.31

Multi construction
Molon Weidestraat, 24
9070 Heusden.

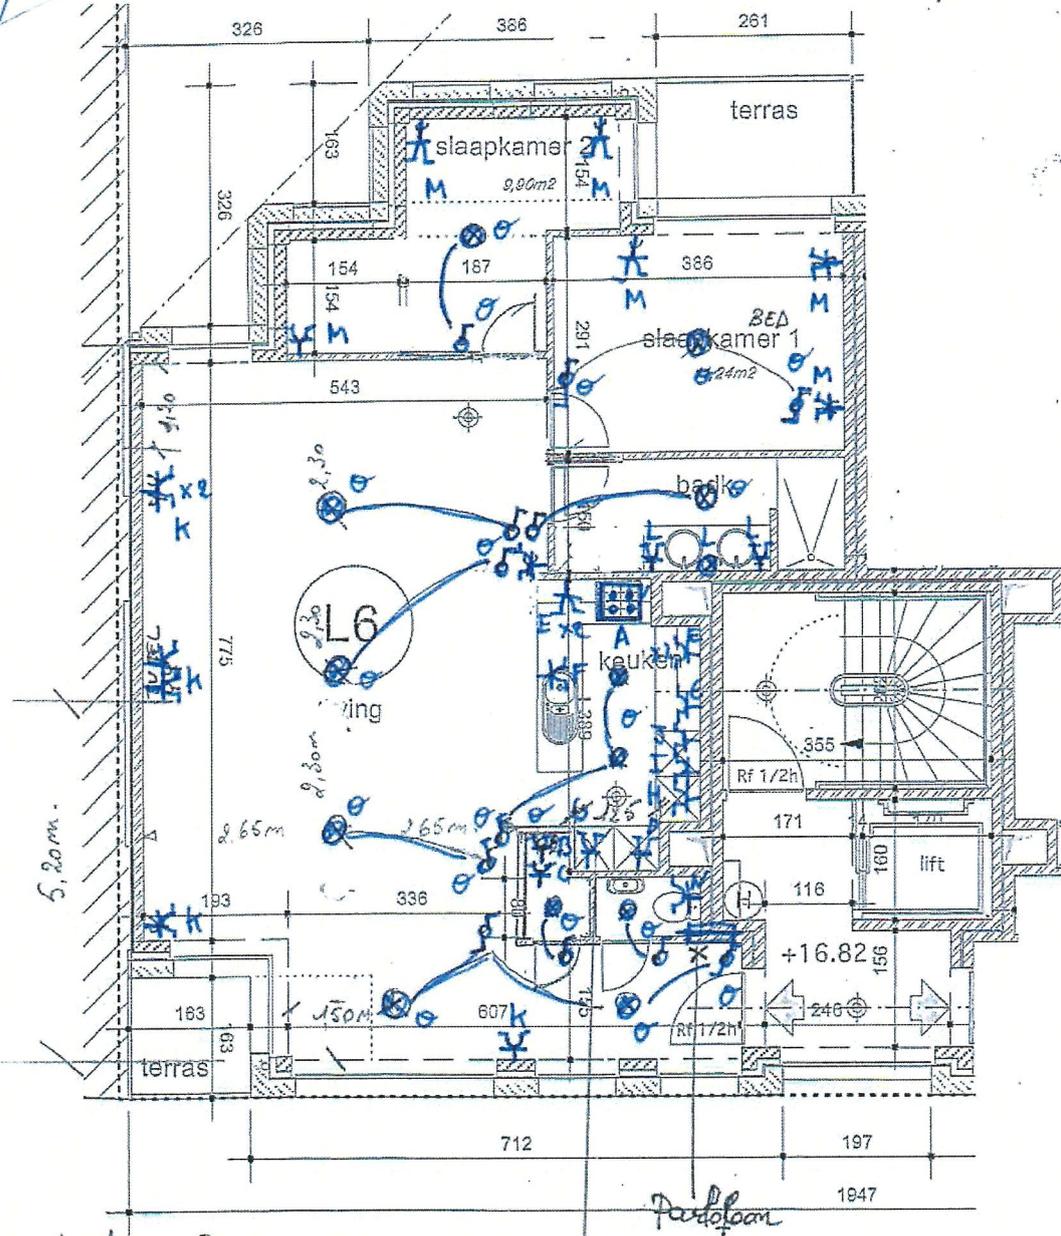

- geen TV en T&Z in slaapkamer 1
- bed 1,80m breed.
- lichtpunt badkamer, plafond, midden vth meubel
- schakelaar tablet lamp Britenysje + lampje
- living, 3 spots in het plafond te voorzien.

PLAN 3de VERDIEPING

frigo + diepvries zie plan Bruynseel.
