



Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Resa-Jecteb
le 19/12/2014



C I B
N° 63228

Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse
Vilvoorde: 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88

T.V.A. BE 0406.671.312

Compte Bancaire : 340-0298168-28

cibic@skynet.be

CONFIDENTIEL

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT

Rapport N° : 11/14.3.18/8	Personne responsable de l'exécution du travail (Nom-Prénom) :
Date du Contrôle : 18-3-2014	SAVLLY
Propriétaire (Nom-Prénom) : M. Dejardin	N°TVA/N°C.Ident. : W0430476
Adresse : MIC	Adresse de l'installation : Rue Hansroos 1250 Remicourt (Hemelt)

1) REFERENTIELS : - R.G.I.E - Procédure interne : PRO-INS-E-10

2) TYPE DE CONTROLE :

- Examen de contrôle avant mise sous tension d'une installation électrique BT et TBT domestique.
- Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution.

3) TYPE D'INSTALLATION :

Unité d'habitation Parties communes Autres : soumise à l'Art.86 l'Art.87 du RGIE.
 Distributeur : Deca Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 230 V.
 Alimentation tableau principal : 10 mm². Protection raccordement : 50 A. In max. à prévoir).
 Colonne d'alimentation : pas placé mm². Interr-Sect.Général : 300mA/163 A.
 Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 18 RE = 3,1 Ω RIGEN = 6 MΩ.
 Type prise de terre : boucle piquets -

Différentiels	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés
		63	3	0,3	180	63	3	0,3	8			

4) DESCRIPTION DE L'INSTALLATION :

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
Vois Schémas annexes					

5) MANQUEMENTS :

NOTES : Réception des schémas
 Alimentation extérieure, PAC, VMC en attente.

6) NOTES :

- Le différentiel général : était plombé. n'a pu être plombé. a été plombé. n'est pas plombable. absence de différentiel.
- Les schémas : ont été signés. n'ont pas été signés. absence de schémas.
- Installation plomberie sanitaire : non réalisée(s) au jour du contrôle. Liaisons équipotentielles en attente.
A connecter lors de la réalisation.

7) CONCLUSION :

L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 3.12.2014

L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Dans le délai d'un an à dater de ce jour, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès verbal sera envoyée conformément à l'Art. 276.02 du RGIE à l'Administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier. Le présent document ne valide pas la mise sous tension ou le renforcement de puissance de l'installation visitée.

Nom/signature de l'inspecteur
Pour CIB,

Date d'émission :

Nom/signature du demandeur
Pour réception,



C I B
N° 63228

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail



Liège : 61/63 – Rue Grand-Vinâve – 4101 Jemeppe-Sur-Meuse
Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80
Vilvoorde: 277 Mechelsesteenweg – 1800 Vilvoorde
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières
Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
T.V.A. BE 0406.671.312 Compte Bancaire : 340-0298168-28 cibic@skynet.be CONFIDENTIEL

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT

Rapport N° : 11/140318/8	Personne responsable de l'exécution du travail (Nom-Prénom) :
Date du Contrôle : 18.03.2014	S.A. KLINKENBERG – Rue du Fourneau 43b – 4030 GRIVEGNEE
Propriétaire (Nom-Prénom) : M. DEJARDIN	N°TVA/N°C.Ident. : BE0451.430.476
Adresse : non communiquée.	Adresse de l'installation : Rue Hanroux – 4350 REMICOURT (MOMALLE) Lot. 1

1) REFERENTIELS : - R.G.I.E - Procédure interne : PRO-INS-E-10

2) TYPE DE CONTROLE :

Examen de contrôle avant mise sous tension d'une installation électrique BT et TBT domestique.

3) TYPE D'INSTALLATION :

Unité d'habitation, soumise à : l'Art.86 RGIE.

Distributeur : TECTEO

Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 2X230 V.

Alimentation tableau principal : 4 x 10 mm².

Protection raccordement : 50 A. (In max. à prévoir).

Colonne d'alimentation : non placée.

Interr-Sect.Général : 300 mA/63 A.

Nombre de tableaux : 1

Nombre de circuits terminaux : 18

R_E = 3,5 Ω

R_{IGEN} = 6 MΩ.

Type prise de terre : boucle

Différentiels	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés
	63	3	0,3	tous	63	3	0,03	8				

4) DESCRIPTION DE L'INSTALLATION :

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
Voir schémas en annexe					

5) MANQUEMENTS :

Néant.

NOTES :

Récepteurs non placés.

Alimentations extérieures, PAC, VMC en attente.

6) NOTES :

- Le différentiel général : a été plombé.

- Les schémas : ont été signés.

- Installation plomberie sanitaire : non réalisée(s) au jour du contrôle. Liaisons équipotentiellles en attente. A connecter lors de la réalisation.

7) CONCLUSION :

L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 03.2039.

Nom/signature de l'inspecteur
Pour CIB,
L. LOMBARD

Date d'émission :
17.04.2014

Nom/signature du demandeur
Pour réception,

A. DEVOIRS DU PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE

- En vertu de l'article 14 de l'A.R. du 3 mai 1999, le présent document devra être porté à la connaissance du comité pour la prévention et la protection au travail, s'il existe au sein de votre entreprise, lors de la prochaine réunion.

Selon l'A.M. du 6-10-1981, dans les installations domestiques:

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installations électriques doit être communiqué immédiatement au SPF Economie, PME, Classe moyenne et Energie Direction Générale de l'énergie Division Gaz – électricité.

B. INFORMATIONS GENERALES

- Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécialisés dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- L'inspecteur est autorisé à signer ce rapport en l'absence du chef de service et est conscient qu'il engage la responsabilité de l'organisme C.I.B.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

C. INFRACTIONS CODIFIEES (non exhaustives)


- 1 - Résistance d'isolement insuffisante.
- 2 - Résistance de prise de terre trop élevée.
- 3 - Absence de boucle de terre à fond de fouilles :
Une dérogation est à demander au SPF compétent
- 4 - Absence de prise de terre.
- 5 - Mise à la terre réalisée par les canalisations d'eau et/ou de gaz.
- 6 - Absence de barrette de déconnexion de terre.
- 7 - Absence de liaison équipotentielle principale.
- 8 - Absence de liaison équipotentielle supplémentaire pour salle de bains et/ou douches.
- 9 - Liaisons équipotentielles: sections inadaptées et/ou code de couleur non respecté et/ou continuité non assurée.
- 11 - Absence de différentiel général plombable à l'origine de l'installation.
- 12 - Absence de différentiel(s) distinct(s) de max. 30mA pour salle de bains et/ou douches et/ou machine à laver et/ou lave-vaisselle et/ou séchoir
- 13 - Différentiel d'intensité nominale non adaptée au courant d'emploi.
- 14 - Schéma unifilaire et/ou de position non présenté et/ou ne correspondant pas à la réalité.
- 15 - Repérage des circuits inexistant, incomplet ou incorrect.
- 16 - Tableau non facilement accessible, ou non placé à environ 1,50 m au-dessus du sol.
- 17 - Le tableau n'offre pas un degré de protection suffisant contre le contact direct.
- 18 - Les socles pour fusibles ne sont pas équipés d'éléments de calibrage.
- 19 - Fusible(s) et/ou disjoncteur(s) « réparés » et/ou inadapté(s) à la section des canalisations qu'ils alimentent
- 20 - Départ(s) repiqué(s) sur plusieurs circuits.
- 21 - Les différentiels ne sont pas adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre.

C. INFRACTIONS CODIFIEES (suite)

- 22 - Les circuits prises et/ou les circuits mixtes éclairage-prises ne sont pas réalisés en 2,5 mm².
- 23 - Le conducteur de protection n'est pas distribué dans toute l'installation (points lumineux - prises de courant).
- 24 - Le code de couleur n'est pas respecté (neutre bleu) ou (PE/JV) ou (conducteur actif JV ou jaune ou vert).
- 25 - Les canalisations ne sont pas fixées au moyen d'attaches adaptées et/ou correctement protégées aux endroits exposés à des dégradations mécaniques.
- 26 - Les canalisations inappropriées sont directement fixées sur des murs, plinthes,...
- 27 - Il est fait usage de canalisations non conformes aux normes.
- 28 - Les canalisations non utilisées doivent être démontées ou isolées à leurs extrémités.
- 29 - Les canalisations électriques ne sont pas placées à une distance suffisante d'autres canalisations non électriques.
- 30 - Les connexions entre conducteurs ne sont pas réalisées conformément aux règles de l'art : emploi de « sucres », connexion hors boîte de dérivation, connexions non sûres...
- 31 - Les interrupteurs ne peuvent pas être protégés par un fusible / disjoncteur d'un calibre supérieur à leur courant nominal
- 32 - L'interrupteur doit couper la phase et non le neutre.
- 33 - Tout interrupteur commandant une prise de courant doit être bipolaire (si protection par disjoncteur >16 A).
- 34 - Les interrupteurs et socles de prises encastrés dans des parois doivent être logés dans des boîtes d'encastrement.
- 35 - Les prises de courant doivent être de type « CE », d'un modèle homologué en Belgique, avec « sécurité enfants » et contact de terre.
- 36 - Les prises apparentes ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis-à-vis du niveau du sol. (15 cm)
- 37 - Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner.
- 38 - Le matériel offre un degré de protection insuffisant vis-à-vis des influences externes.
- 39 - Les prescriptions relatives aux volumes enveloppes et / ou de protection de la salle de bains et/ou douche ne sont pas respectées.
- 40 - L'emploi d'appareils de classe O (zéro) interdit.
- 41 - Risque d'incendie: appareil placé à proximité de matériaux inflammables.
- 42 - Au moins une broche de terre de prise de courant n'est pas reliée au réseau général de terre.
- 43 - Absence d'interrupteur - sectionneur général dans le tableau

Information Générale:

Ce rapport dactylographié est conforme au rapport manuscrit établi sur site par l'inspecteur. Il est délivré sous ce format à titre de facilité pour le gestionnaire des installations.

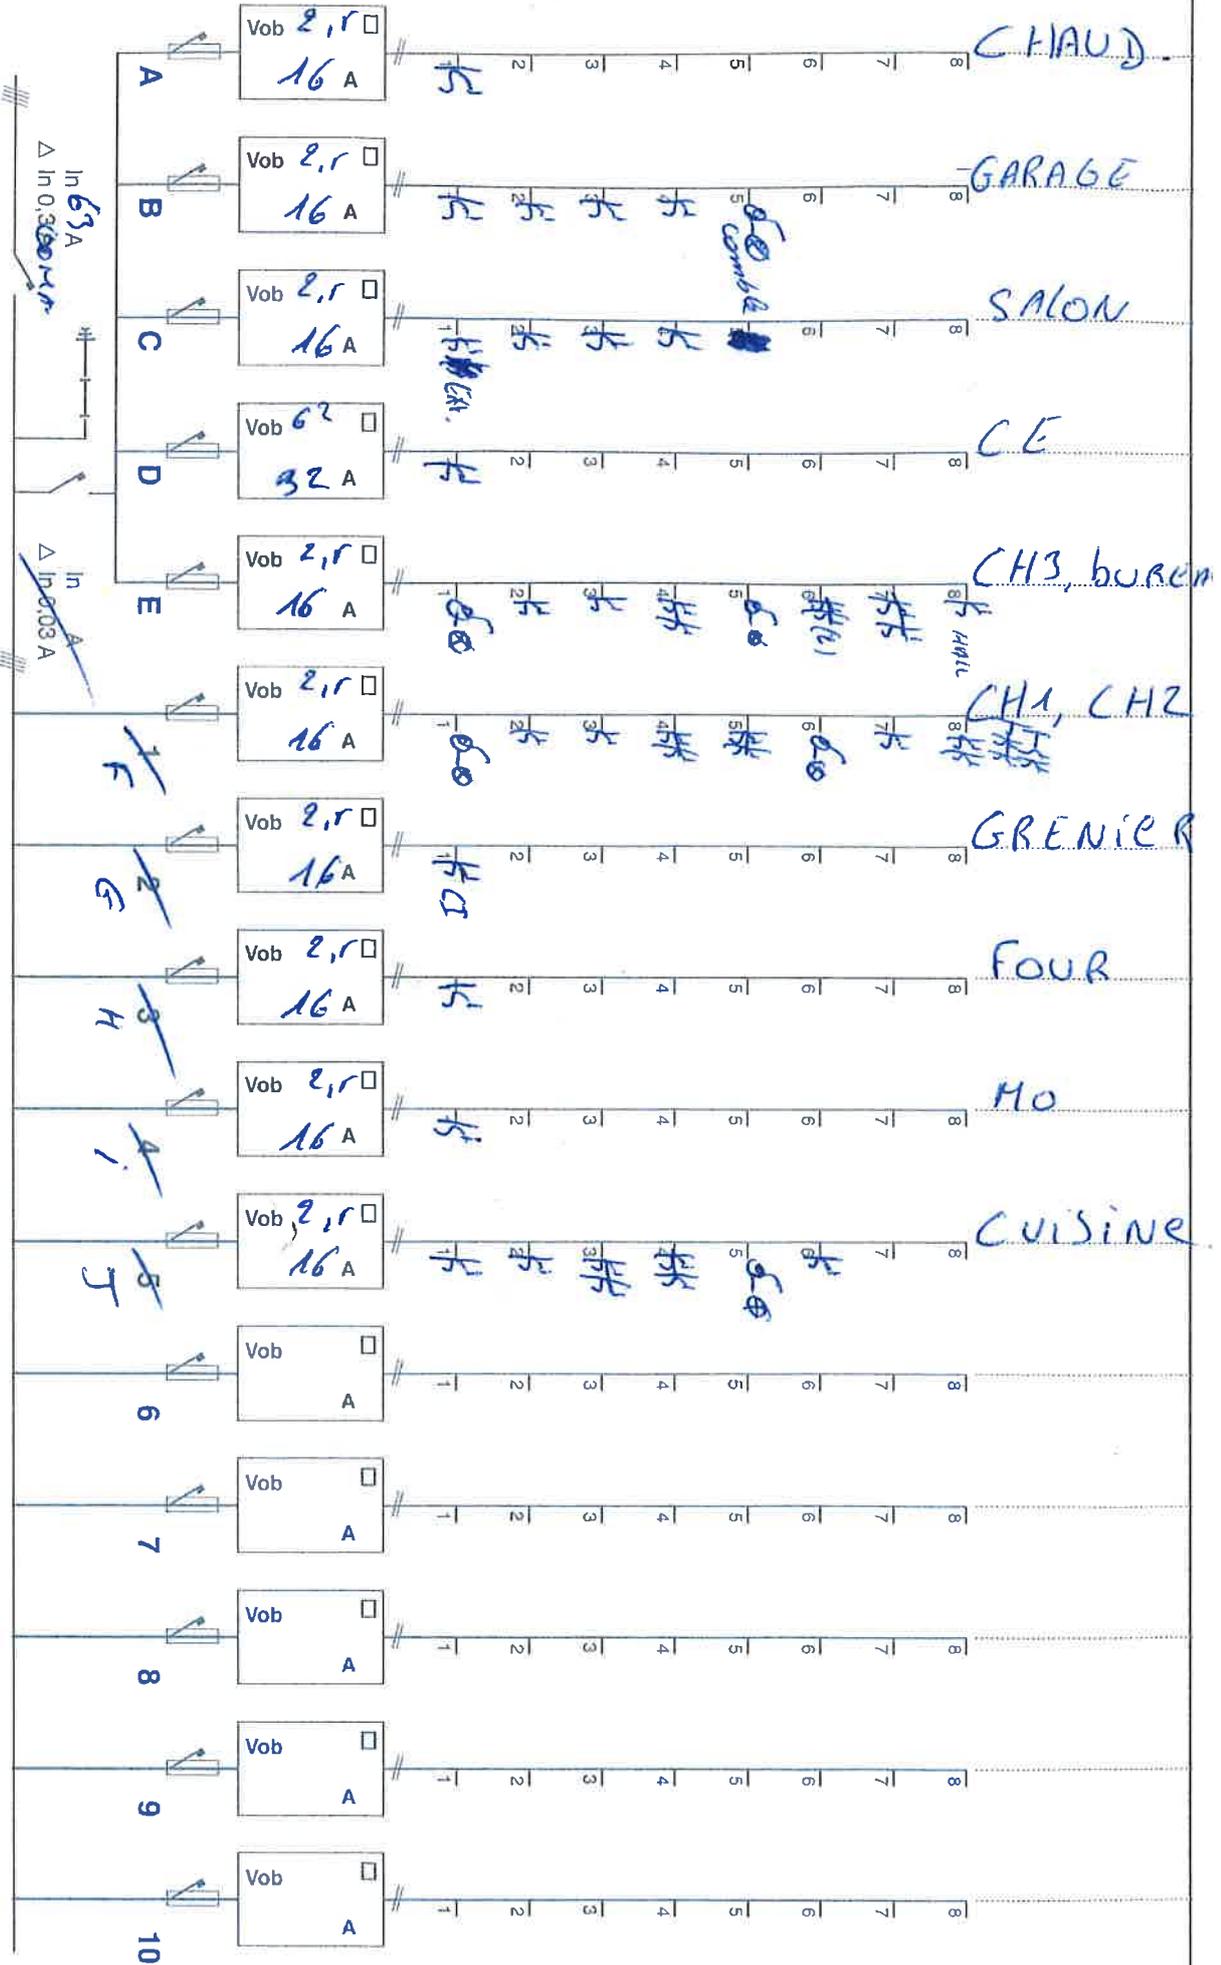

Agence de Contrôle Agréée

Date de contrôle: 18 Mars 2014

Signature Agent: *LOMBARD*

Chantier: IDERL. Conduch

Client: M. LÉNARSKI

Adresse: M. DESAIDIN, sekuren

Signature Agent: *Remi Lambert, Rue de Mand...*

TENSION: mono 230V

TR1 230 V


TR1 400 V + N

COFFRET BIHORAIRE

COFFRET ACCU.

Suite voir feuillet n°

Feuillet n°


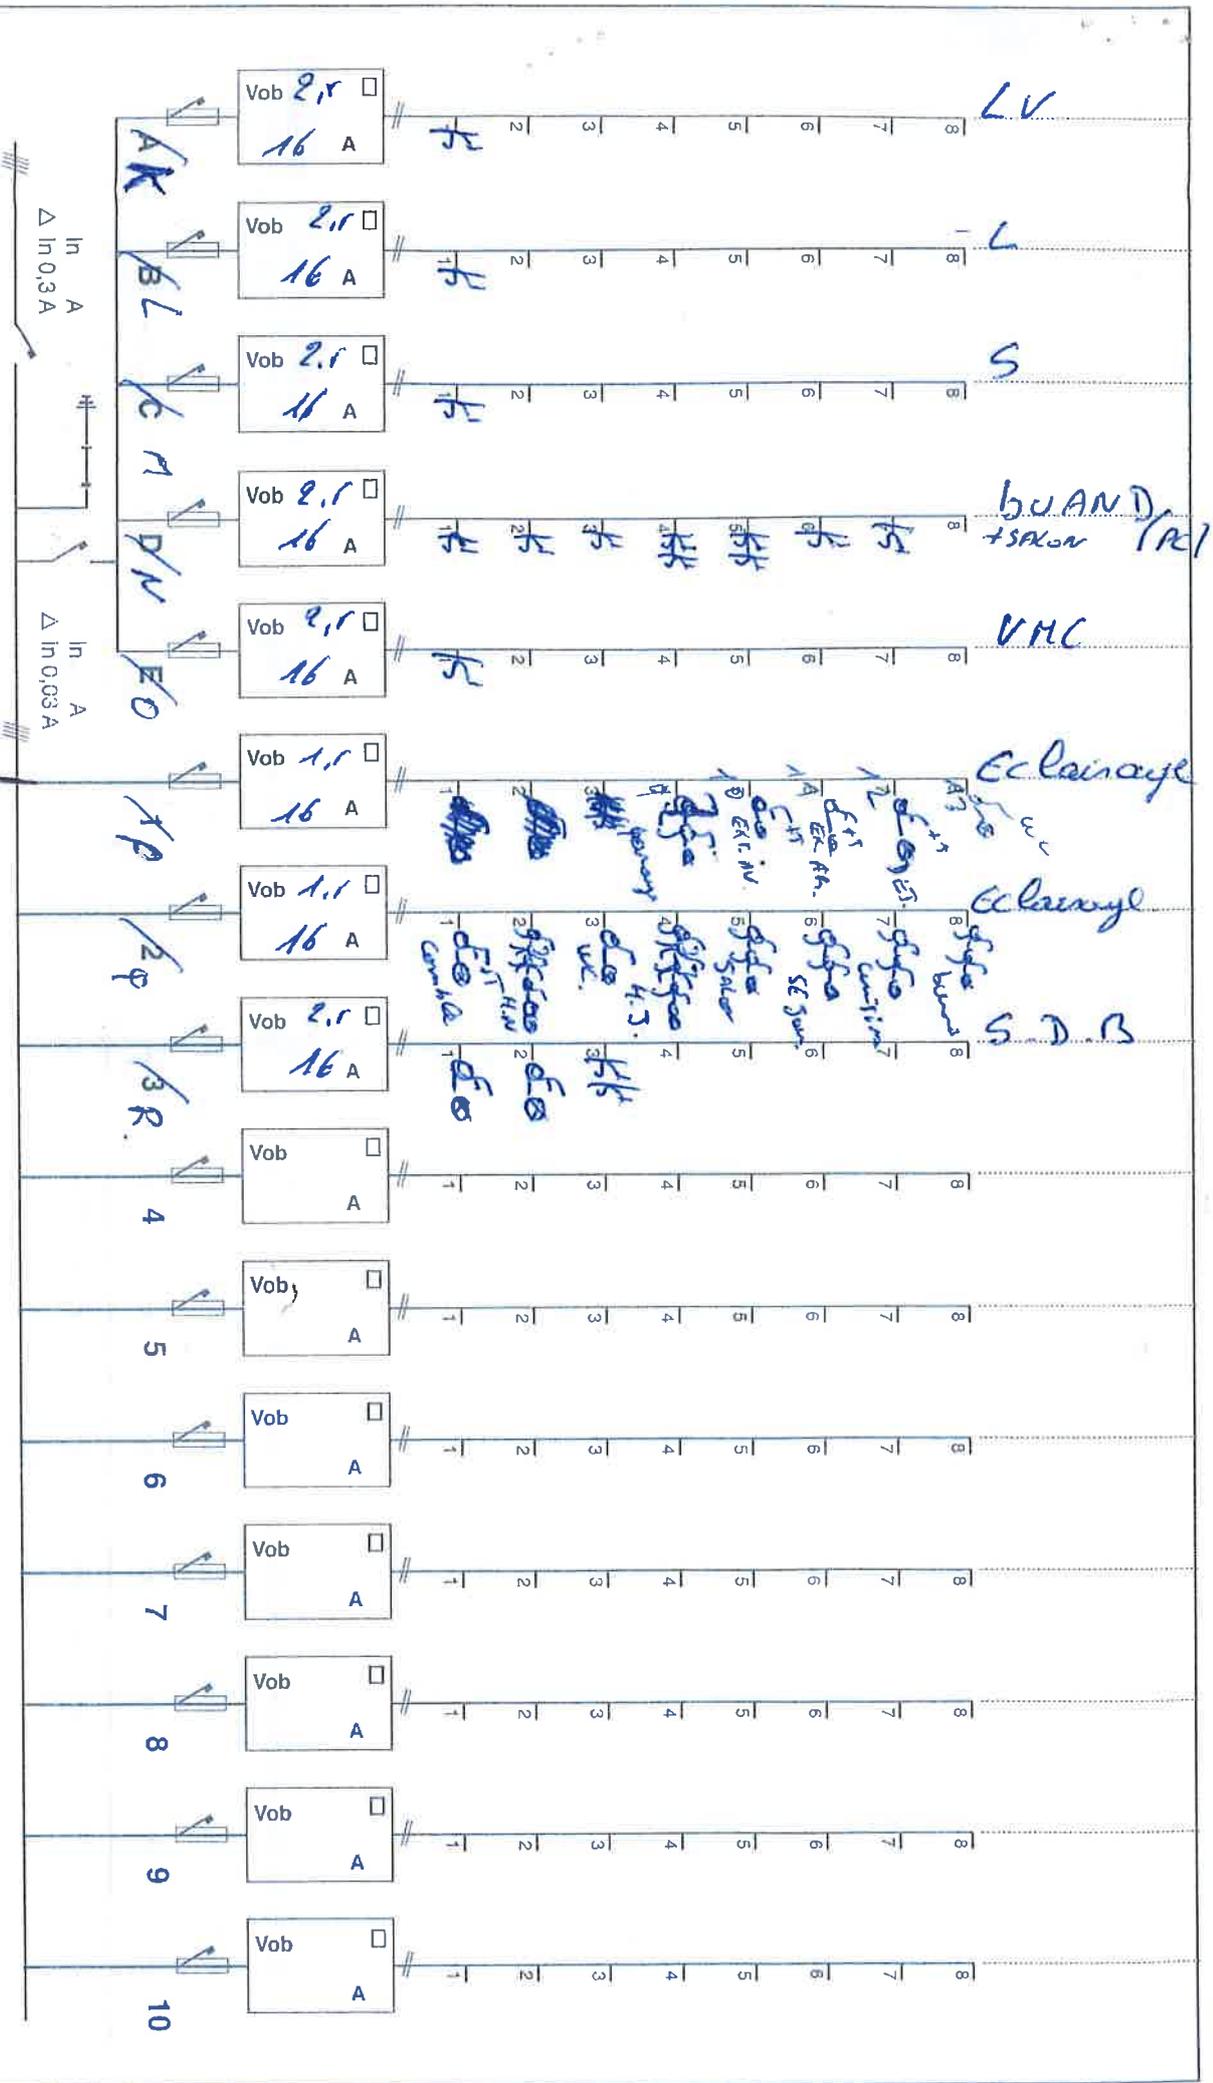


Agence de Contrôle Agricole
 18 MAR 2014
 Date de contrôle M. KLINKENBERG
 Signature Agent

Chantier IDEAL Construct
 Client M. DEJARDIN
 Adresse Remise en état
 Rue Alphonse
 Signature Agent

TENSION **mono 230 V**
 TRI 230 V
 TRI 400 V + N
 COFFRET BIHORAIRE
 COFFRET ACCU.

Suite voir feuillet n°
 Feuillet n°

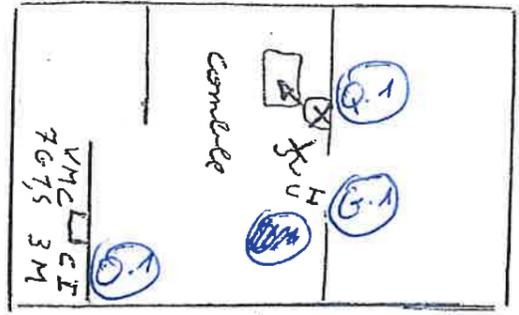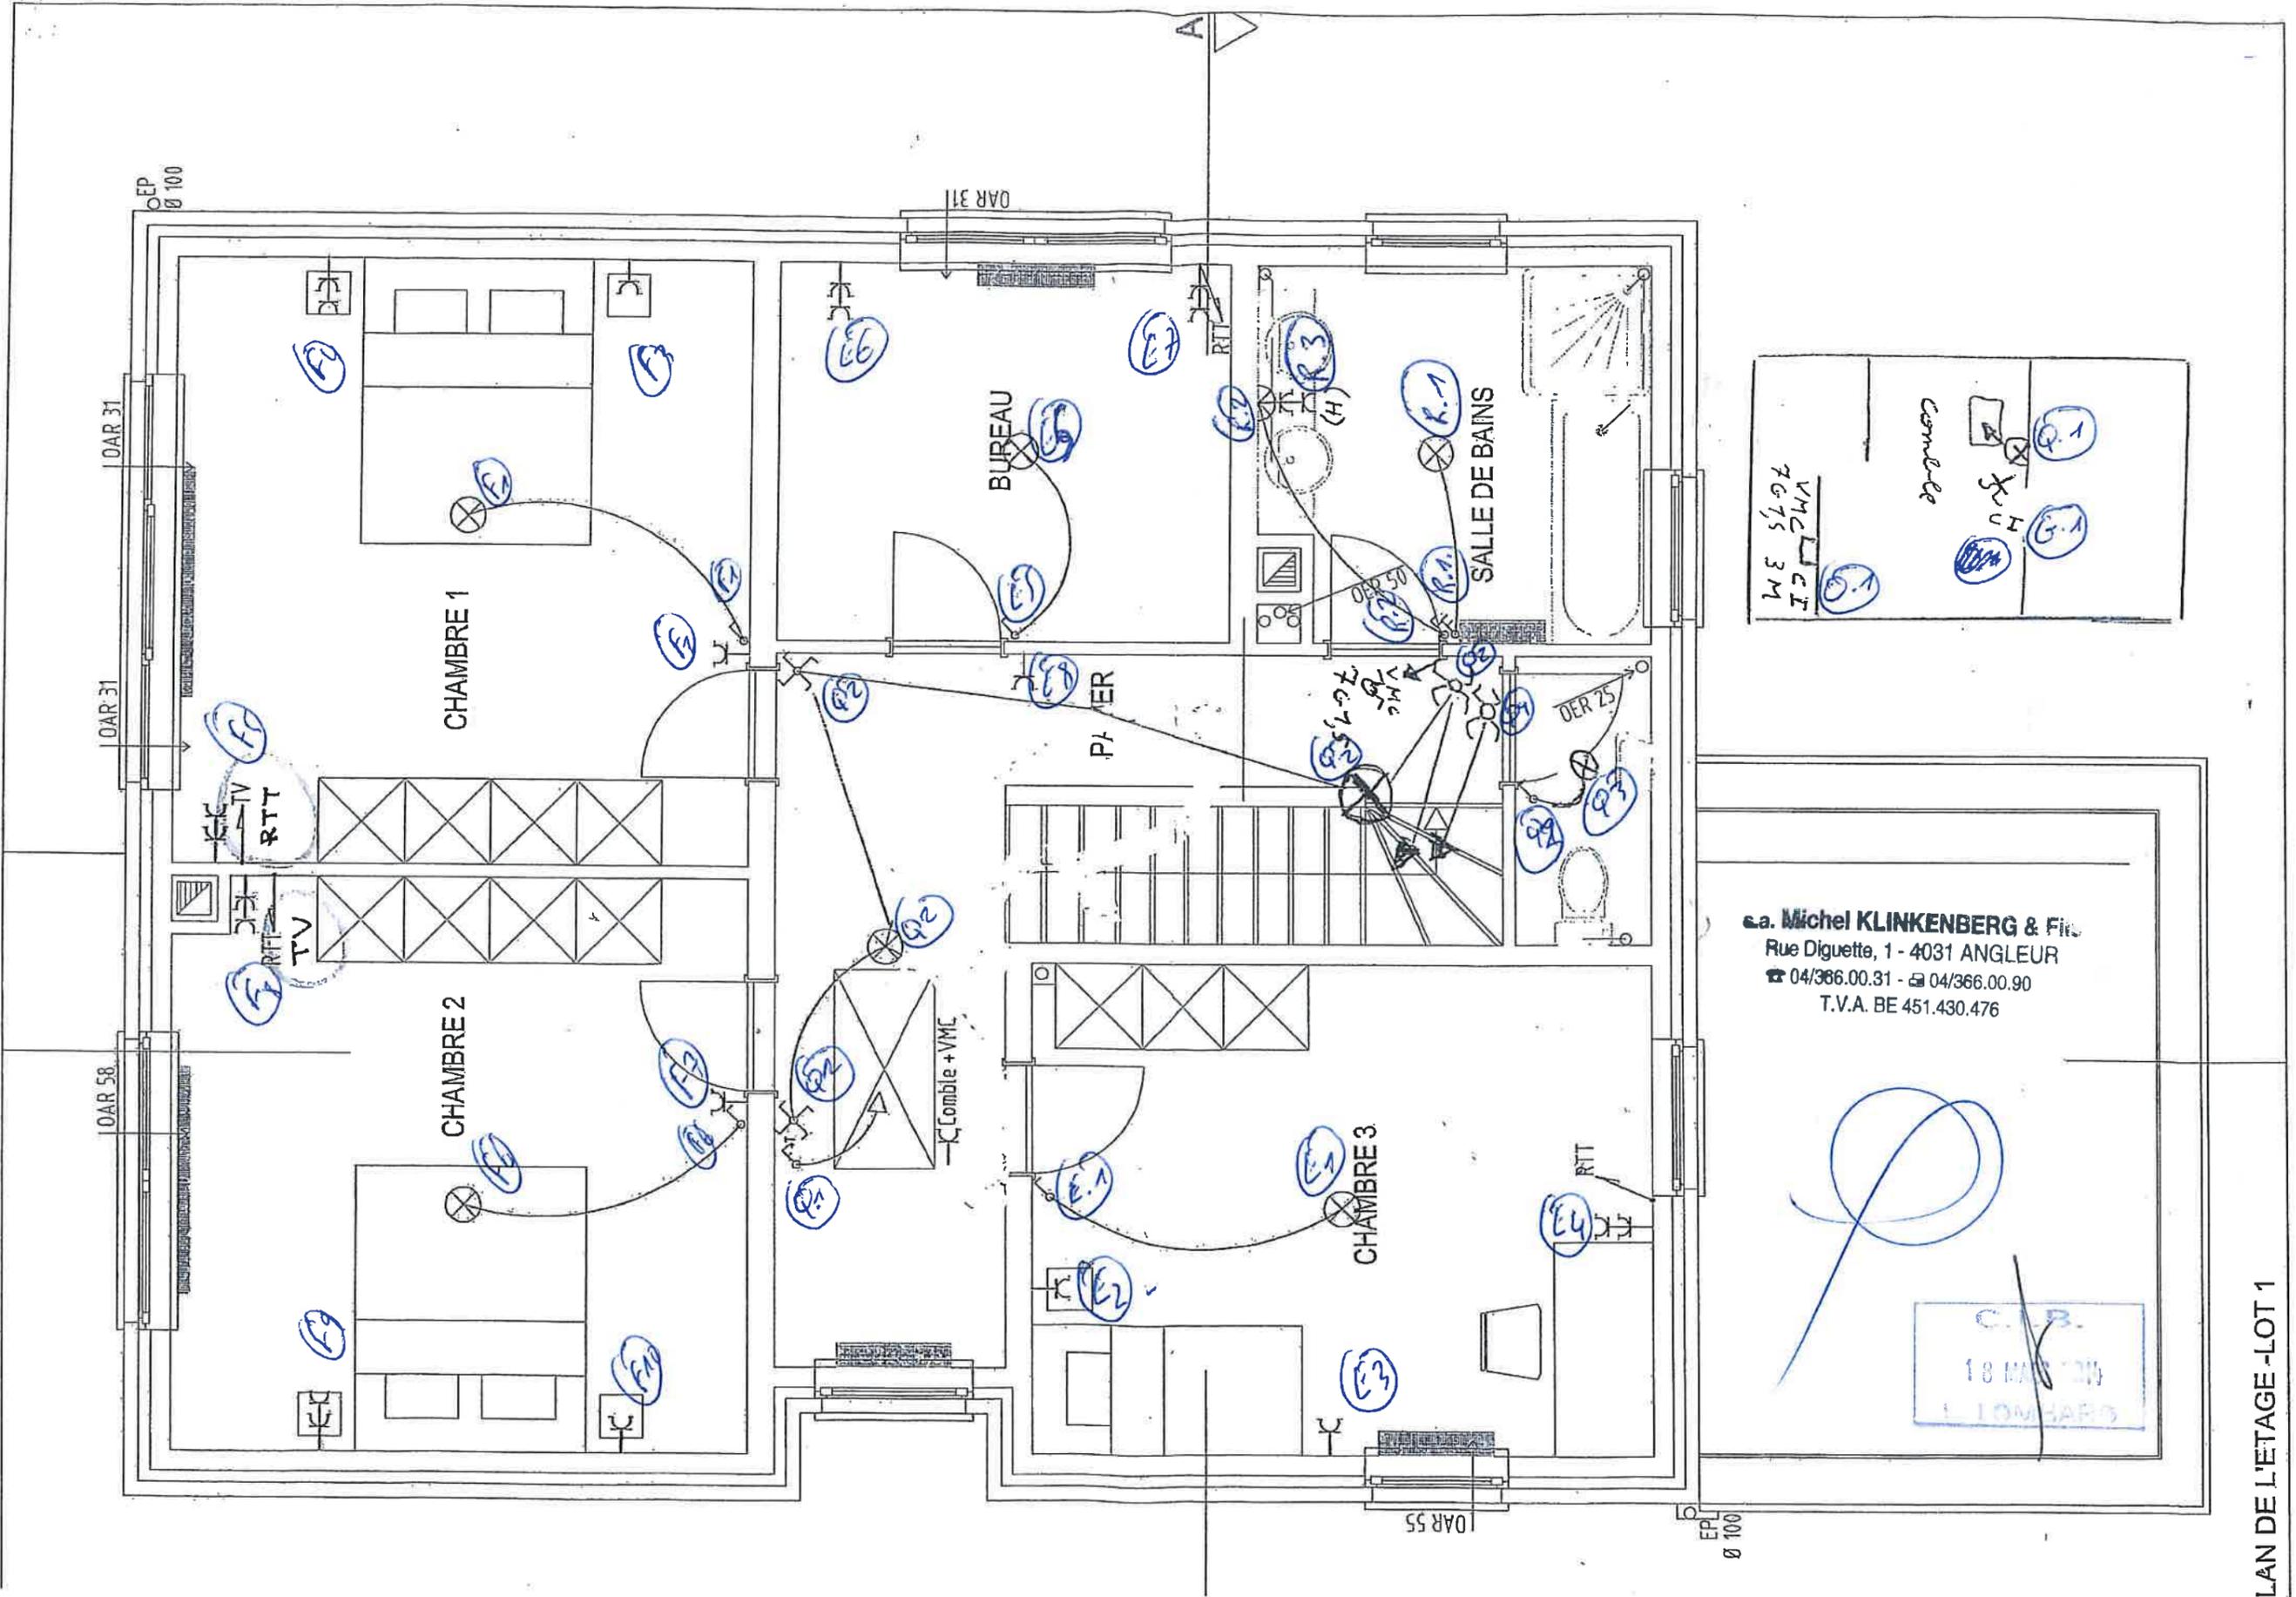

s.a. Michel KLINKENBERG & Fir.
 Rue Diguette, 1 - 4031 ANGLEUR
 ☎ 04/366.00.31 - ☎ 04/366.00.90
 T.V.A. BE 451.430.476

C.B.
 18 MAR 2010
 L. LOMBARDO

LAN DE L'ETAGE - LOT 1
