

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 88481
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: bdcelek@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5284632
Voorl. verslagnr.:
Datum: 08/10/2019

Klant / Opdrachtgever:
BDC ELEK
MOLENSTRAAT 39
2570 DUFFEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: HOOGSTRAAT 151 DUFFEL 2570
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/278/274
Datum onderzoek: 08/10/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/10/2044 Onderzoeker: VAN LOON DANNY
Eigendom van: -
Installateur: - BDC ELEKMOLENSTRAAT 39 2570 DUFFEL
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40 Hoofdbeveiliging: NB Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 26 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 1,728 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: EB 1ste verd.: 2 + 4 res. - EB kelder: 16

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


1. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
O
I Geen inbreuken.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker



Keurder
Naam :
Handtekening :

Van kast boven

Doorverbinding 2x10mm²




Naam: De Beer Wumi
Handtekening: 

Naam :
Handtekening :

262

Kast kelder (2de rij)

Doorverbinding 2x10mm²

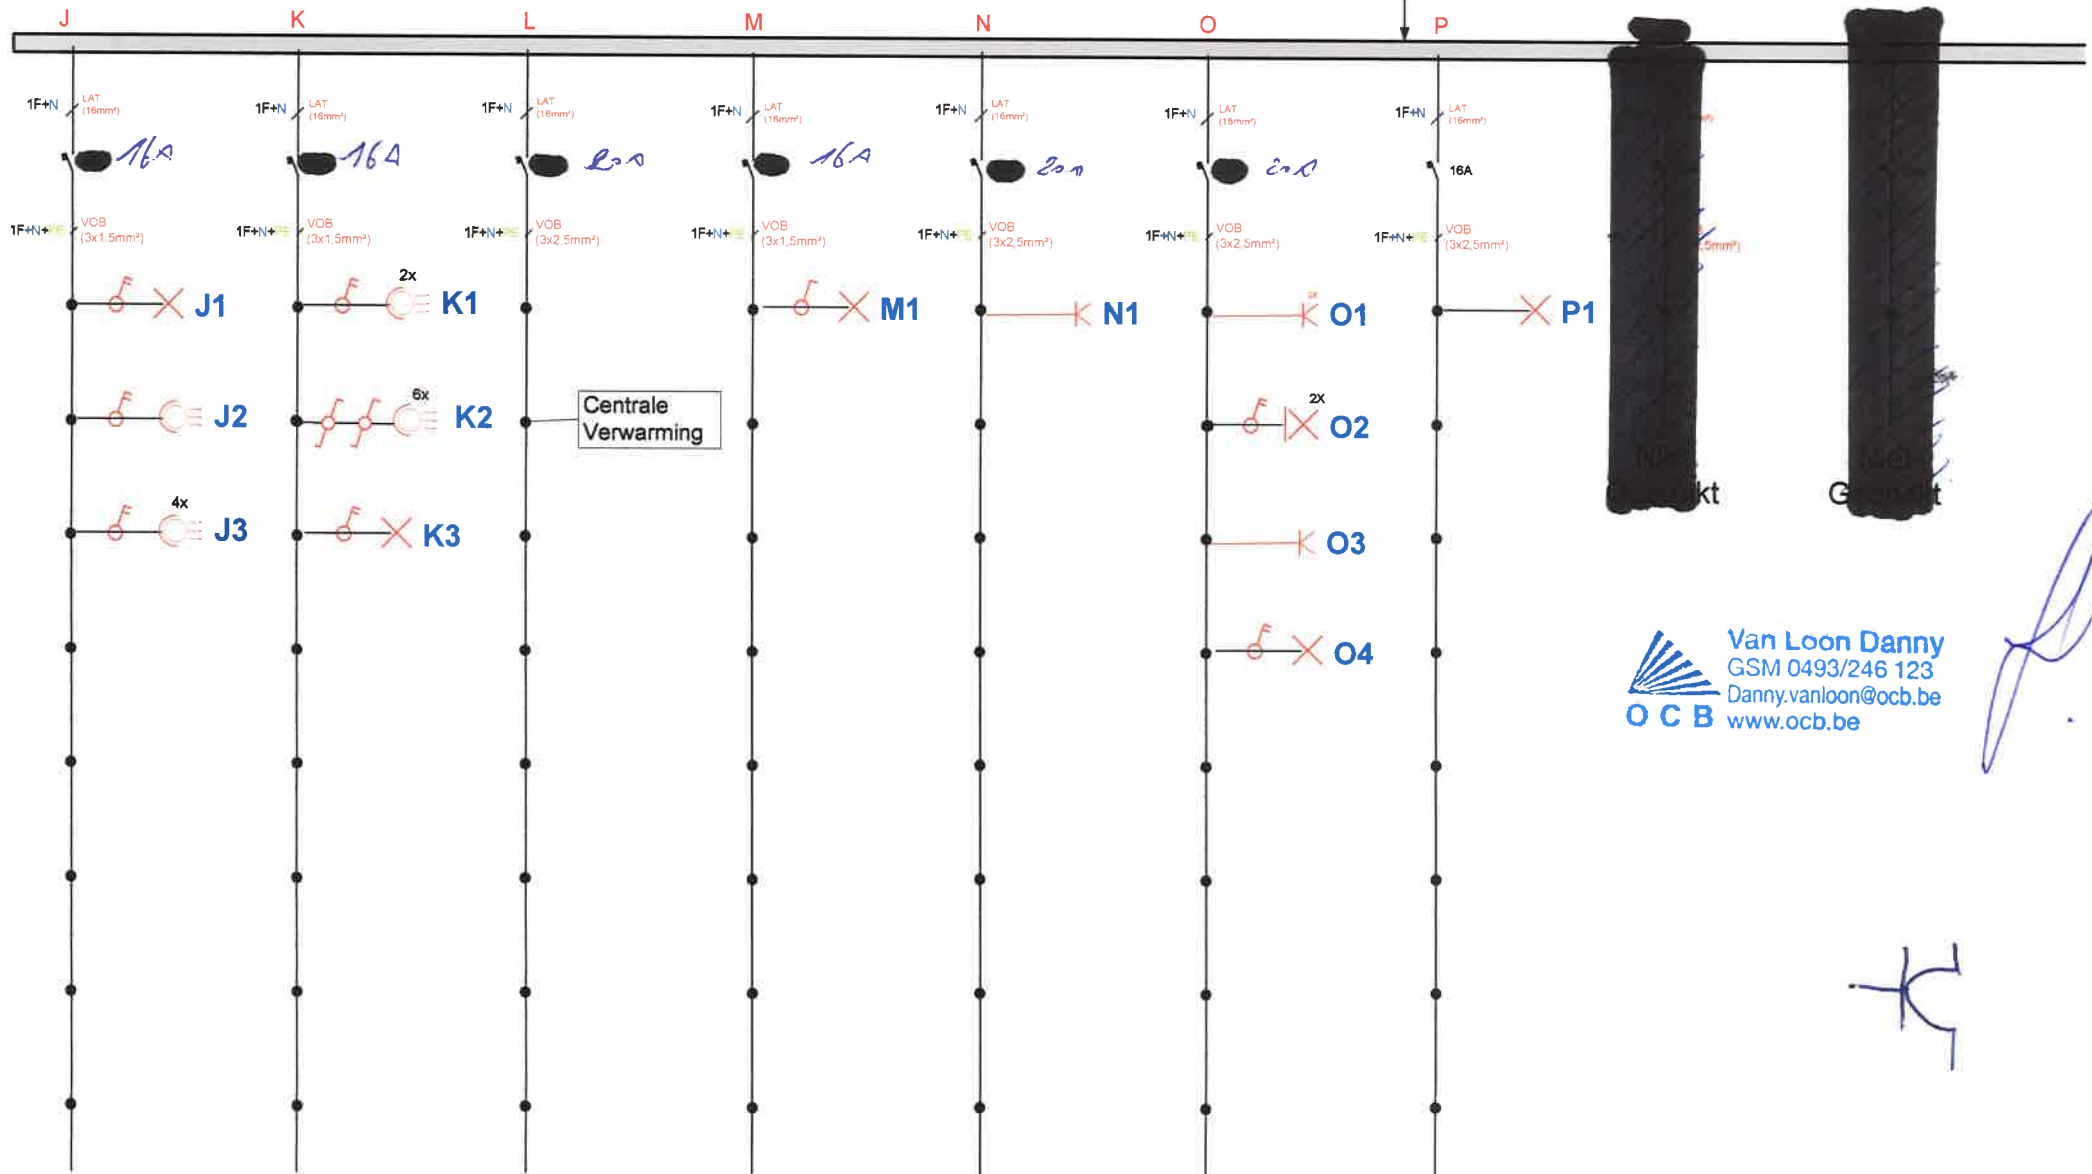

Van Loon Danny
GSM 0493/246 123
Danny.vanloon@ocb.be
www.ocb.be

O C B

Eigenaar

Naam : De Beert wim


Handtekening :

Keurder

Naam :

Handtekening :

Situatieplan Gelijkvloers

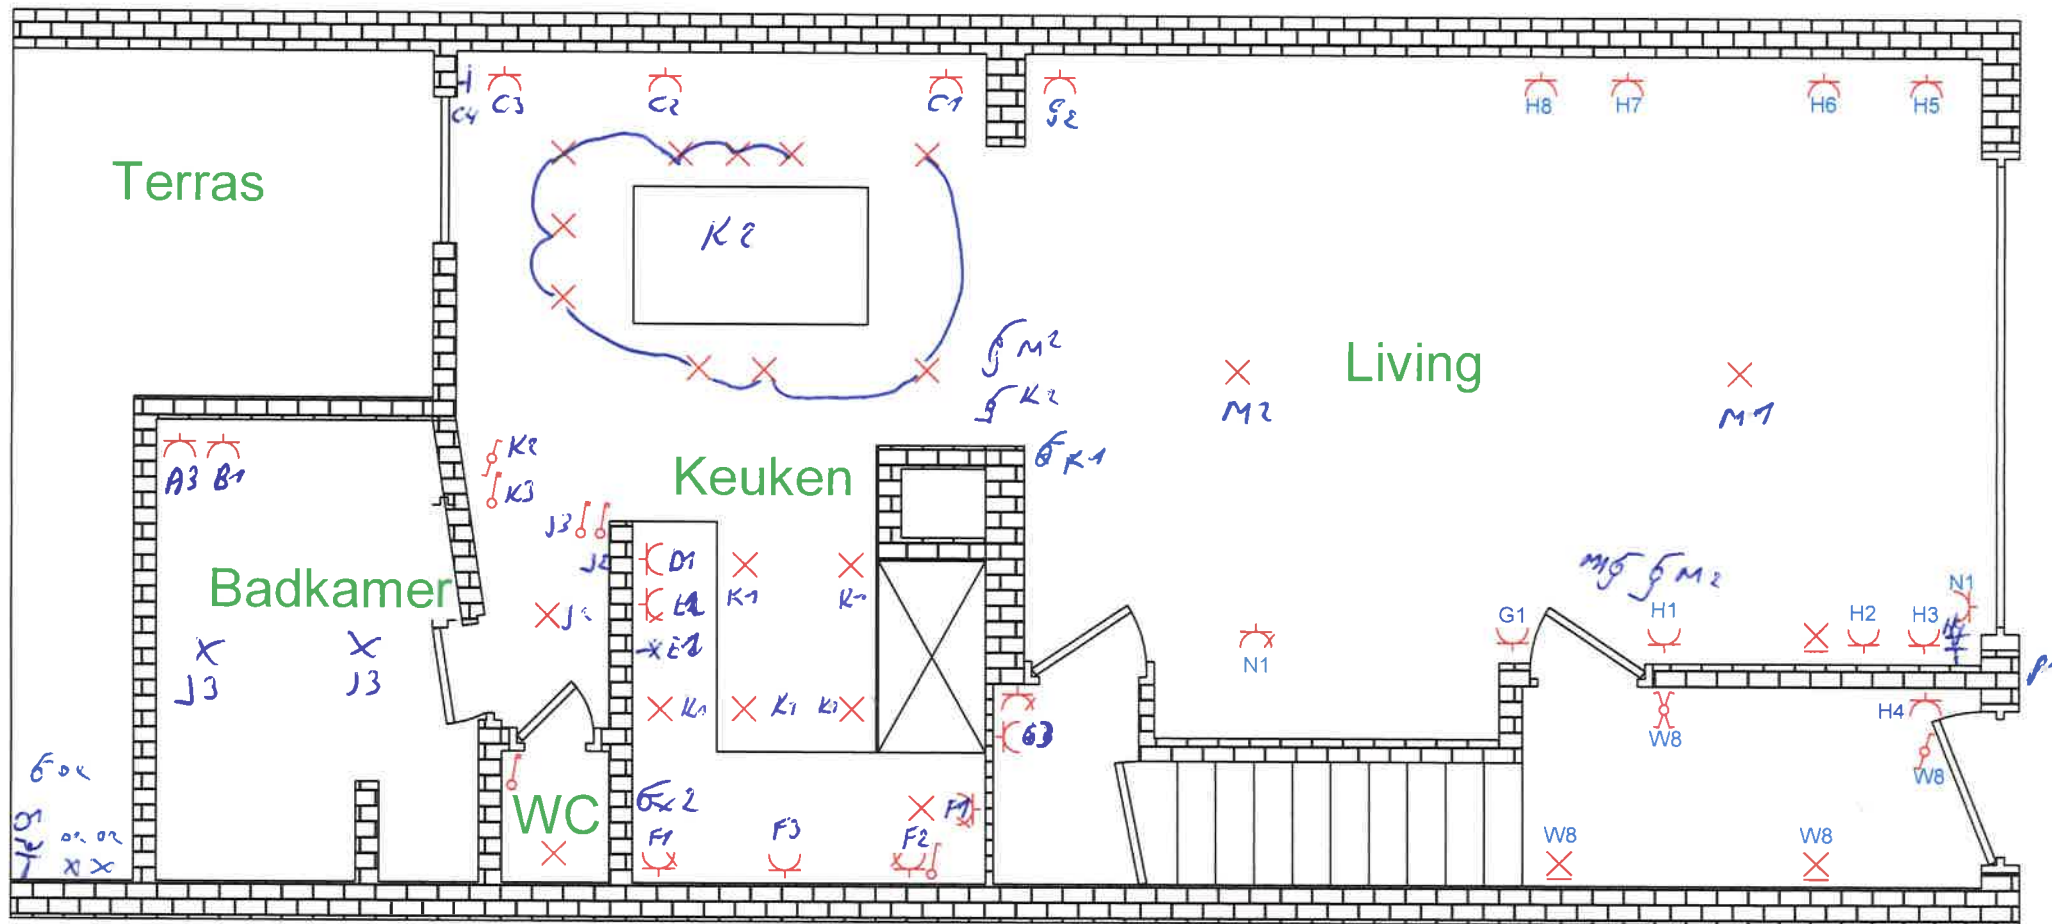


Eigenaar
Naam:
Handtekening:

Keurder
Naam:
Handtekening:

Situatieplan Verdieping 1

 Van Leen Danny
GSM 0493/246 123
Danny.vanloon@ocb.be
www.ocb.be

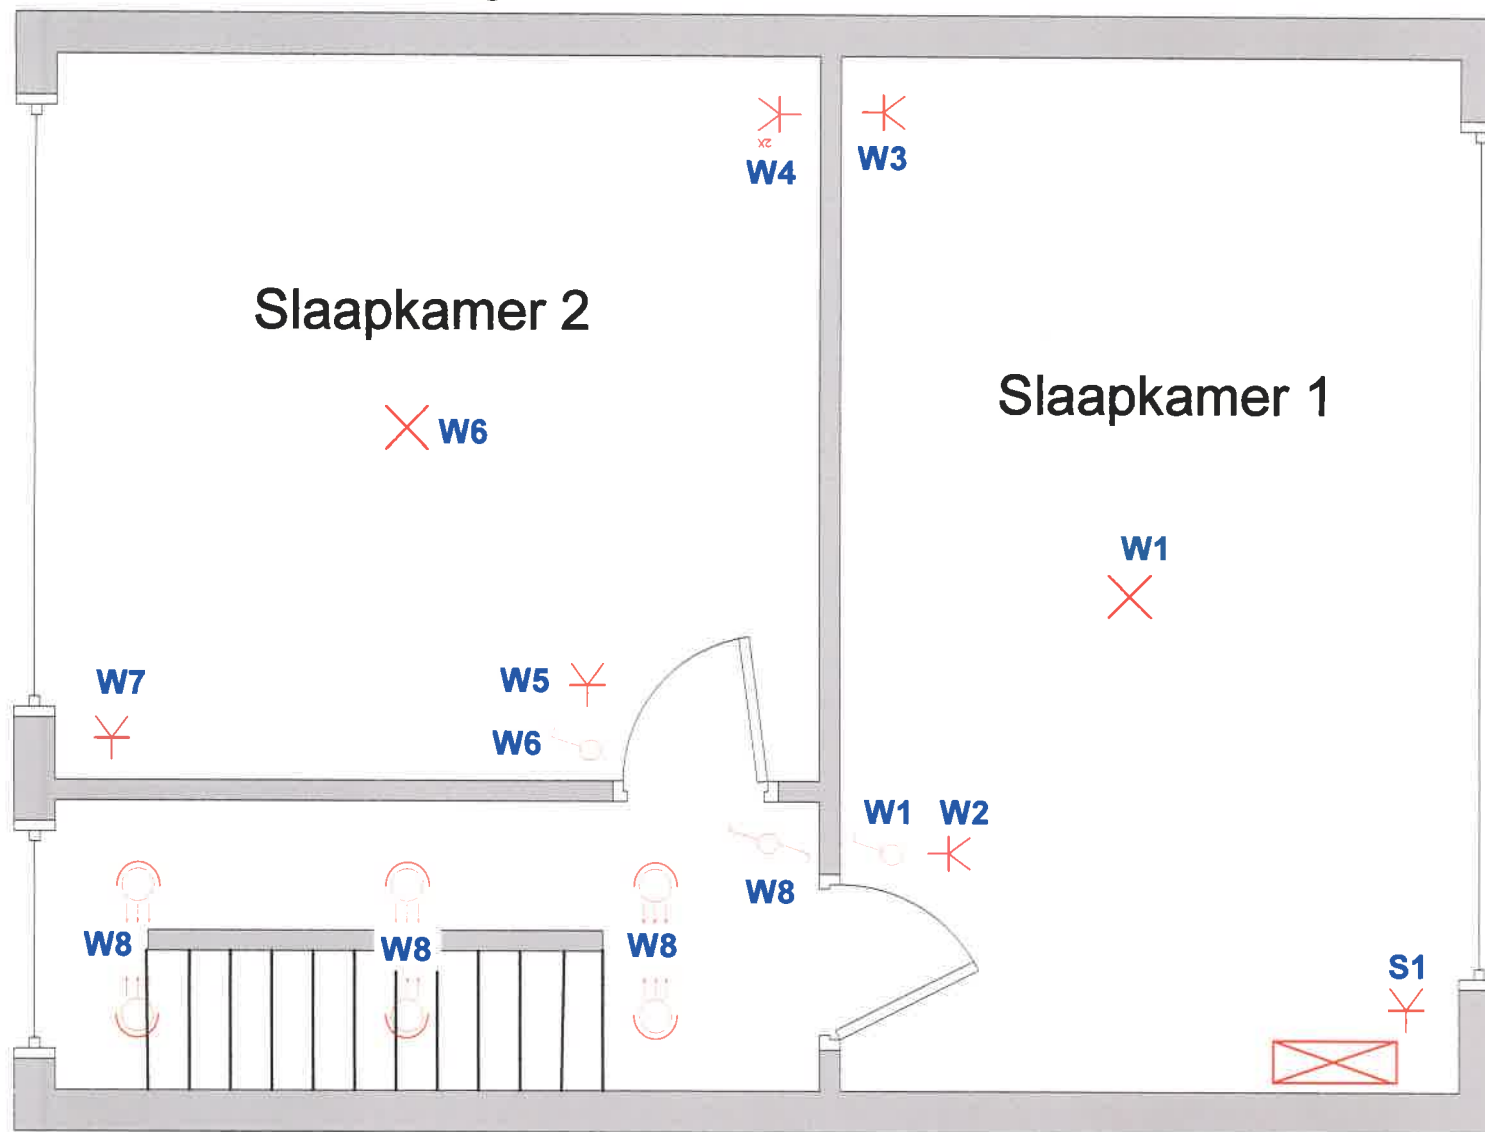

Eigenaar

Naam : De Beke Woon


Handtekening :

Keurder


Naam :

Handtekening :

Situatieplan Kelder

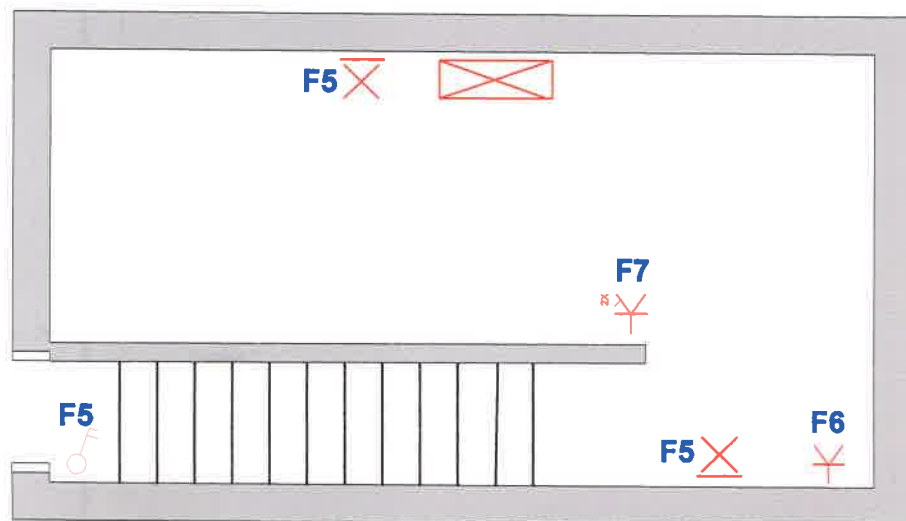

Situatieplan Tuinhuis

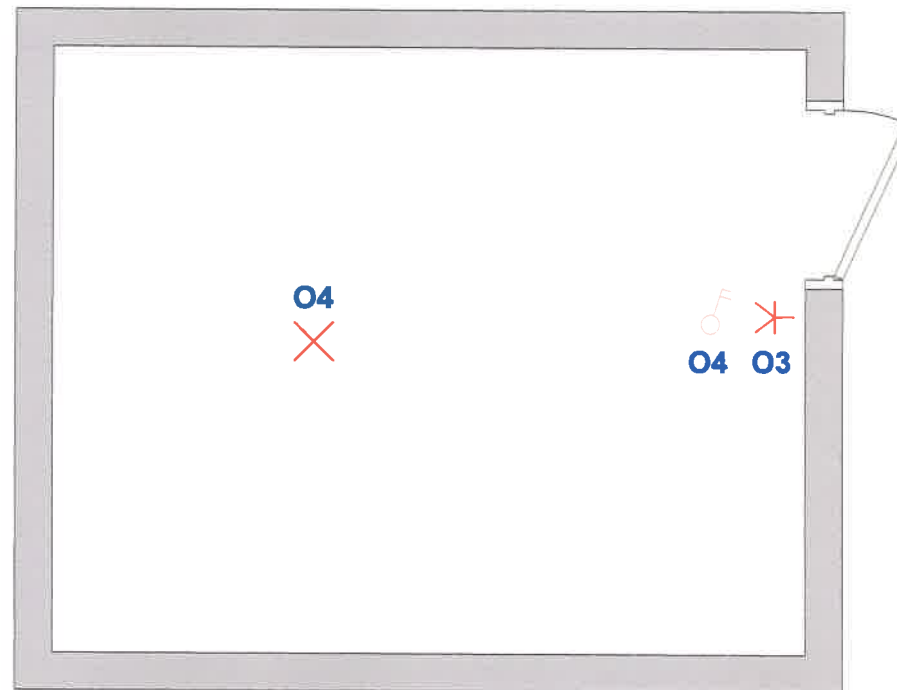

 Van Leen Danny
GSM 0493/246 123
Danny.vanloon@ocb.be
www.ocb.be

Eigenaar

Naam : De Beere w.o.m.

Handtekening : 

Keurder

Naam :

Handtekening :
