



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR FB 12 1291 NO
ADRES INSTALLATIE: ST JANS HOLEN BEEH
LEOPOLD II LAAN BLAPP C 05
EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER : EMM
Adres :
INSTALLATEUR : BOCH
Adres :
BTW of IK : 6335


STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 21/06/12 ; Aanvulling van verslag nr. / ; Type der lokalen: APPARTEMENT
Aard installatie: Nieuw Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie.....
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art 86-87
Aansluiting: Spanning 2x230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 50 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 63A 0,3A
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x95 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10 mm²
Type aardelektrode Ius baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem TT TN-IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; Spreidingsweerstand 130 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: >2 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

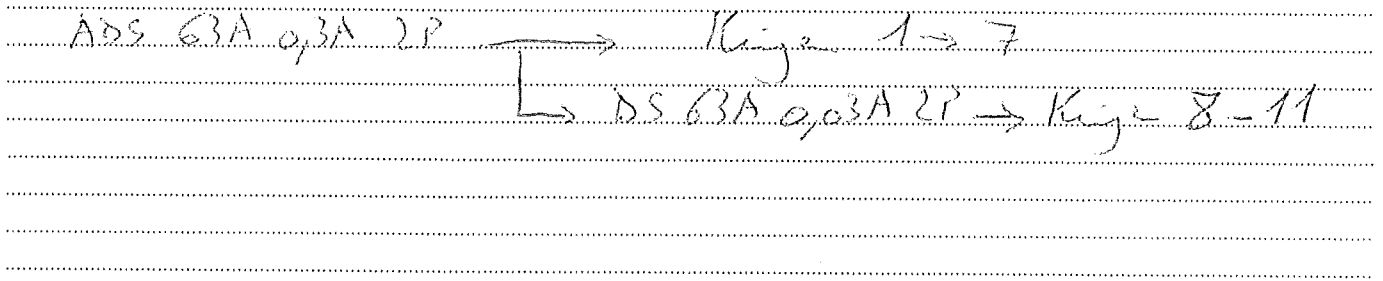

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 /
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja -neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja -neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: GEEN
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:
.....
.....
.....
.....

VISUM VAN DE VERDELER
ofc
esloche

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/06/12
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLORGANISME
FRED DE VRIJ
agent-onderzoeker
