

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/10/2023

Inspecteur: Geert De Decker

Mentor:

Installateur: Elektro FG

ID-label:

B.T.W. nr.:BE 0768 992 343

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 18460109

Datum verslag: 24/10/2023

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1311279

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Salvatorstraat
Huisnummer 6
Busnummer
Postcode 9280
Gemeente Wieze
Land België

Eigenaar

Naam Cibomat NV
Straatnaam Salvatorstraat
Huisnummer 6
Busnummer
Postcode 9280
Gemeente Wieze
Land België

Installateur

Naam Elektro FG
BTW nr. BE 0768 992 343
Telefoonnummer +32 495 36 10 41
E-mail frederic@elektrofg.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: -

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor
01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 16 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 26

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 0,847 MΩ

RE: 6,40 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	26	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	6		2	1,5
1	C	16	Reserve	2	-
2	C	16		2	1,5
15	C	20		2	2,5
3	C	16		2	2,5
1	C	25		2	4
1	C	32	Reserve	2	-
1	C	25		4	4
1	C	32		4	10

Visueel nazicht (algemeen) OK
 Aansluitingen OK
 Equipotentiale verbindingen OK
 Continuïteit OK

Directe aanraking OK
 Indirecte aanraking OK
 schema in bijlage door Aceg vzw NA
 Doorsnede geleiders OK
 Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
 nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
 Teller nog niet geplaatst

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/10/2048
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.
 Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Geert De Decker

Geert De Decker
 ACEG VZW - #267

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/10/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




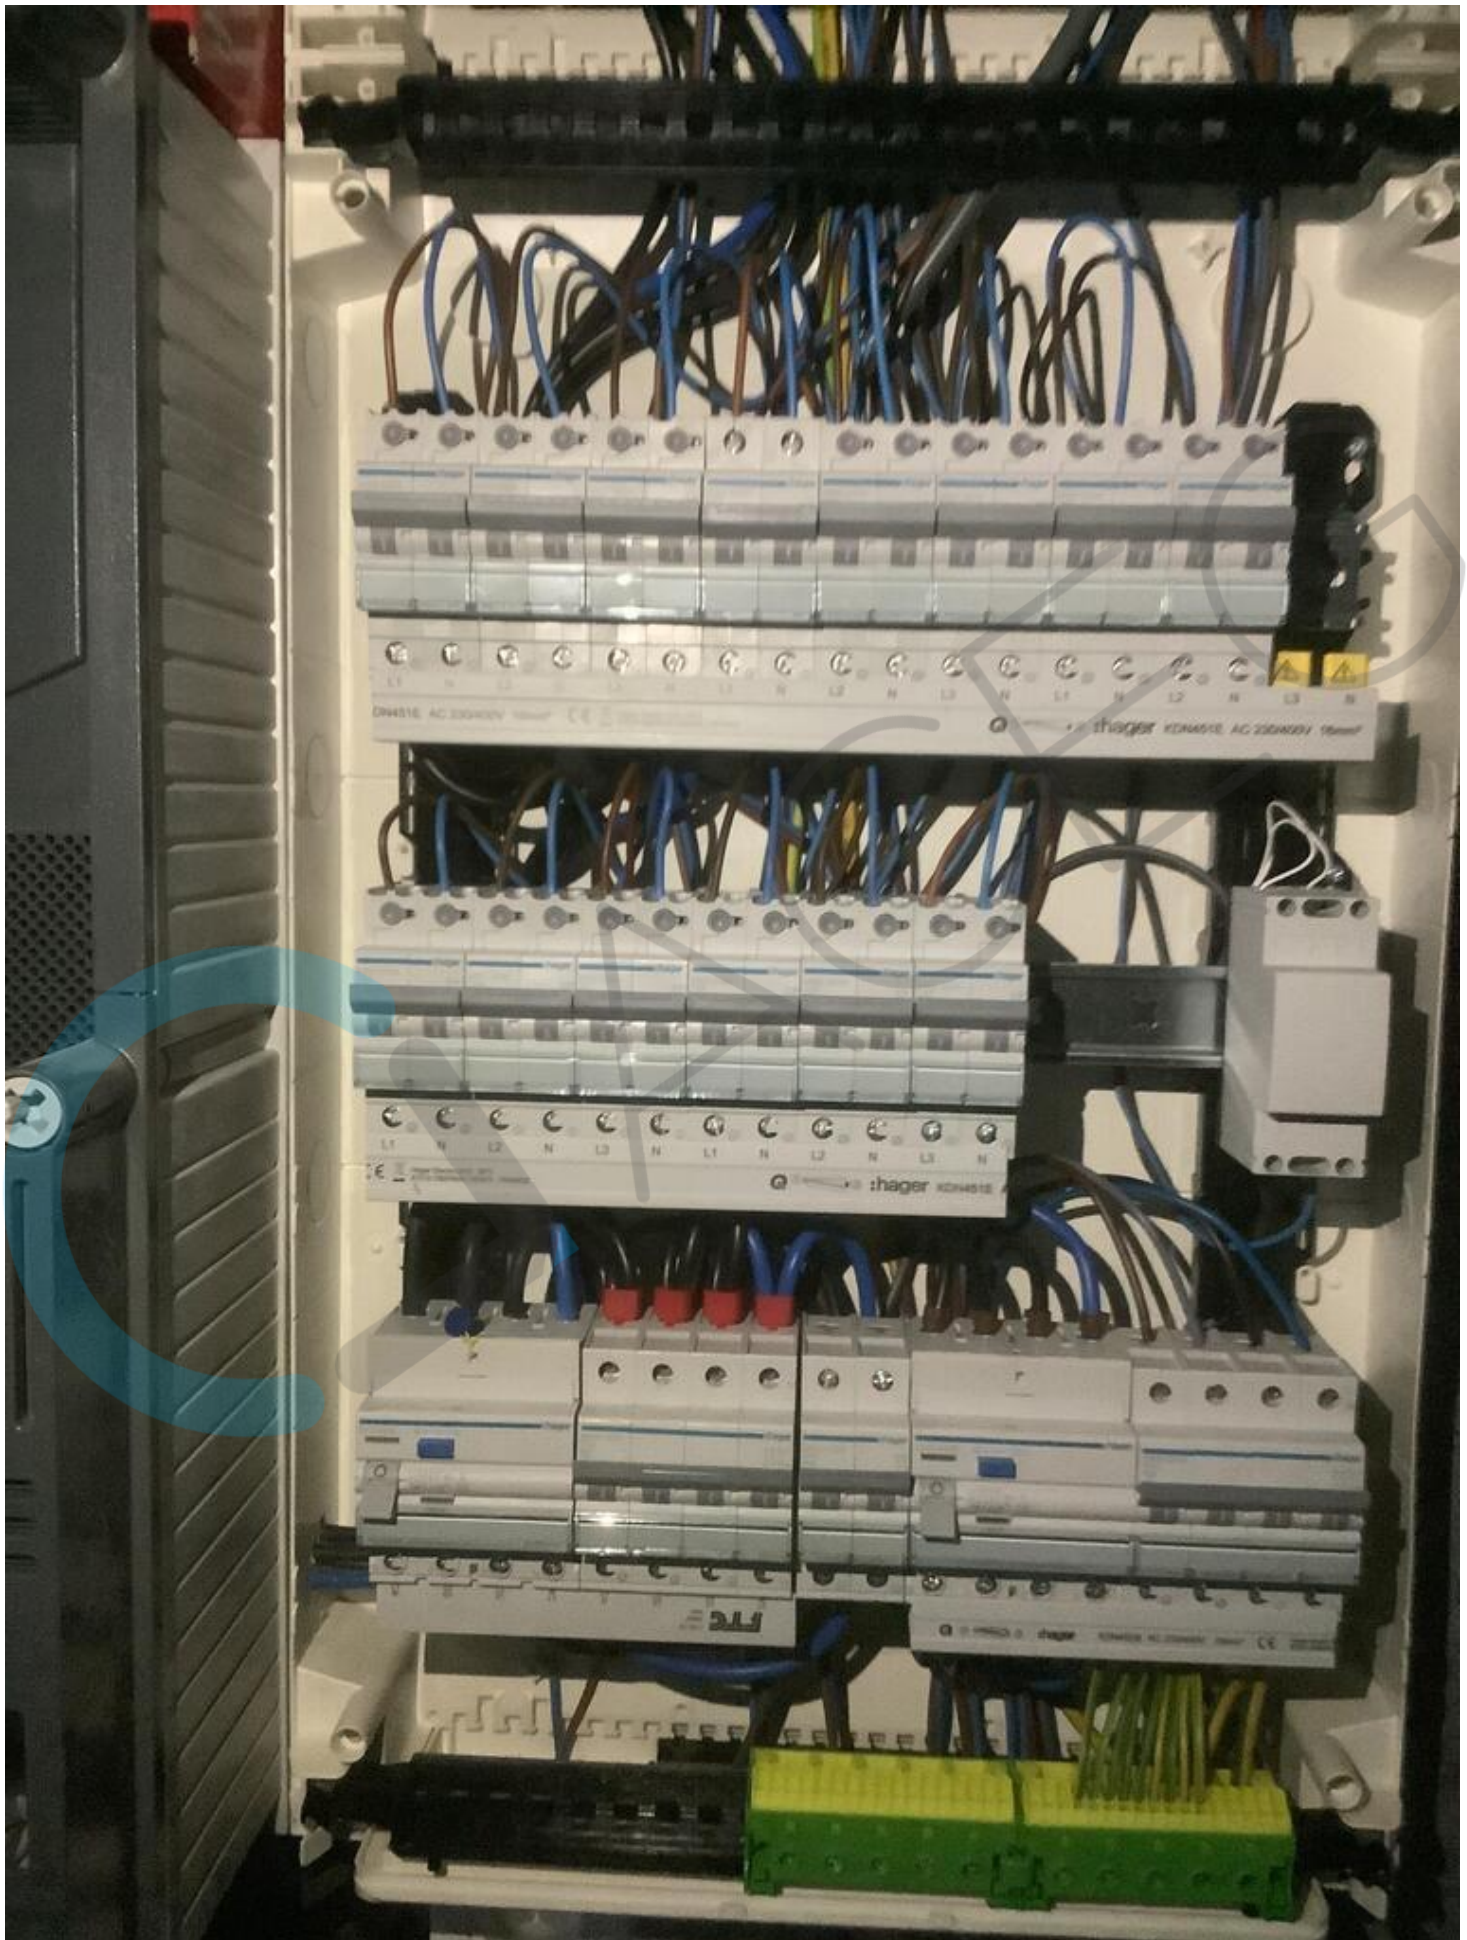






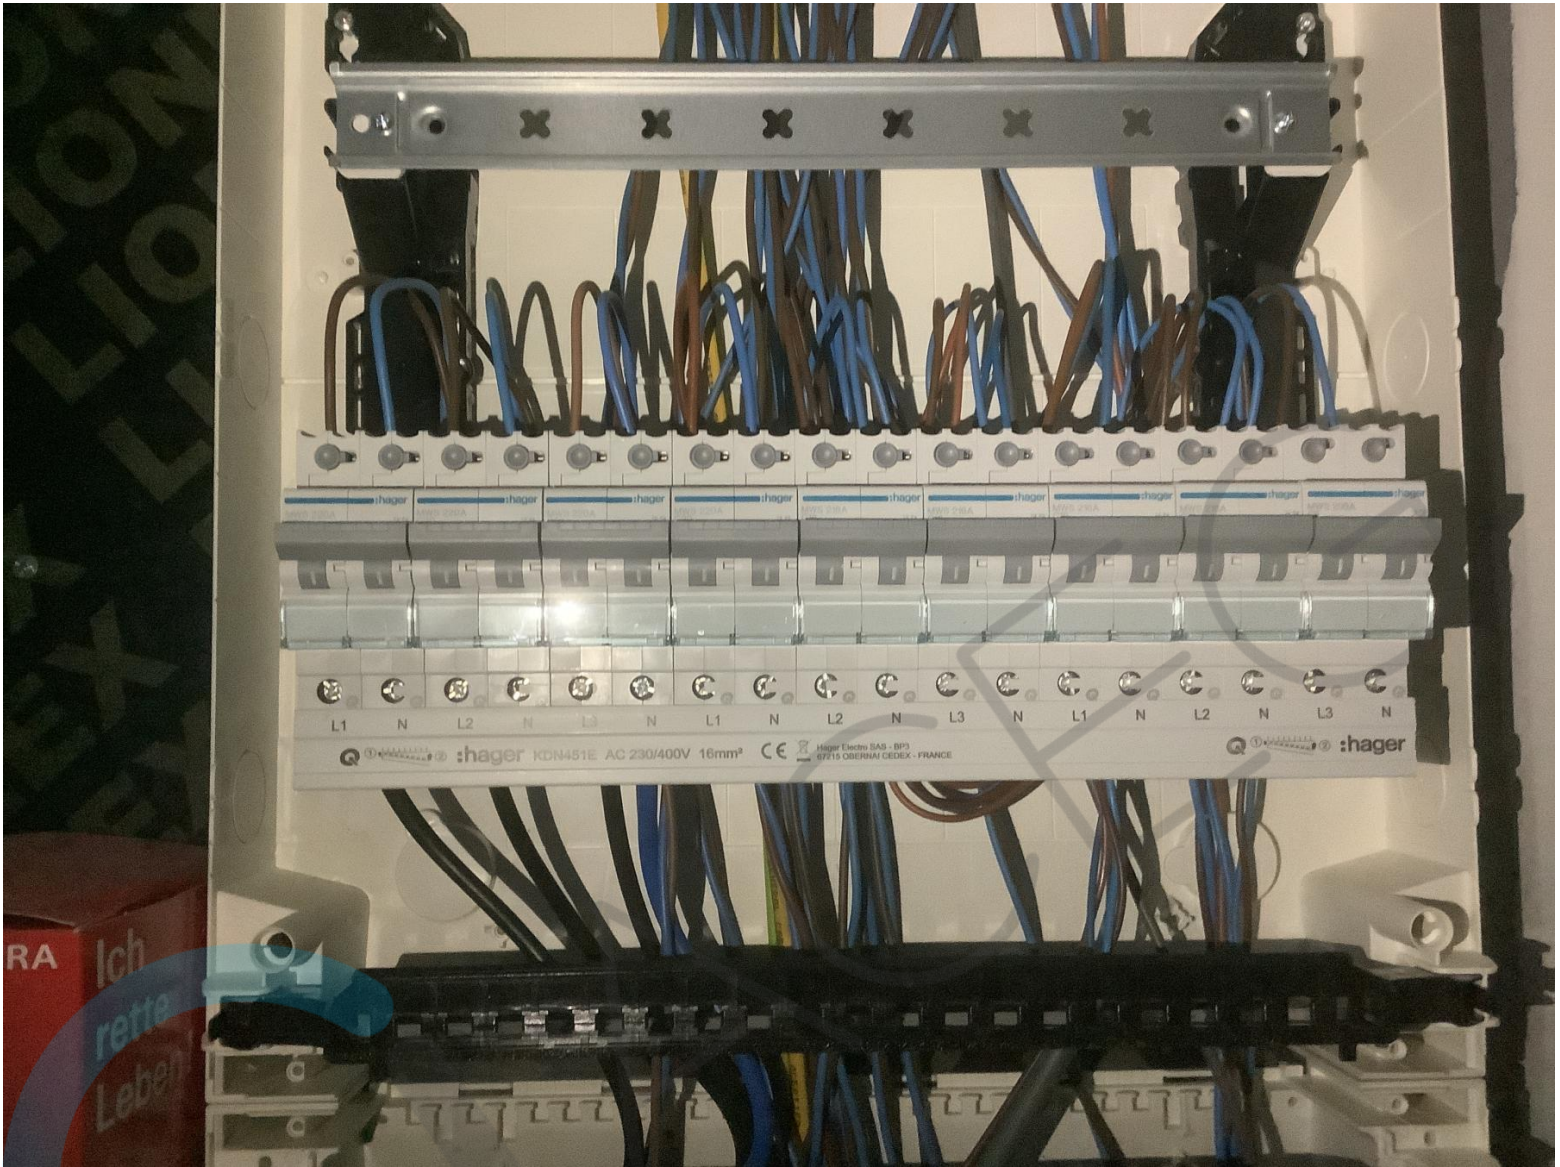

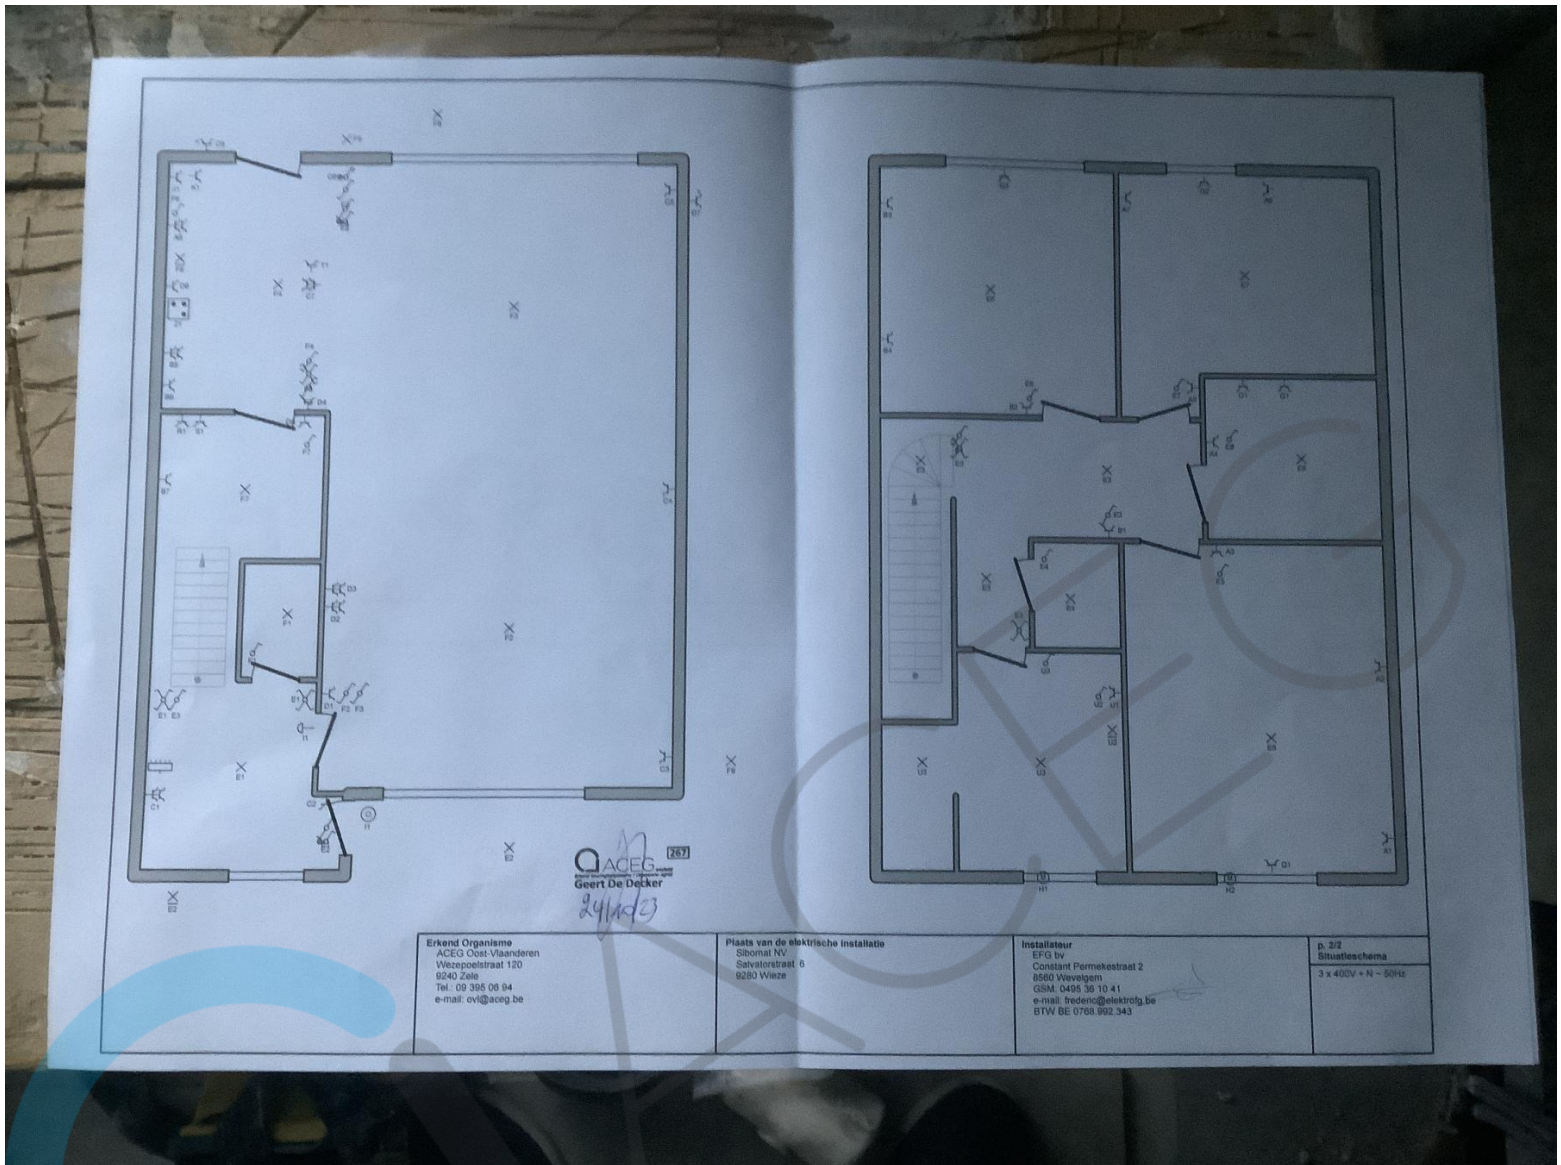

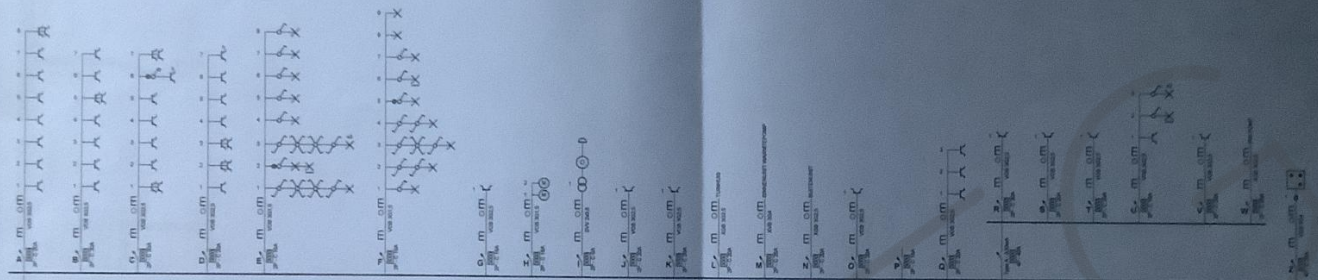


 24/10/23

<p> Erkend Organisme ACEG Oost-Vlaanderen Wezepoelstraat 120 9240 Zelis Tel. 09 395 06 94 e-mail: ovl@aceg.be </p>	<p> Plaats van de elektrische installatie Sibomai NV Salvatorstraat 6 9280 Wisseze </p>	<p> Installateur EFG bv Constanti Permelkestraat 2 8560 Wevelgem GSM: 0495 36 10 41 e-mail: frederic@elektrofg.be BTW BE 0798 992 343 </p>	<p> p. 1/2 Bendraadschema 3 x 400V + N - 50Hz </p>
--	---	---	---



