



Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0169-150603-05 Datum van het onderzoek : 03/06/2015

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : LUYTEN
BOLK 122
2350 VOSSOLAAR

EIGENAAR : LUYTEN
Adres : BOLK 122
2350 VOSSOLAAR

OPDRACHTGEVER : LUYTEN
Adres : BOLK 122
2350 VOSSOLAAR

INSTALLATEUR :
Adres :

BTW of IK :

EAN : 541449500001435212


Teller nr.

65683950

Index :

D138930,0
N121061,6

Visualisatie van de installatie

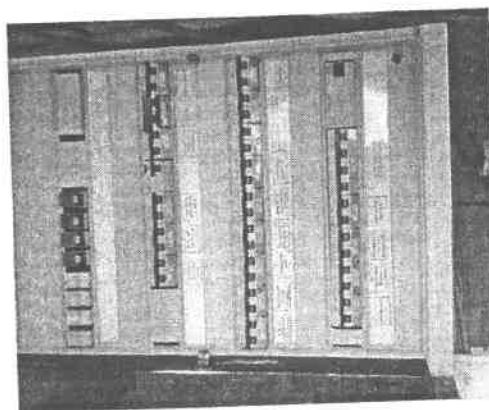

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Wijziging / Nieuwe Installatie / Wijziging /
Begin werken fundering: Voor 01/10/81
Aansluiting spanning : 3x400V + N
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm²
Type van de aardelektrode: Pennen
Aantal borden : 1
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : Horeca
Elektrische installatie : Na 01/01/83
AREI art. : 87
Bescherming van de aansluiting : 40 A
Alg. schakelaar: type : 4p 40A/300mA
Aantal eindstroombanen : 20
Schema : TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270, AREI art. 271,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 11,15 Ohm RI tot 5 Mohm



BESCHRIJVING:

Zie ook eendraad schema en situatie schema in bijlage / Zie ook schets

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 Geen duidelijke onderscheiding tussen café en woongedeelte
Woning volgens art 86 na 01/01/81

Besluit De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
Het ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De agent-onderzoeker,
0169 JORG COOLS

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

- Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)
- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

