

**PROCES-VERBAAL VAN HET BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING**

Algemene gegevens

Visualisatie van de woning en installatie

Adres van het onderzoek Mollestraat 8 (verdieping 3)  
1730 Asse  
Type van lokalen wooneenheid (appartement)  
Eigenaar Neal Van de Perre  
Verantwoordelijke voor de werken Onbekend  
Identiteitskaart niet gecommuniceerd  
Datum van de controle 12/05/2017  
Type controle Periodieke keuring (Art. 271)  
Agent Robin Vaeremans



Gegevens van de aansluiting

Distributienetbeheerder (DNB)	IVERLEK	Type verbinding	ondergronds
EAN code	niet gecommuniceerd	Voedingskabel hoofdbord	niet identificeerbaar
Nummer teller	6293487	Nominale spanning	3x400V + N - AC
Meterstand dag / nacht	46929 /	Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting)	10(40)A - Onbepaald - 40A beschouwd

Controle

<b>Conformiteit eendraadschema's en situatieschema's</b>	OK	<b>Aantal verdeelborden</b>	1	<b>Aantal stroombanen</b>	11
Kring(en)	7x auto 16A mono	4x auto 20A mono	Auto 20A tetra		
Bescherming					
Sectie (mm <sup>2</sup> )	1,5	2,5	4		
Conclusie	OK	OK	OK		

De funderingen dateren van Aarding	vòòr 1/10/1981 onbepaald	Minimum gemeten isolatieweerstand (MΩ)	>500
Aardingsweerstand (Ω)	niet meetbaar	Hoofd differentieelstroominrichting	ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Gelijkvormigheid van de equipotentieel en de aardingsgeleiders	Niet te verifiëren - niet toegankelijk	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Aardingscontinuïteit	besluitende	Aansluiting	OK
Foutlus controle	afdoende	Verlichting/toestellen	OK
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Visuele inspectie van vaste en /of mobiele apparaten	OK
		Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK

**Besluit : CONFORM**



Op de datum **12/05/2017**, elektrische installatie "**Mollestraat 8 (verdieping 3) - 1730 Asse**" is conform het algemene reglement op Elektrische installaties.

De controle uitgevoerd door **Certinergie** is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

Eén of meerdere eendraadschema's / situatieschema's zijn gecontroleerd geweest en zijn conform met de installatie.

Zonder belangrijke wijzigingen van de elektrische installatie moet de volgende controle voor **12/05/2042** gebeuren.

Handtekening agent

Handtekening van de eigenaar

**Certinergie VZW - Erkend controleorganisme**

Sociale zetel : 57 Haute Voie straat, 4537 Verlaine  
Domicilie : 60 Diamantlaan, 1030 Brussel  
Domicilie : 11 Brusselsesteenweg, 1300 Waver  
Rekeningnummer : BE57 0688 9789 1035  
BTW nummer : BE0536501654

Website: www.certinergie.be  
Tel: 0800 82 171  
Email : info@certinergie.be

### Opmerkingen

- We kunnen niet uitsluiten dat er bij het voorleggen van de schema's nog andere inbreuken zijn
- De voorschriften van de DNB zijn niet overhandigd
- Wij raden aan de dienstspanning aan te duiden op het elektrisch bord
- De woning was bemeubeld en de plannen zijn niet getoond, het kan dus zijn dat niet alles geverifieerd is
- Er moeten verzegelaccessoires voorzien worden voor de hoofddifferentieel

### Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van huishoudelijke installaties :

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie het te voorzien dat de installatie ten allen tijde conform blijft, een herkeuring te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek, en in geval van verkoop van de elektrische installatie daterende van vòòr 1 oktober 1981 dit te laten doen binnen de 18 maand door een organisme naar keuze. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuken of een deel ervan standhouden moet het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag sturen de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

### Samengevat; welke acties dienen er genomen te worden indien de elektrische installatie conform is?

1

Lees nadrukkelijk dit proces-verbaal

2

In het geval van uitbreidingen, belangrijke veranderingen aan de installatie, laat de installatie opnieuw controleren

3

Als het geldigheidstermijn van het rapport is verstrekken, laat de installatie opnieuw controleren

4

Certinergie is tot uw dienst om deze controle uit te voeren

### Certinergie VZW - Erkend controleorganisme


Sociale zetel : 57 Haute Voie straat, 4537 Verlaine  
Domicilie : 60 Diamantlaan, 1030 Brussel  
Domicilie : 11 Brusselsesteenweg, 1300 Waver  
Rekeningnummer : BE57 0688 9789 1035  
BTW nummer : BE0536501654

    
Website: www.certinergie.be  
Tel: 0800 82 171  
Email : info@certinergie.be

Eendraadschema('s) van de installatie



Situatieschema van de installatie

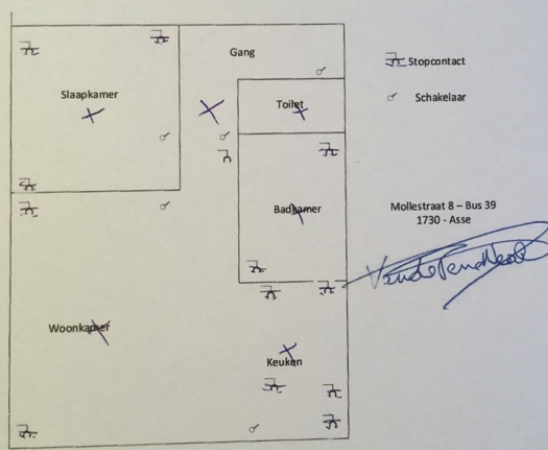

Certinergie VZW - Erkend controleorganisme

Sociale zetel : 57 Haute Voie straat, 4537 Verlaine  
Domicilie : 60 Diamantlaan, 1030 Brussel  
Domicilie : 11 Brusselsesteenweg, 1300 Waver  
Rekeningnummer : BE57 0688 9789 1035  
BTW nummer : BE0536501654

  
Website: www.certinergie.be  
Tel: 0800 82 171  
Email : info@certinergie.be
