



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 389/14/19.06/dy

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: AV. FRANZ GUILLAUME
1140 BXL

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: DEVOGELAERE

Adresse: RUE DE LA PISSELOTTE 20

INSTALLATEUR: 6142 LEERNES

Adresse: _____

TVA ou CI: 0450535702

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n°: _____
Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 06/11/2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - ~~visite de contrôle suivant:~~
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 234) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - ~~Extension~~ - ~~Modification~~ - ~~Temporaire~~ - ~~Renforcement~~ - ~~Vente d'habitation~~; Type locaux: App B6A

Début travaux: ~~Fondations avant~~ - après 1.10.81 - Installation électrique ~~avant~~ - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 2x230 V Protection raccordement Mux 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 2 X 10 mm² Inter.gén.: type D40/0,3A

électrode de terre: ~~boucle~~ - ~~barres~~ - ~~piquets~~ - ~~conducteur horizontal~~ Schéma: (TT)

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 13; RA: 16,55 Ohm; RI tot: >0,5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: voir schemas

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

Note: la valeur RA est prise du rapport 303/18.01.26/03

CONCLUSION

- 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 06/11/39 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- 2. L'installation n'est pas conforme
- 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 389K. Ben Fleussen
(N°, nom, signature)


pour Le Directeur,



* V E R S L A G - R A P P O R T *




siège social: Rue Nieuweld 105, boîte 6, B-1200 Bruxelles

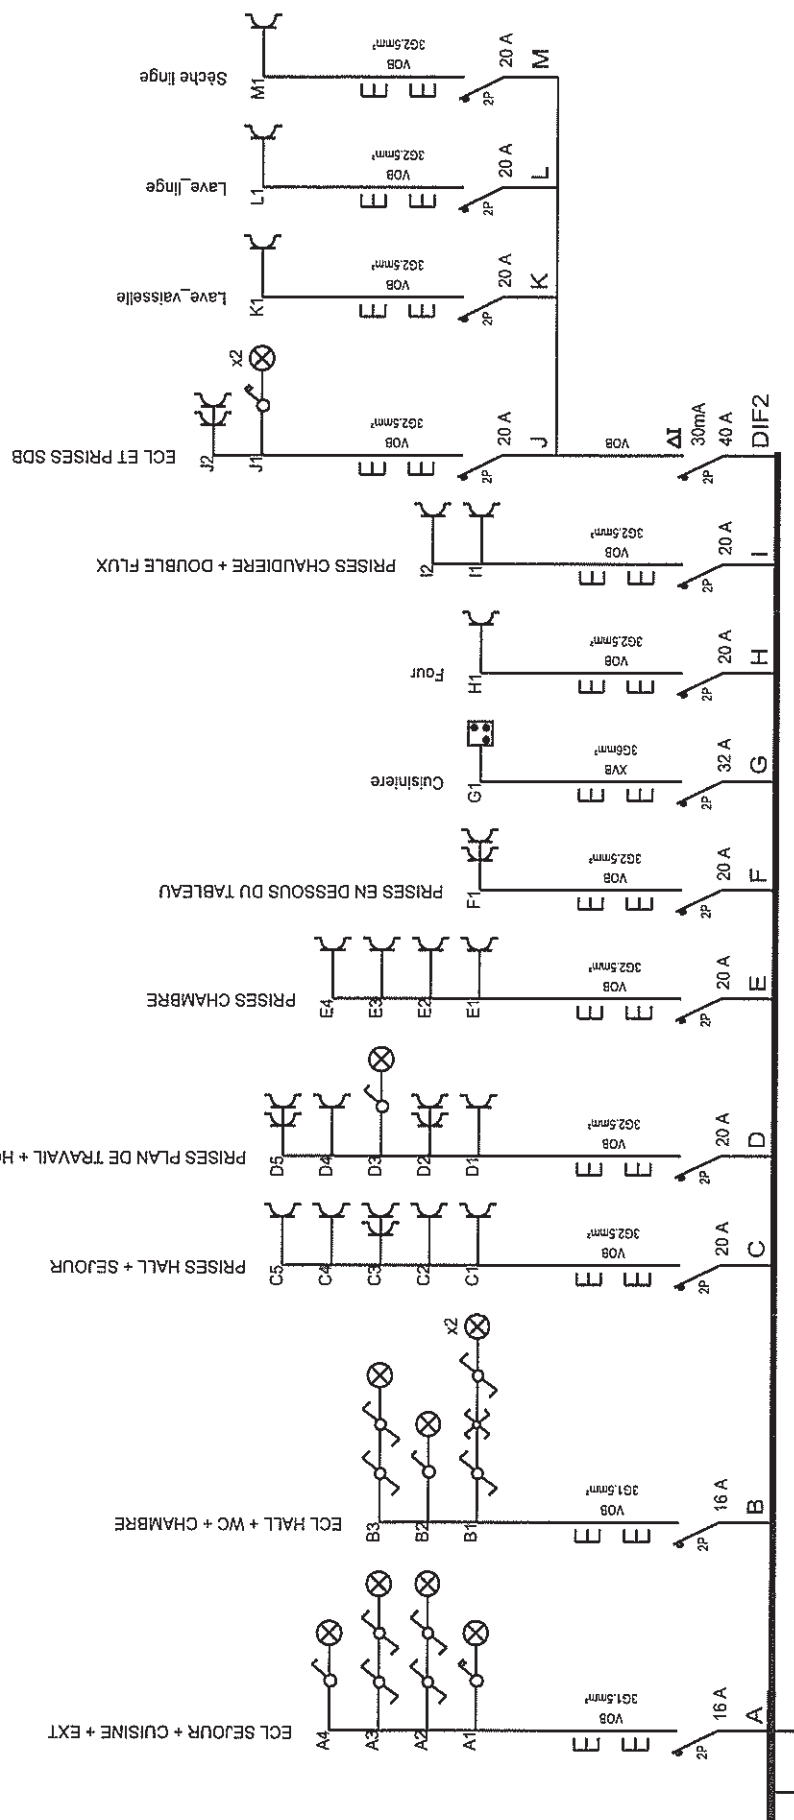

06.11.2014

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	APP B 6 A
Naam/Nom : DEVOGELAERE ELECTRICITE BTW/TVA : .. Datum/Date : 30/04/2014 Handtek/Sign : DEVOGELAERE PHILIPPE	ORGANIS. : .. Naam/Nom : .. Datum/Date : .. Handtek/Sign : ..	Naam/Nom : ARENA 6 B 6 A Straat/Rue : AVENUE FRANZ GUILLAUME Gemeent/Comm : EVERE Handtek/Sign : ..	

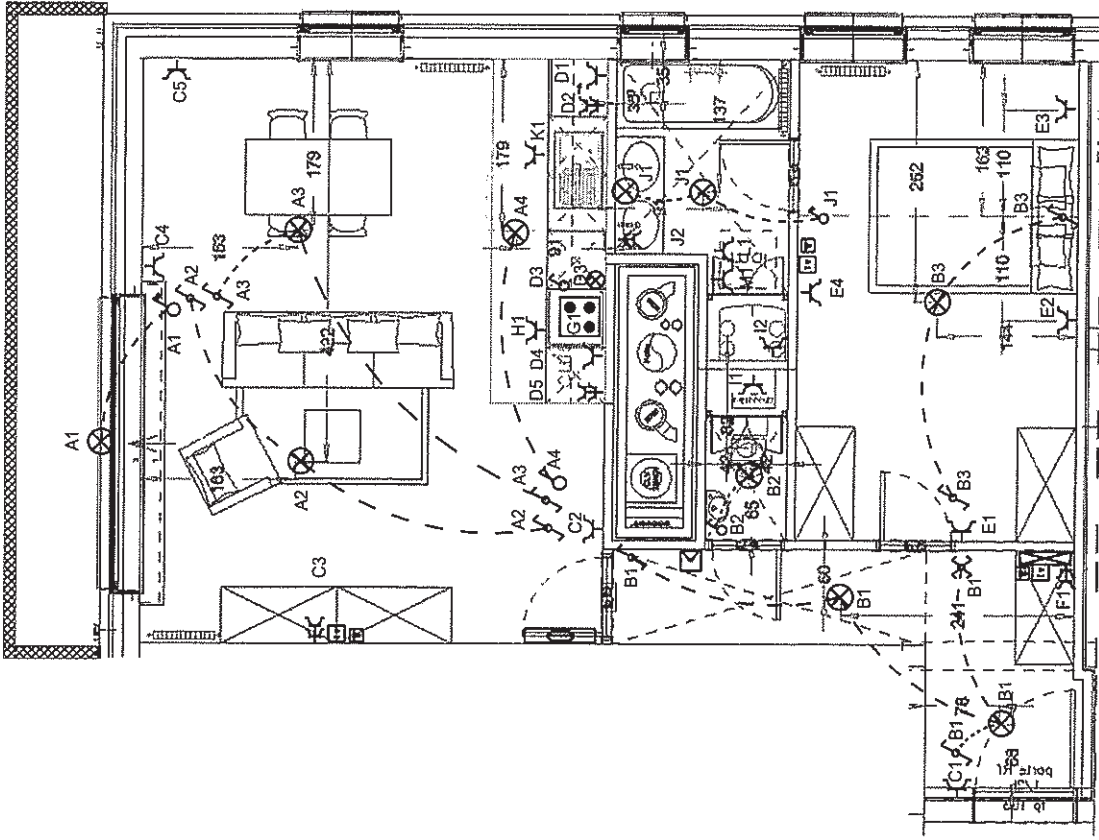

INSTALLATEUR
 Naam/Nom : DEVOGELAERE ELECTRICITE
 BTW/TVA : ..
 Datum/Date : 30/04/2014
 Handtek/Sign : DEVOGELAERE PHILIPPE

KEURING/CONTROLE
 ORGANIS. : ..
 Naam/Nom : ..
 Datum/Date : ..
 Handtek/Sign : ..

WERF/CHANTIER
 Naam/Nom : ARENA 6 B 6 A
 Straat/Rue : AVENUE FRANZ GUILLAUME
 Gemeent/Comm : EVERE
 Handtek/Sign : ..

APP B 6 A
