

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.:211/121018/04

BTV

ZETEL ANTWERPEN

Van Der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. (02)230.81.82

Fax (02)230.80.08

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1000 Brussel

Tel. (02)230.81.82

Fax (02)230.80.08

BTV

Leuvensesteenweg 383 b1

3200 AARSCHOT (Gelrode)

Tel 016/63.47.45

Fax 016/63.12.21

btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

**PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : Karel van Lotharingen 26 B0501

3000 Leuven

EIGENAAR : Gerits

Adres : Leuven

OPDRACHTGEVER : Gerits

Adres : Leuven

BTW of IK :

EAN: Eandis

Ref.:

Teller nr.

Index:

Datum van het onderzoek : 18/10/2012 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) ((AREI art. 271) (**AREI art. 276**) (AREI art 276bis) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. Stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom : Type der lokalen :

Begin Werken : Fundering voor-na 01/10/81 - Elektrische installatie voor-na 01/10/81 - 01/01/83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 230V

Bescherming van de aansluiting : Max 40A

Voedingskabel hoofdbord : 4x 10 mm²

Alg. schakelaar : type : Diff 300mA /40A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : zie schema

; RA : 230hm; RI tot 0.6 Mohm

Uitwendige invloedsfactoren :

BESCHRIJVING :

Details zie schema,s

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso**VASTGESTELDE INBREUKEN :** Geen**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS :** Zie bijlage**BESLUIT**

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/10/2037 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum

2. De installatie is niet conform

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER :

Nr211 E Liesmons

De Directeur,



Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.
Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

UITGEVOERDE CONTROLES

- A) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
- b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
- d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
- e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwerking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
- g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's : betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

KANTOREN

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15 - 1000 BRUSSEL
Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08
E-mail : E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65
E-mail : E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be

BUREAUX


SIEGE DE BRUXELLES

Bld. Clovis 15 - 1000 BRUXELLES
Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08
E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be


SIEGE ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANVERS
Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65
E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be

Balkon

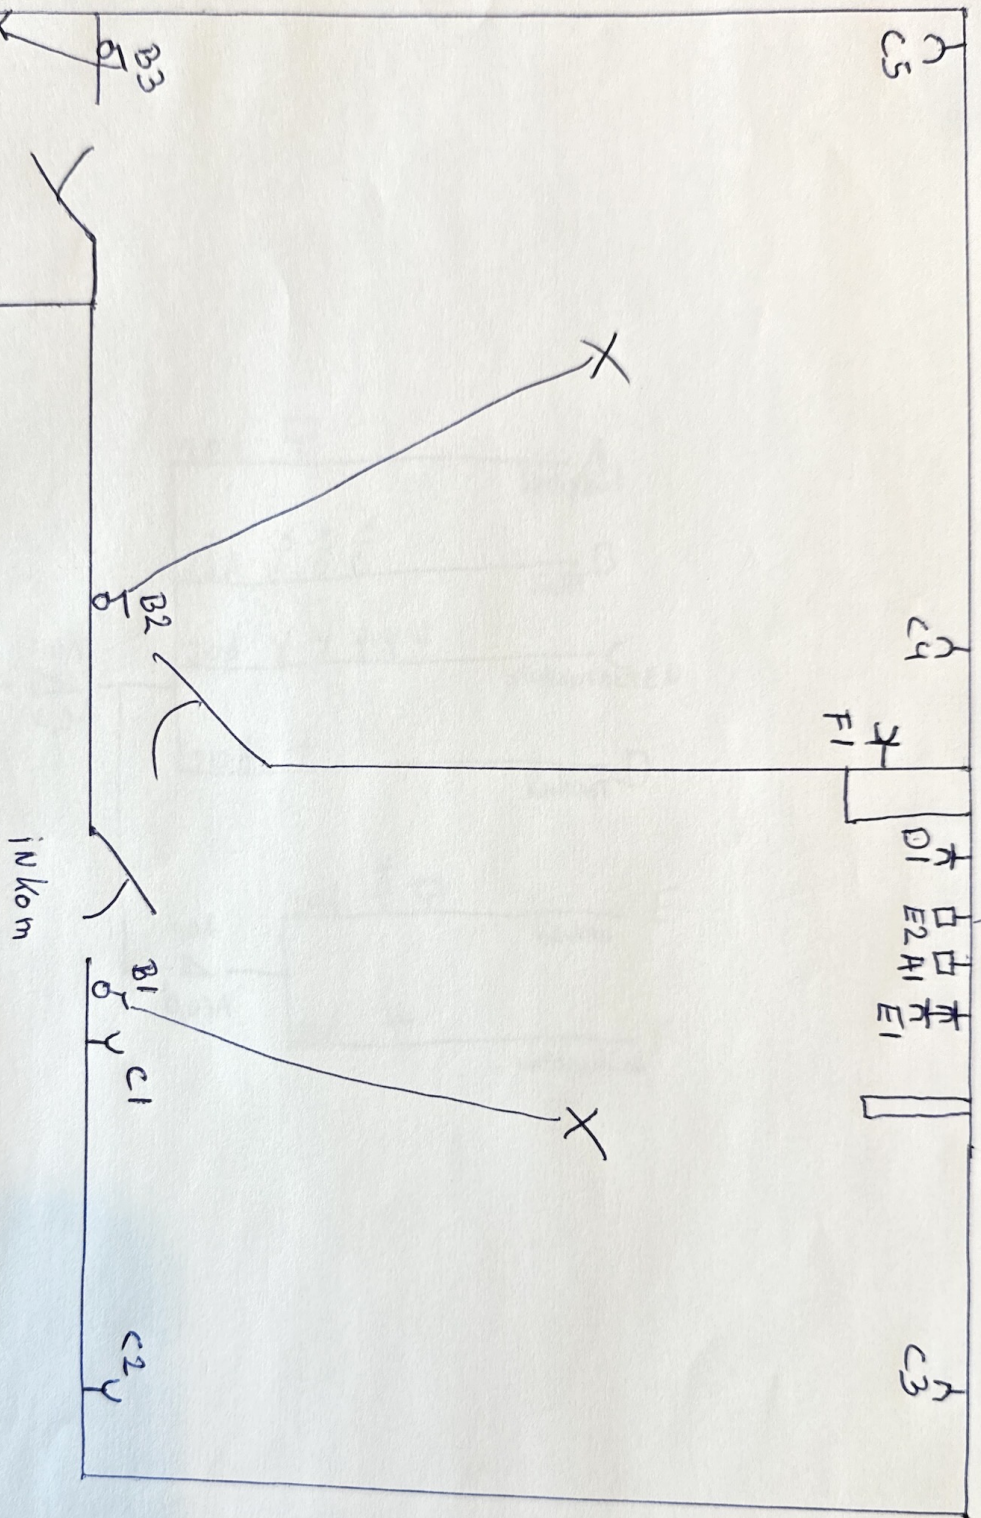

Kardian lothningen 2b, etage 5

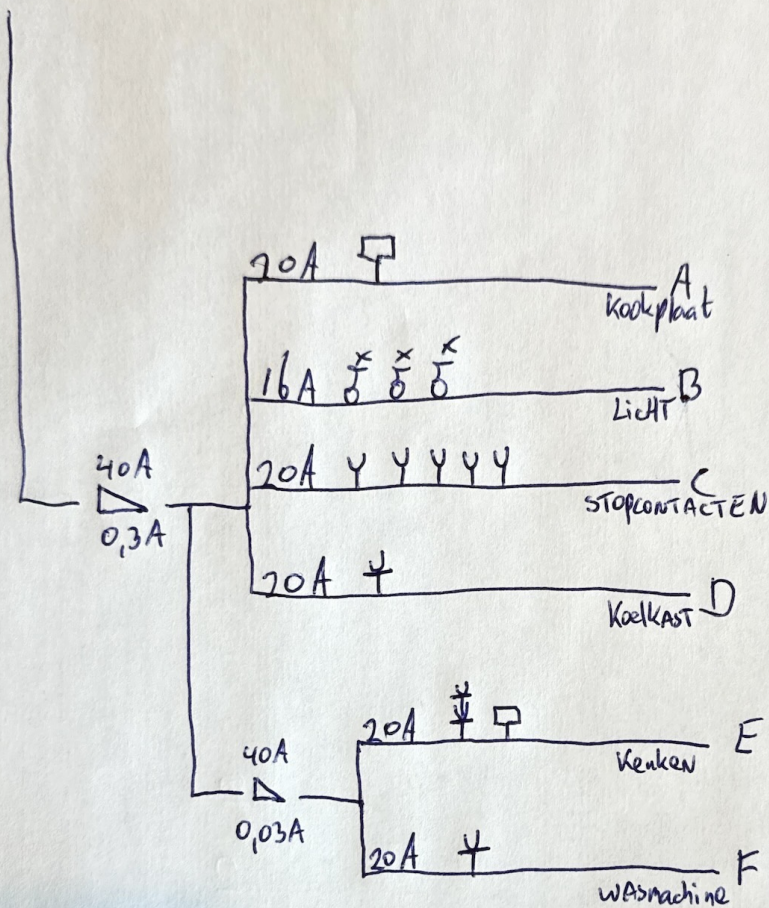

Karel van Lotharingen 26, etage 5 Links

2/R.
