



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 13/10/2020 Uitgiftedatum verslag: 13/10/2020
Verslagnummer: 0470-201013-06

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 09 252 45 45 E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0470

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DE JAEGER FREDERIK

Adres: DOORNZEELSESTRAAT 55, 9940 EVERGEM

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: VAN GAMPELAERE

Adres: KORTRIJKSESTEENWEG 537, 9000 GENT

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: DE JAEGER FREDERIK

Adres: DOORNZEELSESTRAAT 55, 9940 EVERGEM

BTW-nummer: 0878692019

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: VAN GAMPELAERE

Adres: KORTRIJKSESTEENWEG 537, 9000 GENT

EAN- code:

Nummer teller: 31465231

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Woonenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 2 x 6 mm²

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardelektrode: Aardingsbaren

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal borden: 2

Aantal stroombanen: 15 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

**Resultaten van de controle:****Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 7.5 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 0.7 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 De nieuwe voedingskabel voor de zekeringskast zit klaar om rechtstreeks te worden aangesloten door fluvius bij verzwaring van de aansluiting
- 2 Dit verslag kan gebruikt worden voor verzwaring.
- 3 nota ivm de overgangsbepaling staat genoteerd op het schema

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 13/10/2045
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.





Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):




Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



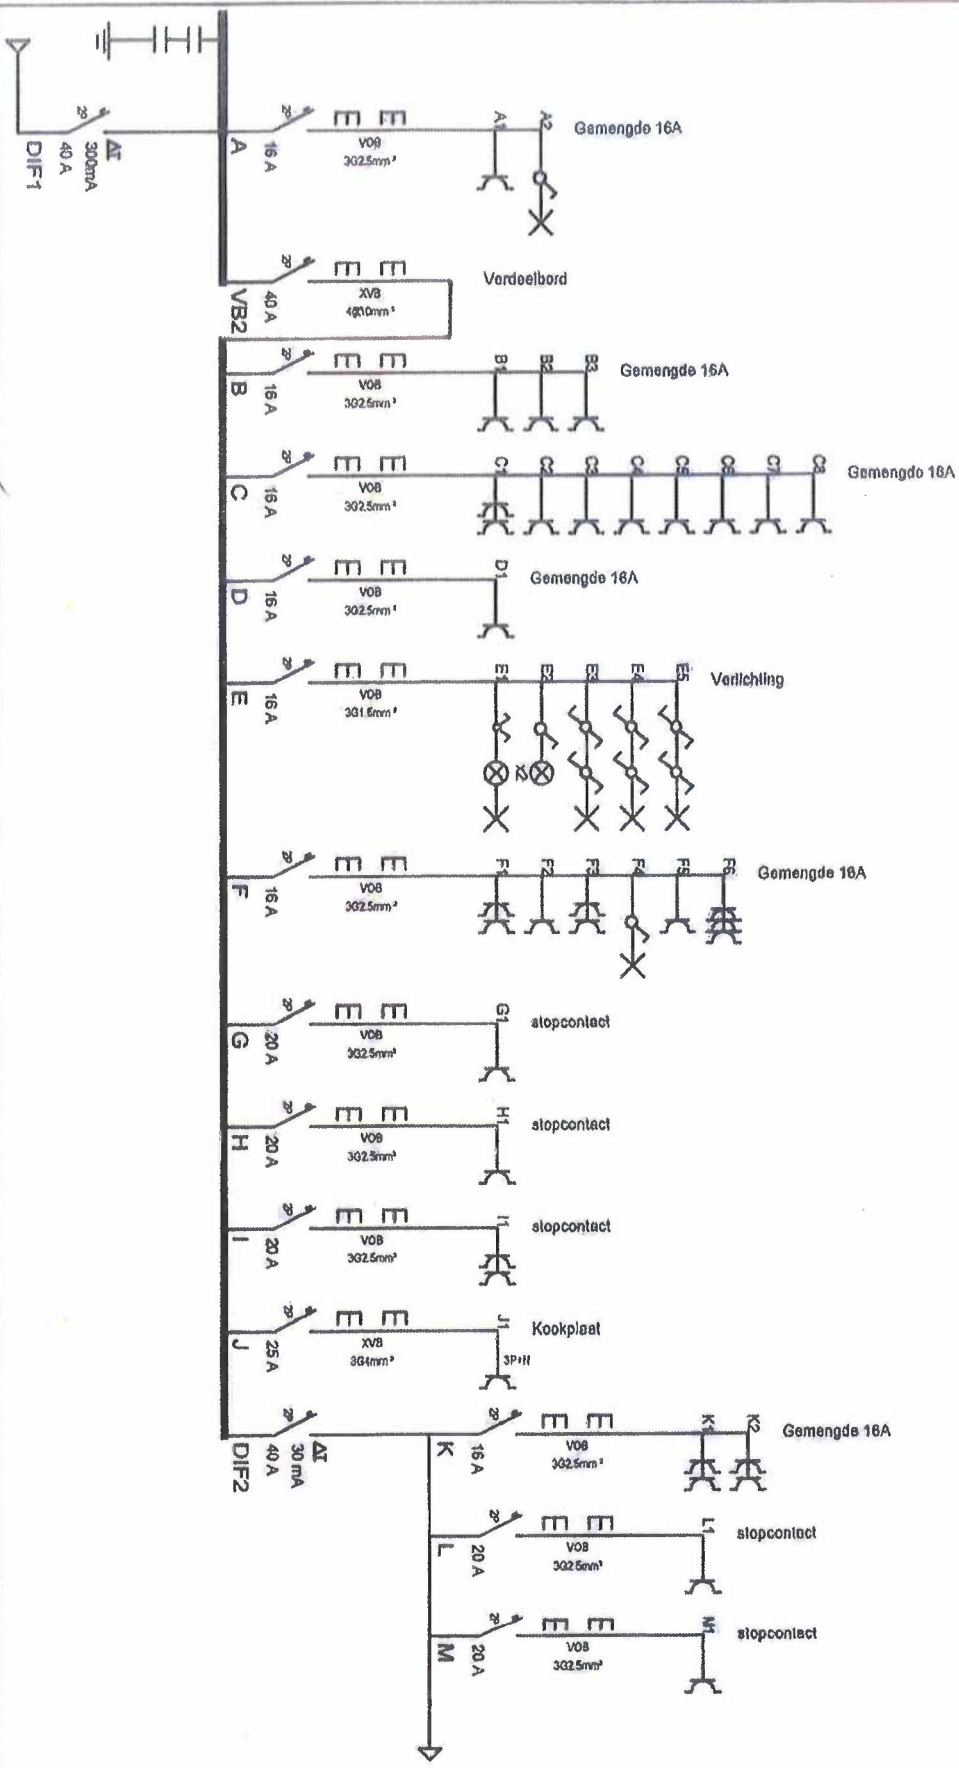

INSTALLATEUR

Naam: de Jaeger F. BVBA
 STW: BE0678 692 019
 Datum: 08/09/2020
 Handteek: Frederik

KEURING

Naam: ...
 Datum: ...
 Handteek: ...


13 OKT. 2020

WERF

Naam: Guy Van Ganpele
 Straat: Koninkrijksesteenweg 537
 Gemeen: 9000 Gent
 Handteek: Einddraadschema

Schemata

3N, 400V/230V~

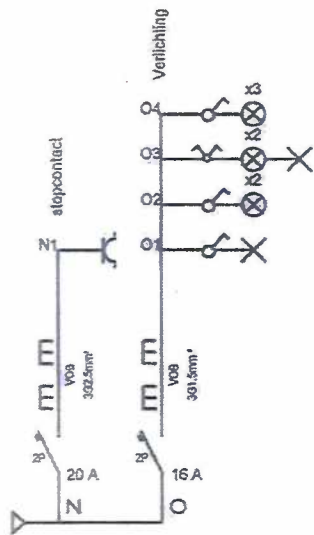

INSTALLATEUR		KEURING	WERF	Schema1B	3N, 400V/230V~
Naam	de Jaeger F. BVBA	ORGANIS. ..	Naam	Guy Van Gampelaere	
BTW	BE0978 692 019	Naam ..	Straat	Kortrijksesteenweg 537	
Datum	03/09/2020	Datum ..	Gemeen	9000 Gent	
Handtek	Frederik	Handtek ..	Handtek	Eendraadschema 2	

13 OKT. 2020

