



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM


Datum keuring: 18/04/2025	Inspecteur: Bavo Poelvoorde	Mentor:	Installateur:
ID-label:	B.T.W. nr.:-	Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557	Serienummer: 19481238		
Datum verslag: 18/04/2025			
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Kantonstraat	Naam	
Huisnummer	56	Straatnaam	Kantonstraat
Busnummer		Huisnummer	56
Postcode	9320	Busnummer	
Gemeente	Nieuwerkerken	Postcode	9320
Land	België	Gemeente	Nieuwerkerken
		Land	België
		Installateur	
		Naam	Ronny - Conny Coen - Van De Sype
		BTW nr.	-
		Telefoonnummer	+32 486 03 44 73
		E-mail	rc.coen@hotmail.com
Type : woning	EAN : 54	Teller Nr. : 24732702	
Afbeelding schakel- en verdeelbord:	☒ Niet meegedeeld		
Aard onderzoek:	Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.		
Netbeheerder: FLUVIUS	Spanning: 3~230V	Meter / bord verbinding: 10 mm²	Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 4	Aantal kringen: 31		
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders			

Ri algemeen: 1,956 MΩ

RE: 24,7 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	-	-	A		OK	OK
300	40	-	-	A		OK	OK
300	40	-	-	A		OK	OK
30	25	-	-	A		OK	OK
30	25	-	-	A		OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.
 nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
 Deze keuring heeft geen betrekking tot pv installatie en nachtteller

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 18/4/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:12 tot 13:02
 De inspecteur Bavo Poelvoorde

Bavo Poelvoorde

Bavo Poelvoorde
 ACEG VZW - #284

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/4/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




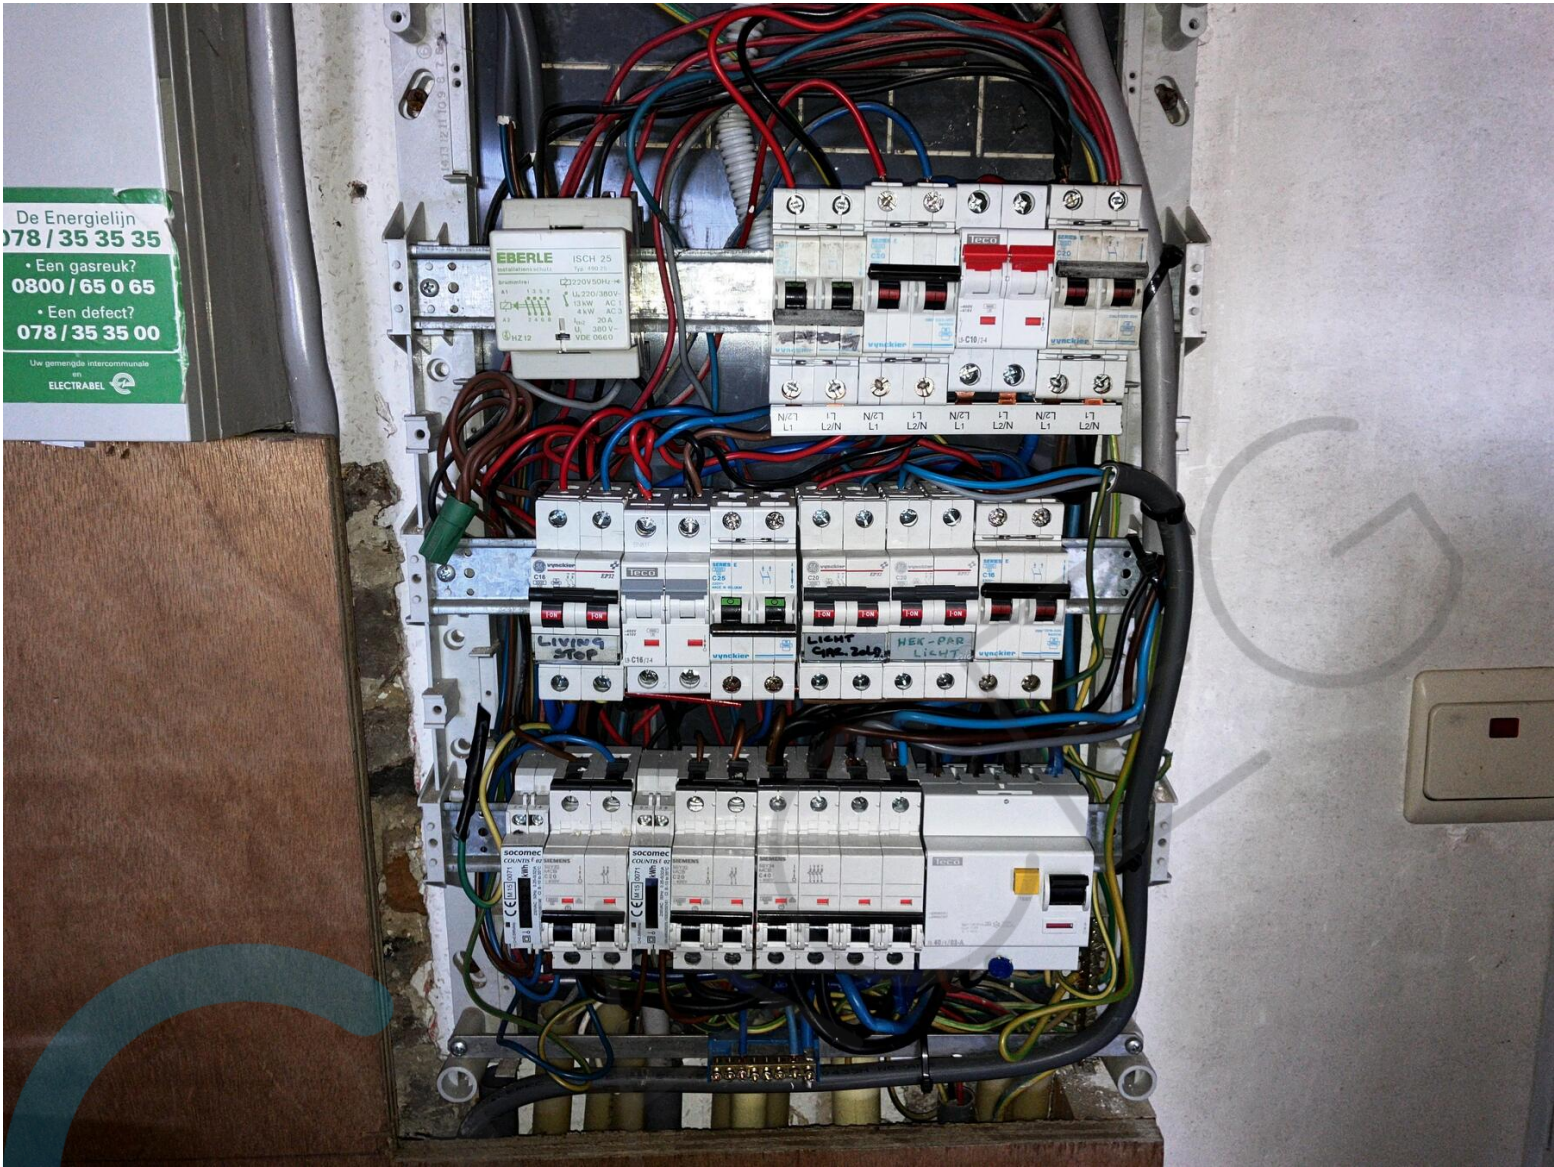




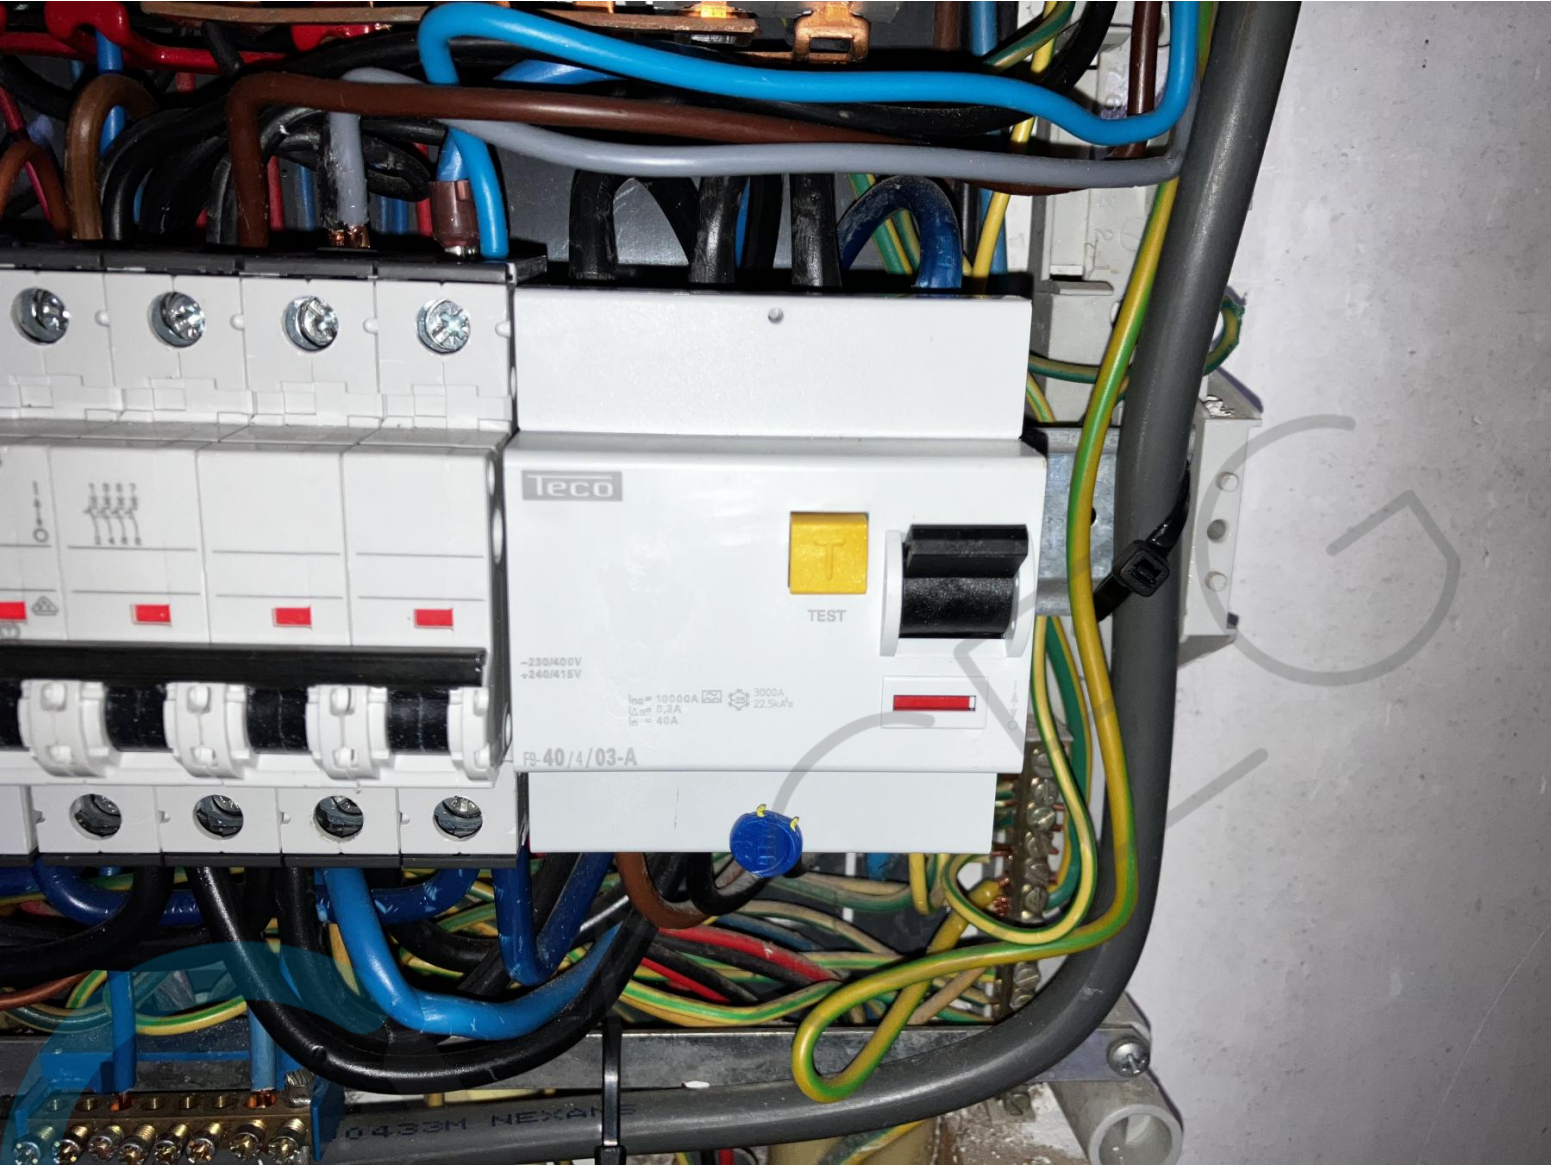



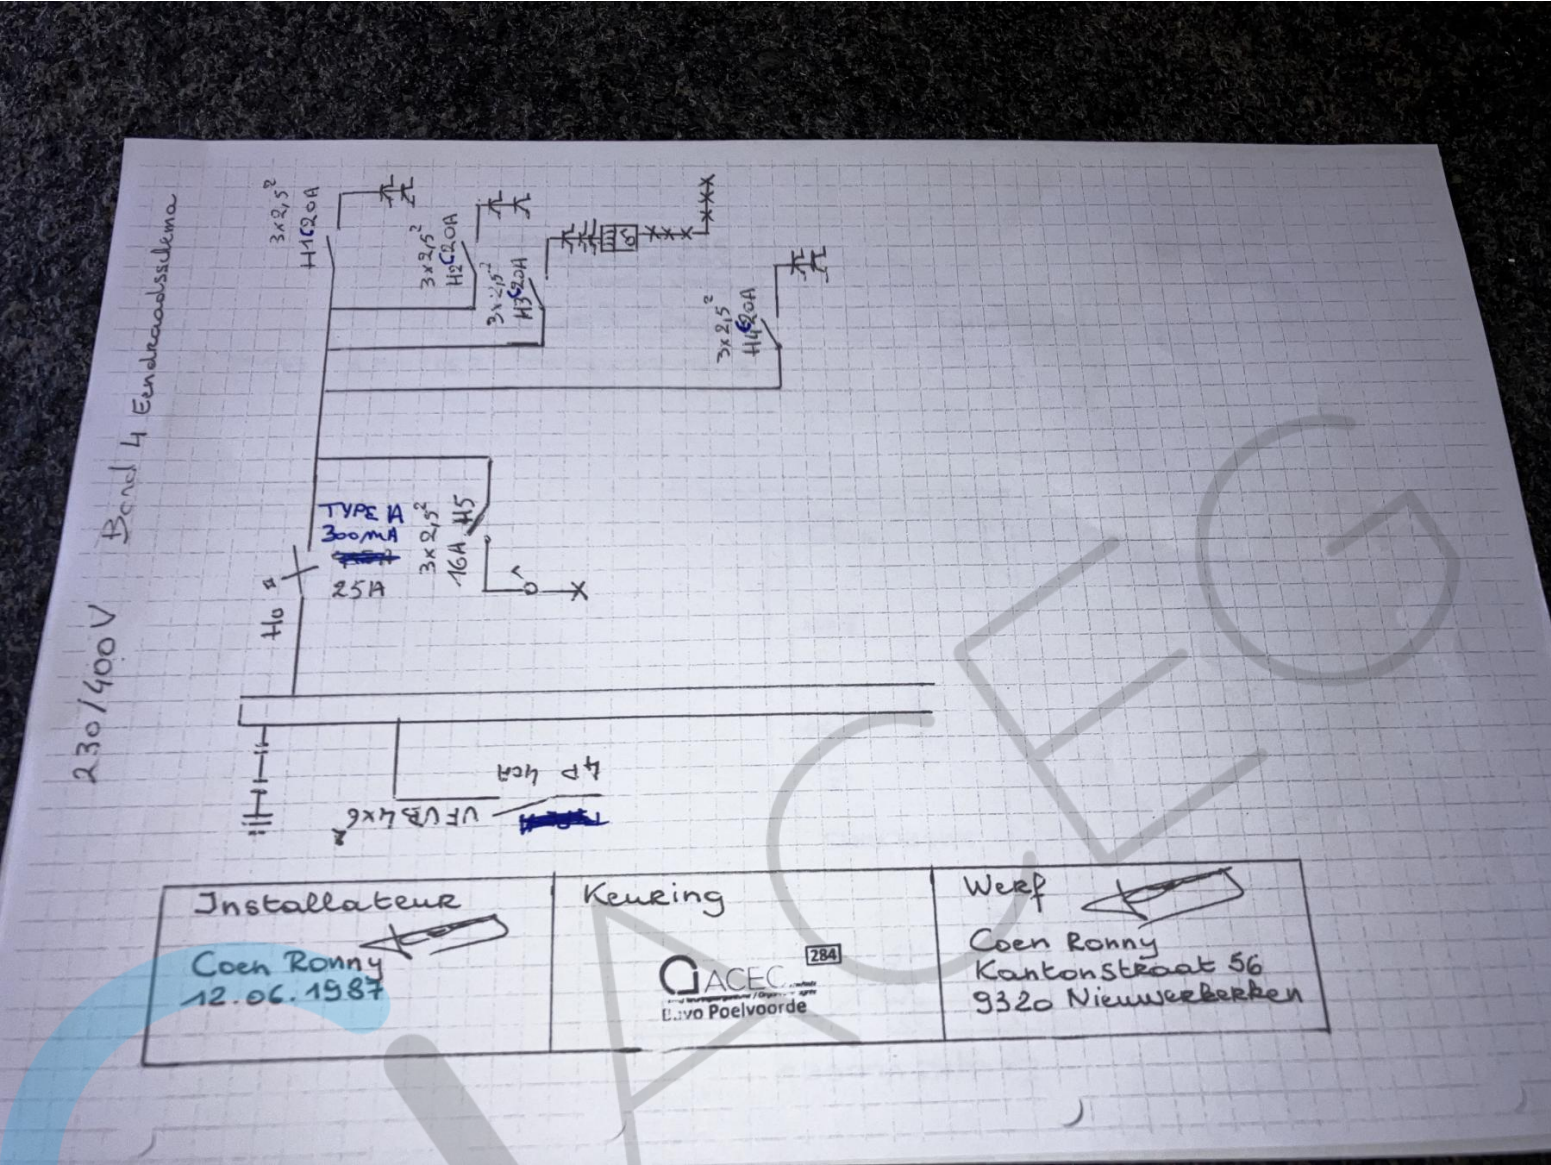


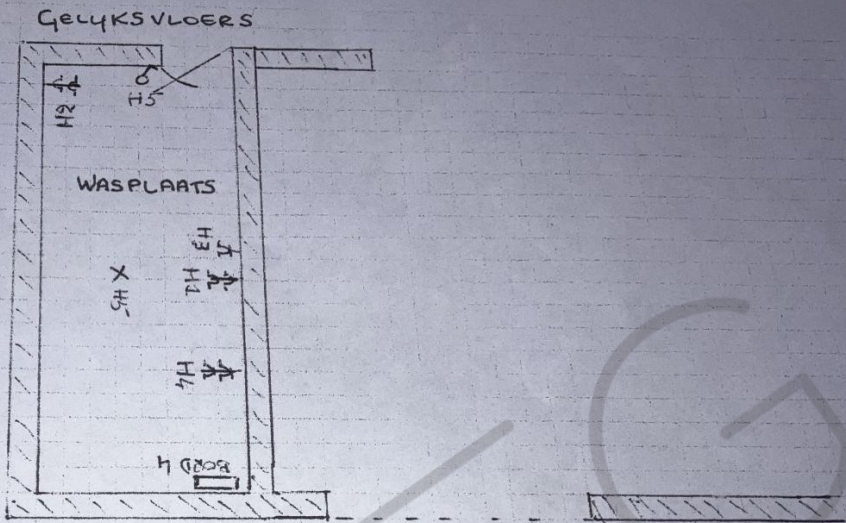

Situatieschema 230/400V Bord 4

Installateur Coen Ronny 12.06.1987 	Keuring 284	Werk Coen Ronny Kantonstraat 56 9320 Nieuwkerkeken
--	--------------------	---

230/400V Band 3 Eendradesschema

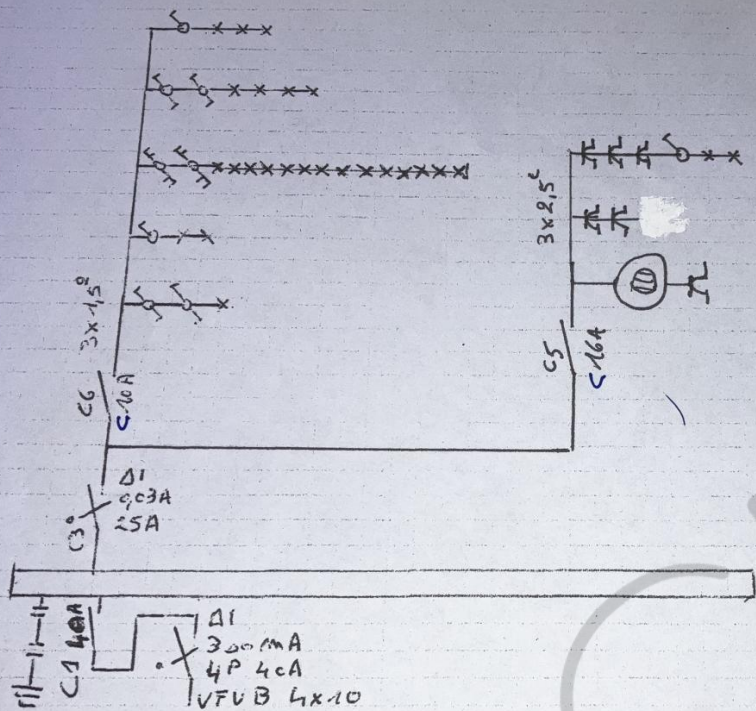

Installateur

Coen Ronny
12.06.1987

[Signature]


Keurder

ACEG
Bavo Poelvoorde

284

Werk

Coen Ronny
Kantonstraat 56
9320 Nieuwerkerken

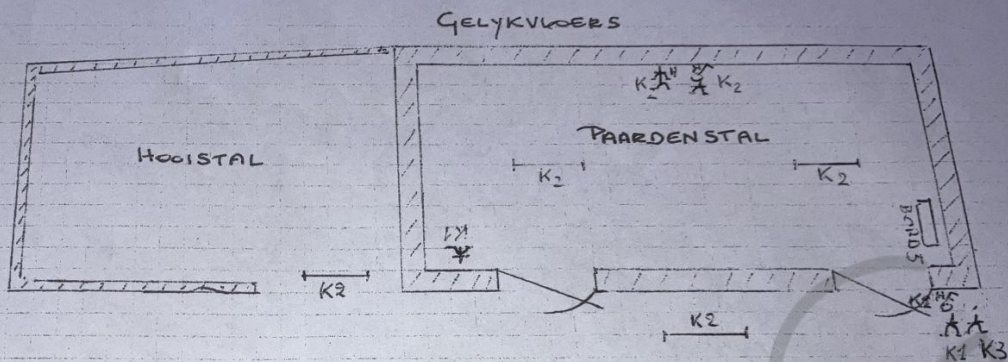

Situatieschema Breed 5 230/400V

Installateur	Keuring	WERF
COEN RONNY 12.06.1987 <i>Coen R</i>	 284	Coen R COEN RONNY KANTONSTRAAT 56 9320 NIEUWERKERKEN

