

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 17/10/2024

Inspecteur: Floris Kok

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251385

Datum verslag: 21/10/2024

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1705116

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Groenstraat  
Huisnummer 69  
Busnummer 2  
Postcode 9700  
Gemeente Oudenaarde  
Land België

### Eigenaar

Naam Helga Colpaert  
Straatnaam Blekerijstraat  
Huisnummer 47  
Busnummer 201  
Postcode 9700  
Gemeente Oudenaarde  
Land België

### Installateur

Naam -  
BTW nr. -  
Telefoonnummer -  
E-mail -

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: : 26252381

Niet meegeedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS  
Aantal borden: 2  
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup>

Max beveiliging: 40 A



Aantal kringen: 1+10

Ri algemeen: 1,08 MΩ

RE: 1,10 Ω

OK

OK

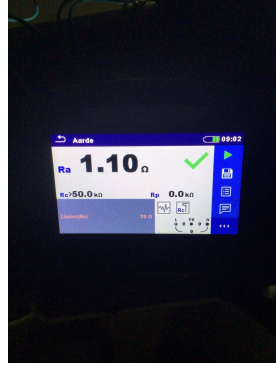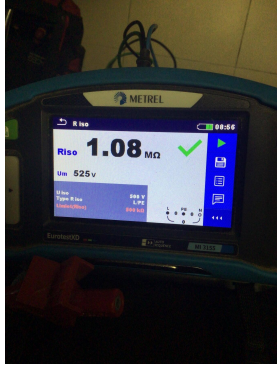

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I <sub>t</sub>	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

**BESCHRIJVING INSTALLATIE**

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	10		2	4
1	C	32		2	6
2	C	16		2	1,5
7	C	20		2	2,5
1	C	40		2	6

Visueel nazicht (algemeen) OK  
 Aansluitingen OK  
 Equipotentiale verbindingen OK  
 Continuïteit OK

Directe aanraking OK  
 Indirecte aanraking OK  
 schema in bijlage door Aceg vzw NA  
 Doorsnede geleiders OK  
 Verlichting / toestellen OK

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

nota/note 19 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.  
 nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.  
 nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.  
 De PV installatie maakt geen deel uit van deze keuring.

**BESLUIT**

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 17/10/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

Inspectietijd: van 08:47 tot 09:47  
 De inspecteur Floris Kok

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 17/10/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

DUPLICATE




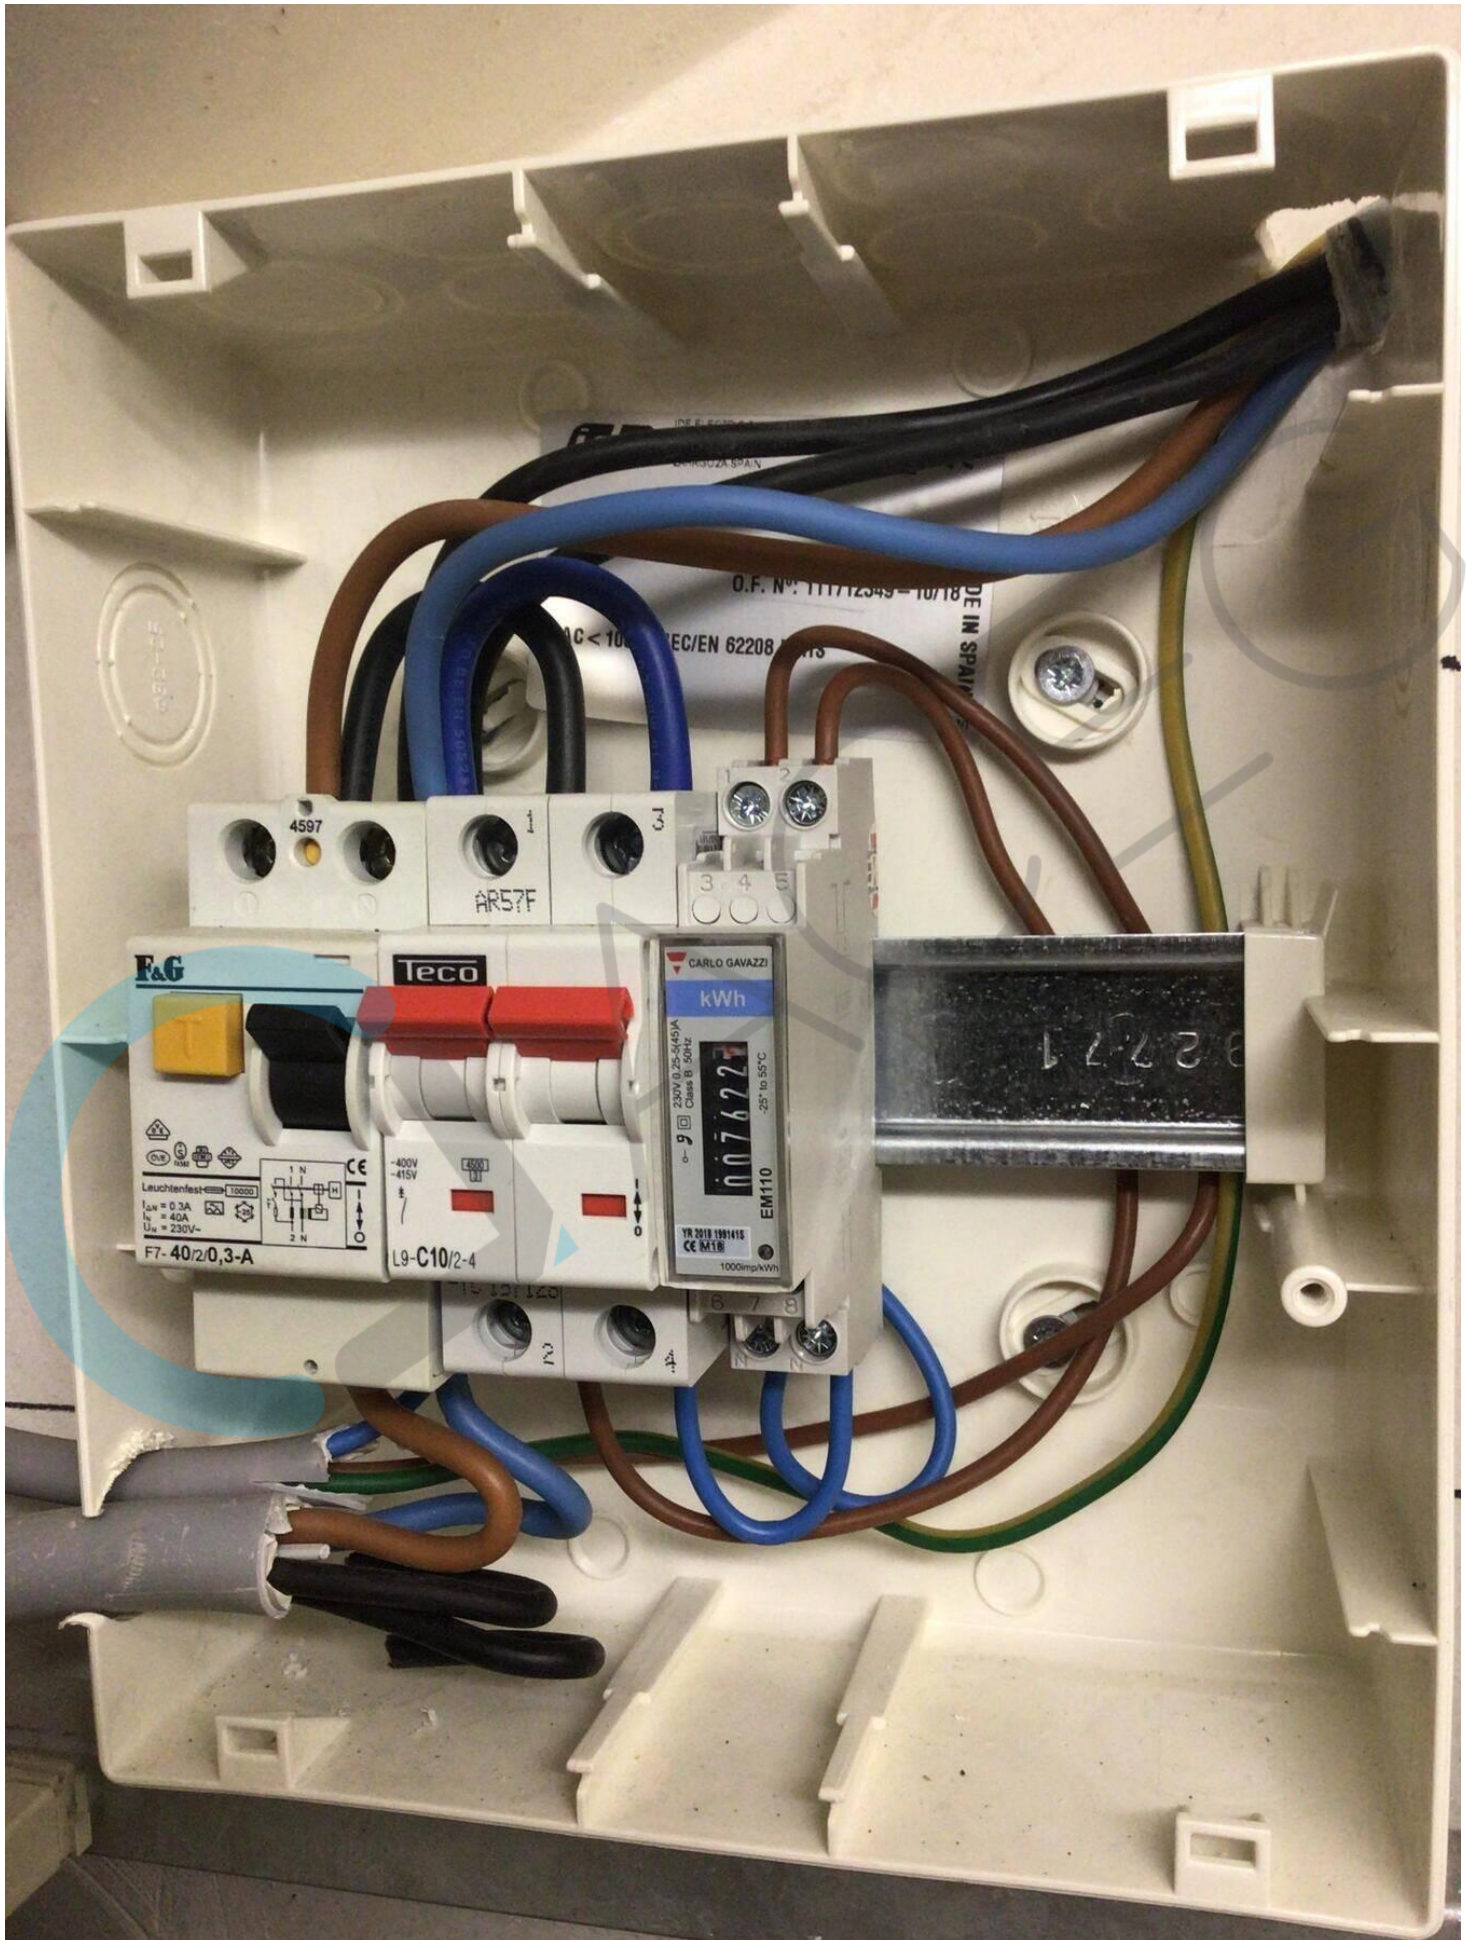








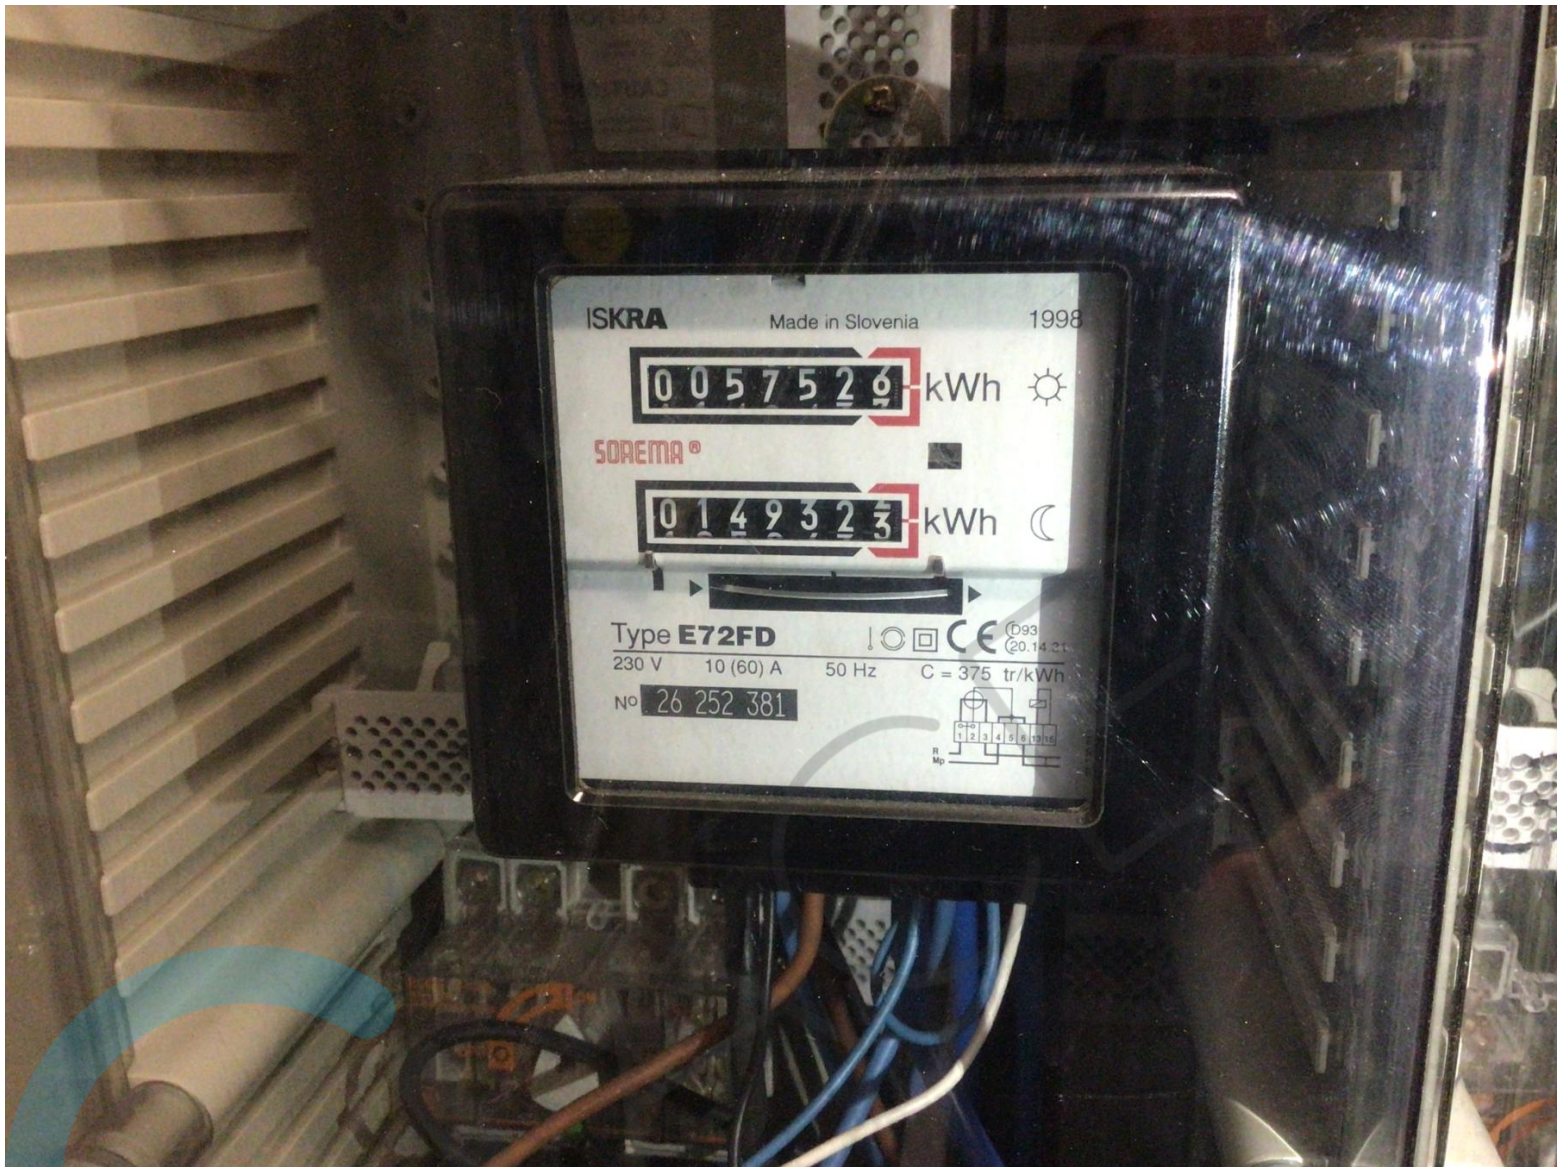






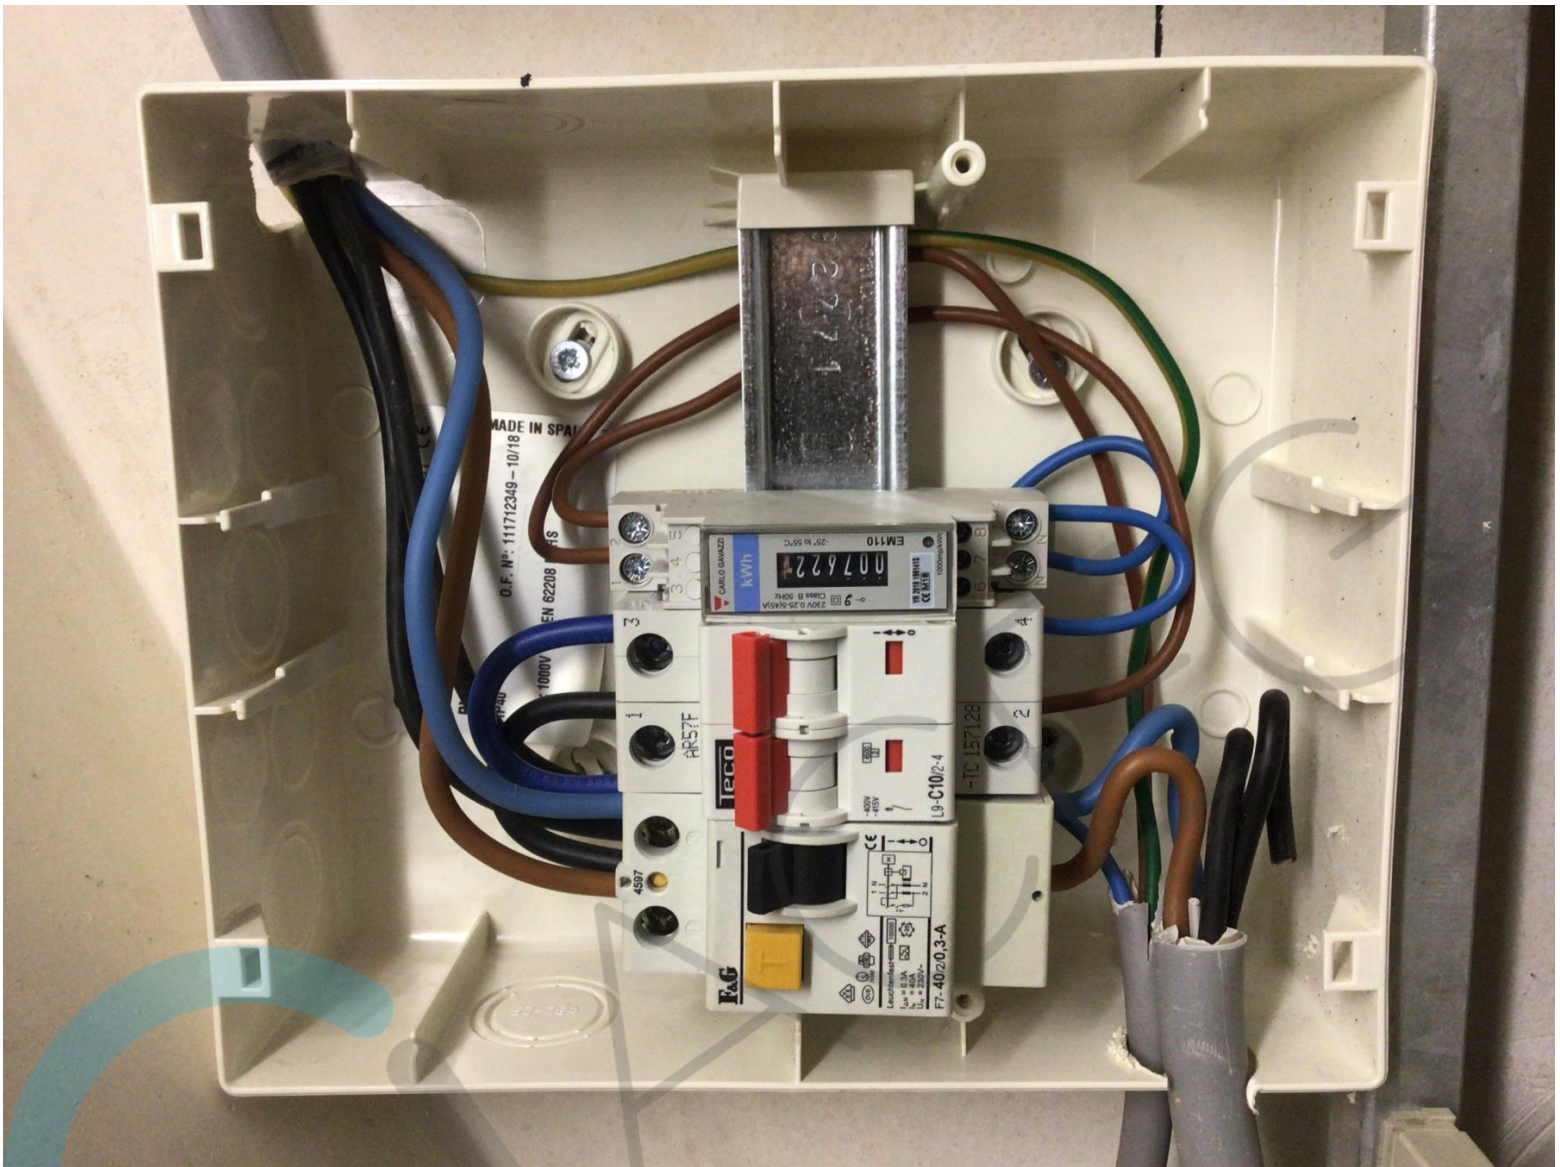








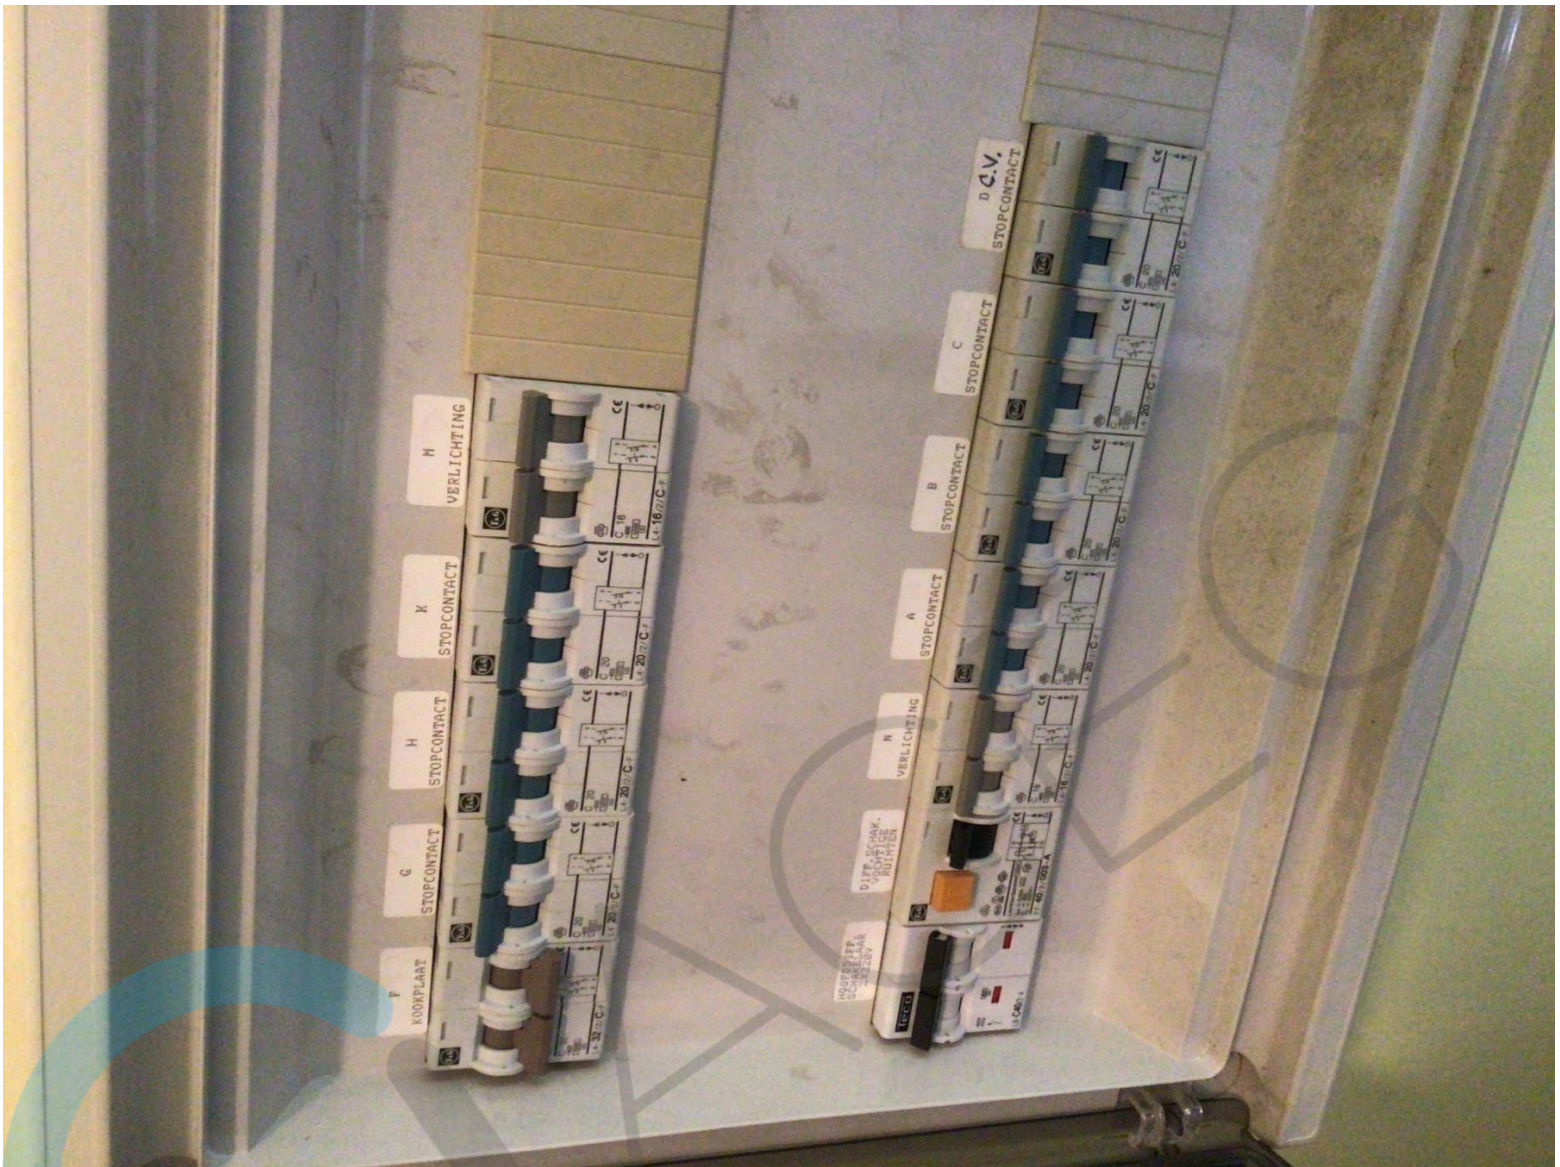



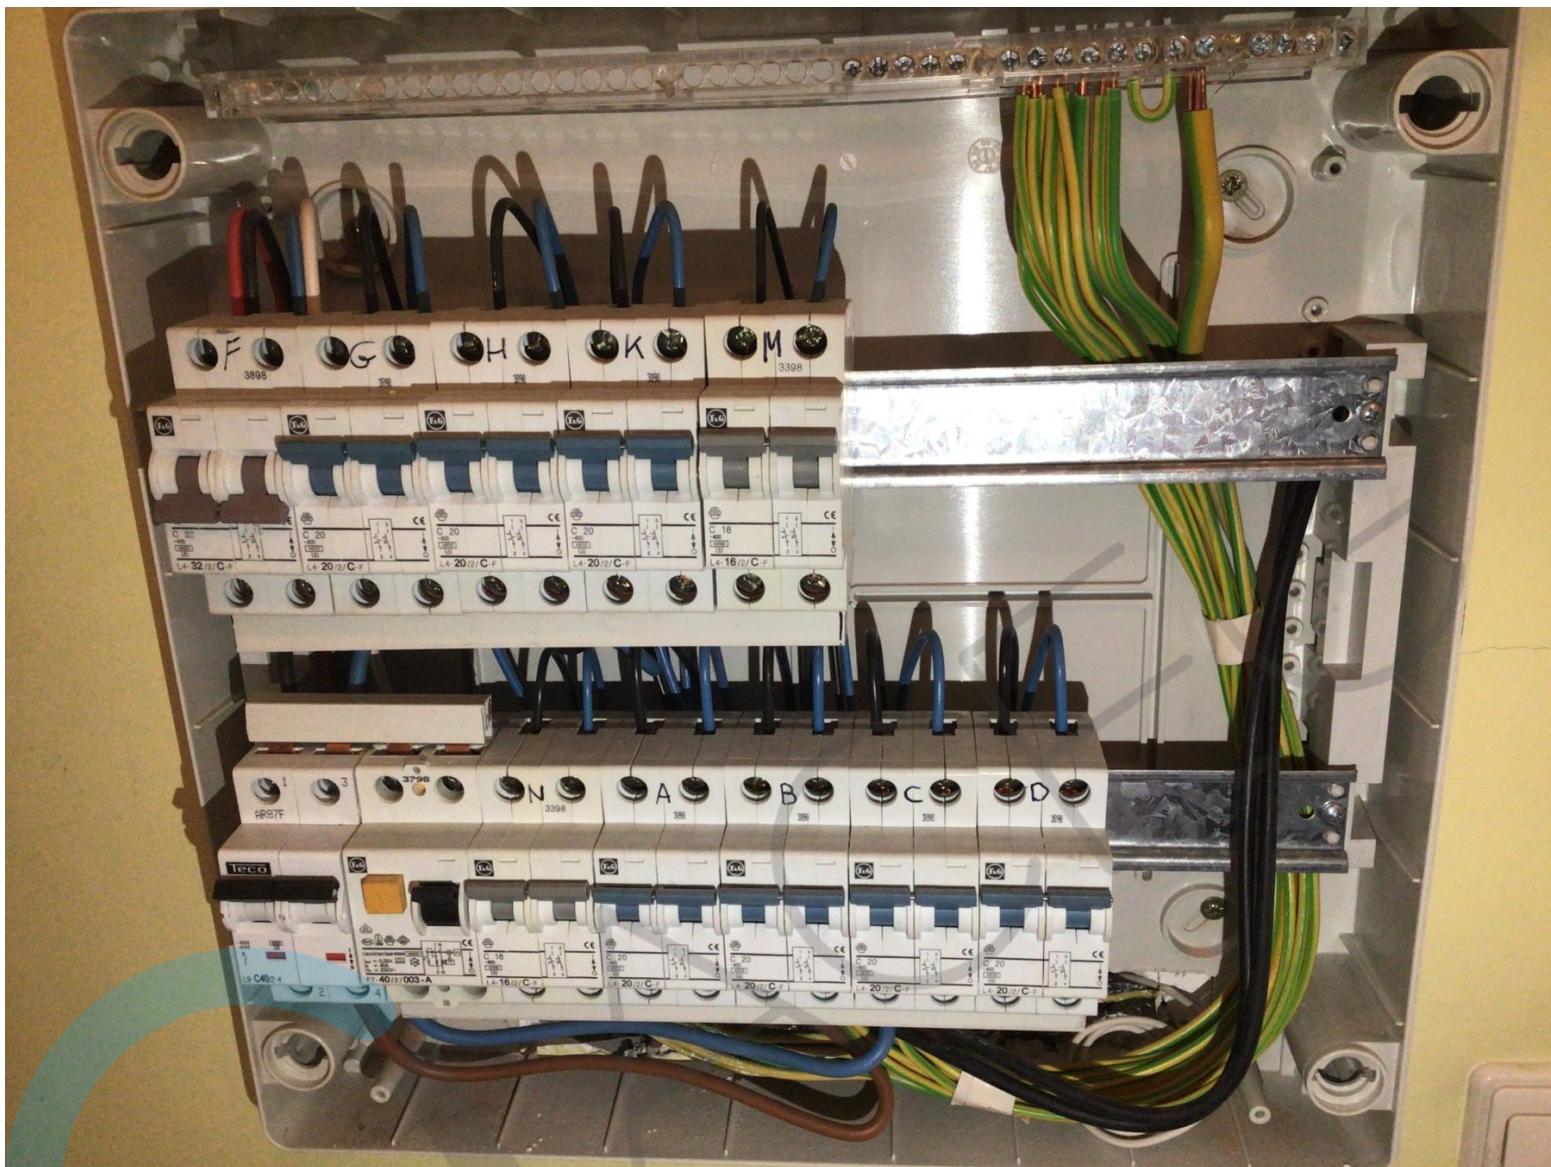



**J. VAN HEMELEN VZW.**  
KEURINGSORGANISME

104075

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5  
Tel. (02) 380 52 71  
Fax (02) 380 89 86

*Colpaert*  
*M. Neohof*

**CONFORMITEITSONDERZOEK  
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**  
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41  
Tel. (056) 35 76 76  
Fax (056) 35 68 87

Inrichtingen van : *A.M. J.B.B.*  
Plaats van onderzoek : *ROEYENSTRAAT ONDEKATAPPE*  
Installateur : *ELTO VERANNEVE HARELBELE*  
- B.T.W.-nummer :  
- of identiteitskaartnr. :  
Aard van de inrichting : *RESIDENTIEEL* op datum van :  
Agent-Onderzoeker : *DE G. VAN DER* Stroomleveraar : *De. f. g. h. j.*  
Datum van onderzoek : *01/03/11*

- Bedrijfsvoering : *beschrijving van de stroombanen:*
- Doorsnede voedingskabel : *beschrijving van de stroombanen:*
- Algemene bescherming : *beschrijving van de stroombanen:*
- Type algemene schakelaar : *beschrijving van de stroombanen:*
- Type aardelektrode(s) : *beschrijving van de stroombanen:*
- Aardspreidingsweerstand : *beschrijving van de stroombanen:*
- Algemene isoleringsweerstand : *beschrijving van de stroombanen:*
- Aantal borden en eindstroombanen : *beschrijving van de stroombanen:*
- Algemene differentieelschakelaar : *beschrijving van de stroombanen:*
- Bijkomende differentieelschakelaar(s) : *beschrijving van de stroombanen:*

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :


Vastgestelde inbreuken : *geen*

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften, de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendradsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.  
Volgend controleonderzoek uiterlijk op *01/03/11*

Agent-Onderzoeker,  
Vakje voorbehouden aan de distributeur :  
Klantnr. :  
Visa :  
datum :

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN  
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.  
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.



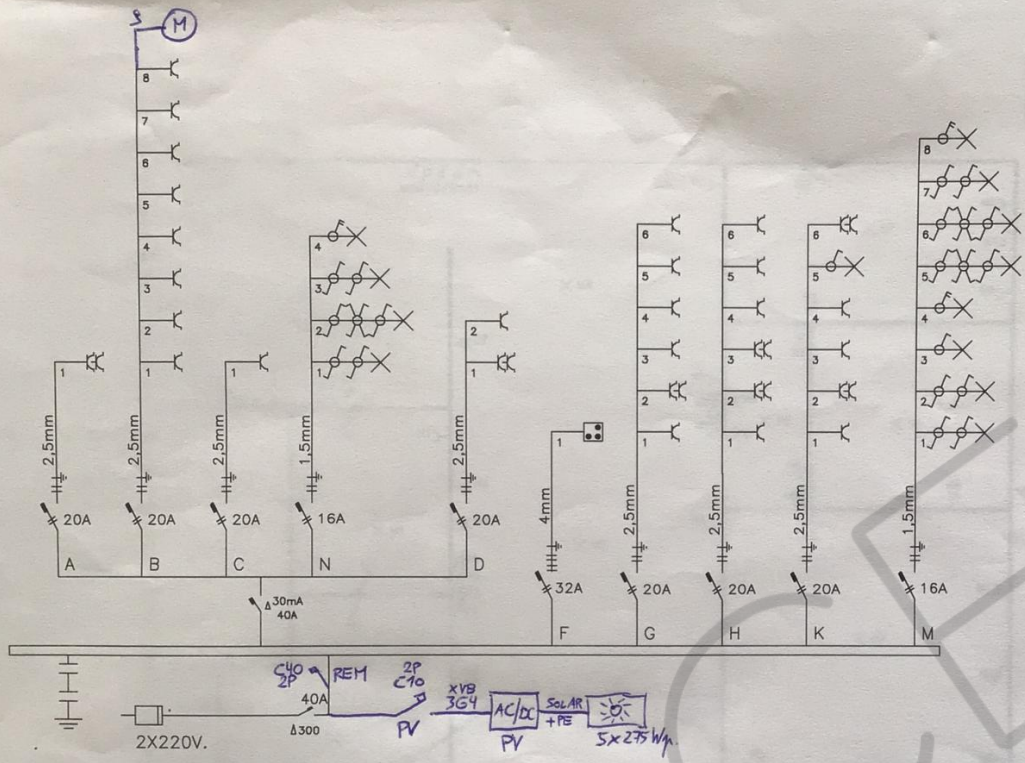


ACEG 81  
 Floris Kok  
 17/10/24

*[Handwritten signature]*

TYBO 7013922		DCN	
Afgev. erkend organisme	Tybo NV Groenstraat 67 Bus 2 1VD Oudenaarde	Verantw. uitvoering	<b>ELEKTRO                  VERSCHUERE</b> bvba Waregemsestraat 1 8530 Harelbeke TEL: 056/71.29.17 FAX: 056/71.26.12 BTW: BE 426.590.261
Handtekening	Handtekening	Handtekening	

TYBO\7019921

Tybo NV Groenstraat 67 Bus 2 1VD Oudenaarde	ELEKTRO VERSCUERE TEL: 056/71.29.17
---	---

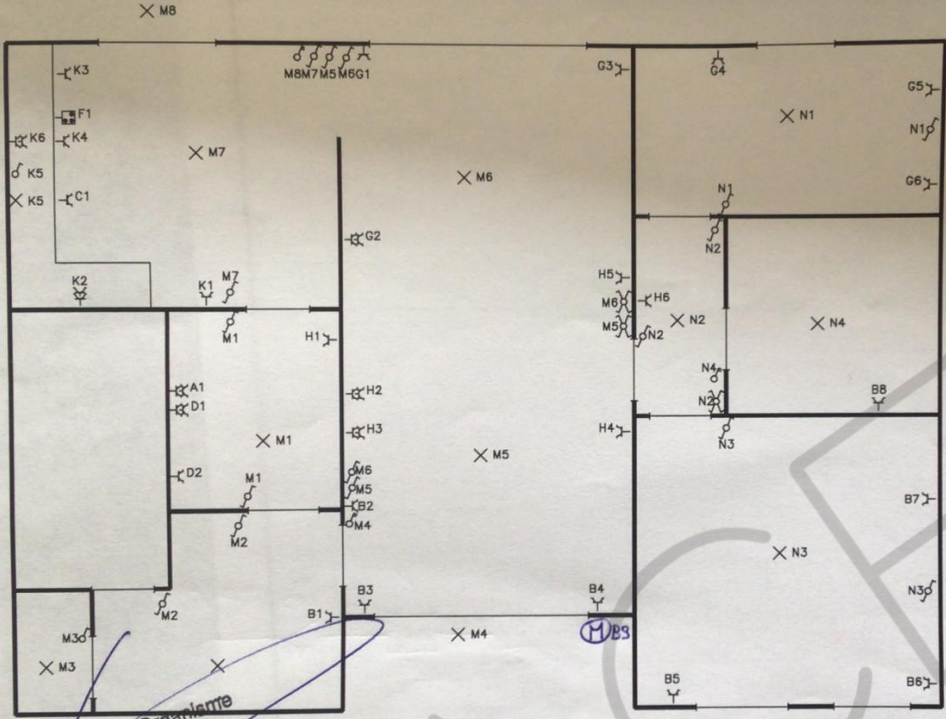

**ACEG** 81  
 Algemeen Verkeersreguleerder / Opleiding agent  
**Floris Kok**  
 17/10/24

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

19

Voor het Erkend Organisme  
 vzw J. Van Hemelen  
 DECONINCK JP.  
 Inspecteur.

*[Handwritten signature]*







