

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 103833
Cont.pers.: CALLEBAUT KEVIN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0485/19.59.62
e-mail: callebaut-kevin@telenet.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6407314
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/01/2025

Klant / Opdrachtgever:

CALLEBAUT KEVIN
KEIBERGSTRAAT 42
9572 SINT-MARTENS-LIERDE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE

INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: DE SPIEGELEER IVE Adres: MIDDENSTRAAT 7 ZANDBERGEN 9506
Installateur/verantw. werk: Naam: CALLEBAUT KEVIN Adres: KEIBERGSTRAAT 42 SINT-MARTENS-LIERDE 9572 B.T.W.: BE0.526.831.348
Adres installatie: DE SPIEGELEER IVE MIDDENSTRAAT 7 ZANDBERGEN 9506 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID: DE SPIEGELEER IVE
EAN nr.: 541448820063752357 Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: 1200172310 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☐ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☒ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : niet toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: niet toegepast

Datum: 17/01/2025 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2050

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: Wachtbuis: Isolatieplaat:
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: lus sectie: Pb+10 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA (2x)
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie: Callebaut Kevin
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ thuisbatterij
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☒ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 21

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 22 MOhm Spreidingsweerstand: 3,33 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Beschermt tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Beschermt tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hogervermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,



Jurgén Moens
0475/45.23.82
Jurgén.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

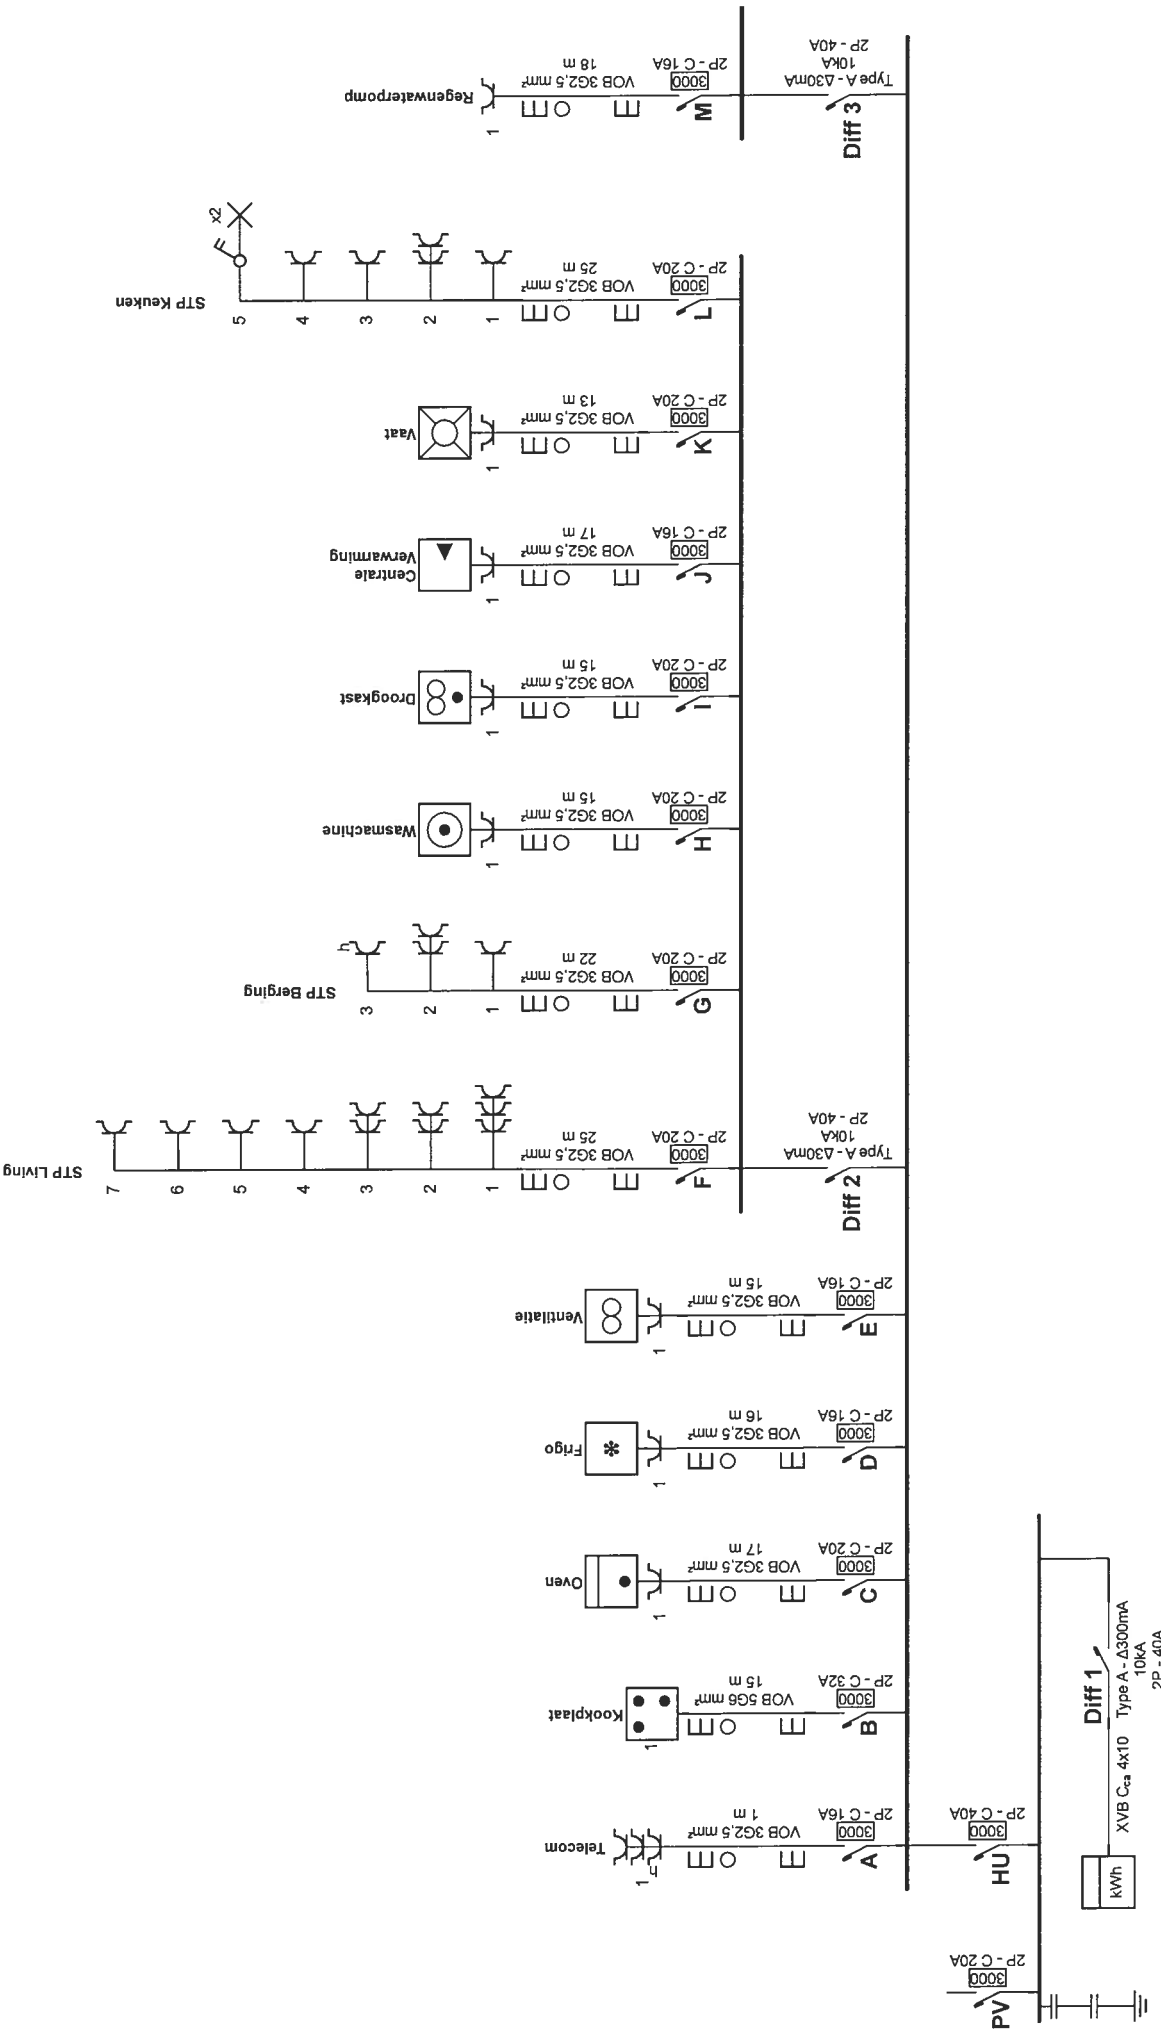


17/01/2025
Jurgen Moëns
OCB
jurgen.moëns@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie
Ive De Spiegeleer
Middenstraat 7
Zandbergen

Installateur
Elektrotechniek Callebaut
Keibergstraat 42
9572 Lierde
GSM: 0485 19 59 62
e-mail: callebaut-kevin@telenet.be
BTW BE 0526.831.348



p. 1/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

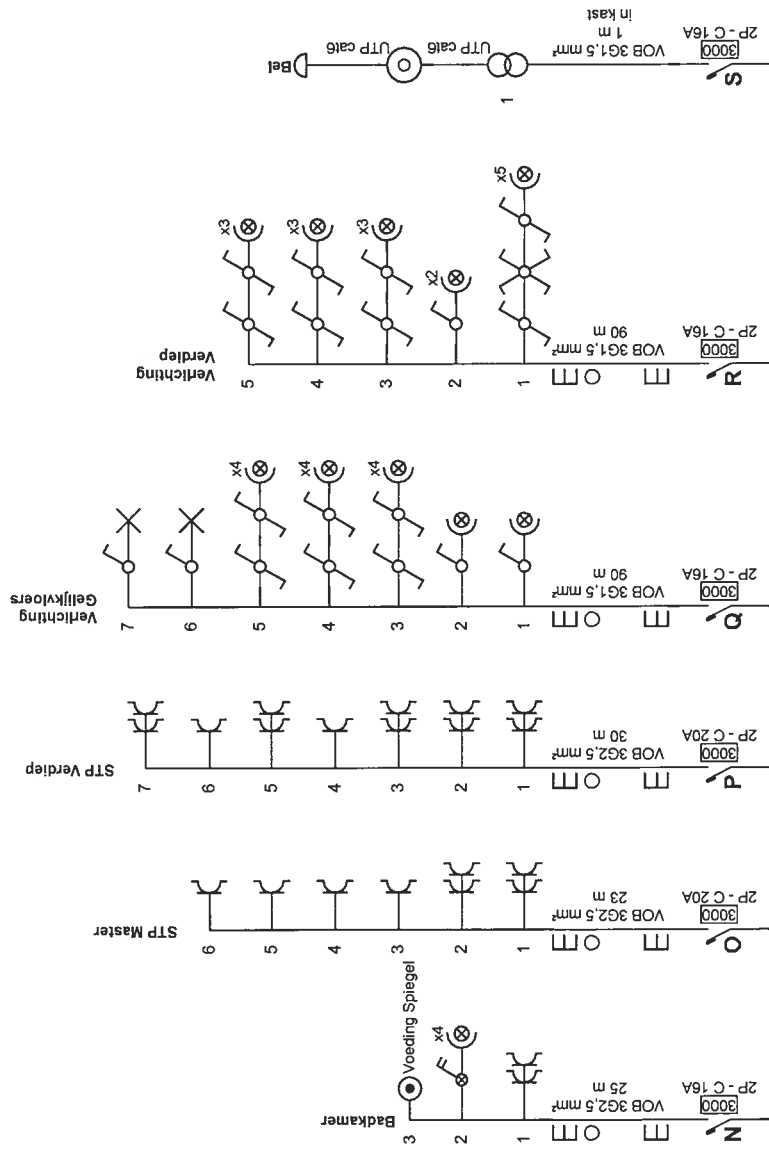

 **OCB**
17/01/2025
Jürgen Moens

jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82


Plaats van de elektrische installatie
Ive De Spiegeleer
Middenstraat 7
Zandbergen

Installateur
Elektrotechnik Callebaut
Keibergstraat 42
9572 Lierde
GSM: 0485 19 59 62
e-mail: callebaut-kevin@telenet.be
BTW BE 0526.831.348



p. 2/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Gelijkvloers

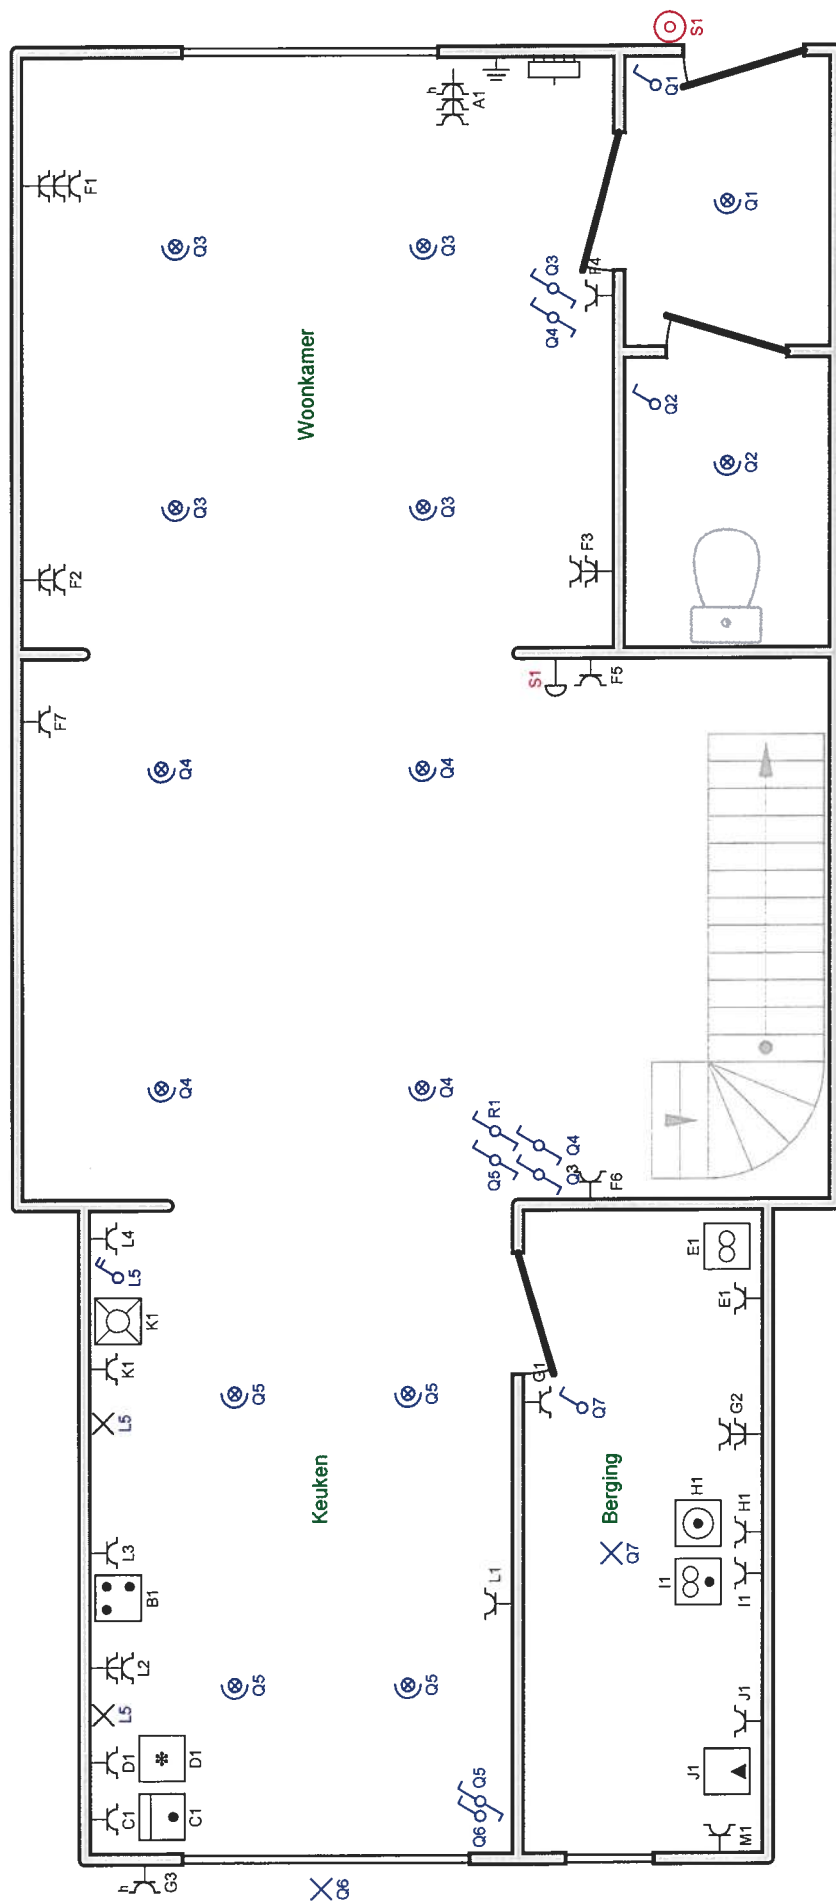



17/01/2025

Jurgen Moens

jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82


Plaats van de elektrische installatie
Ive De Spiegeleer
Middenstraat 7
Zandbergen

Installateur
Elektrotechniek Callebaut
Keibergstraat 42
9572 Lierde
GSM: 0485 19 59 62
e-mail: callebaut-kevin@telenet.be
BTW BE 0526.831.348



p. 3/5
Situatieplan
2 x 230V ~ 50Hz

1e Verdieping

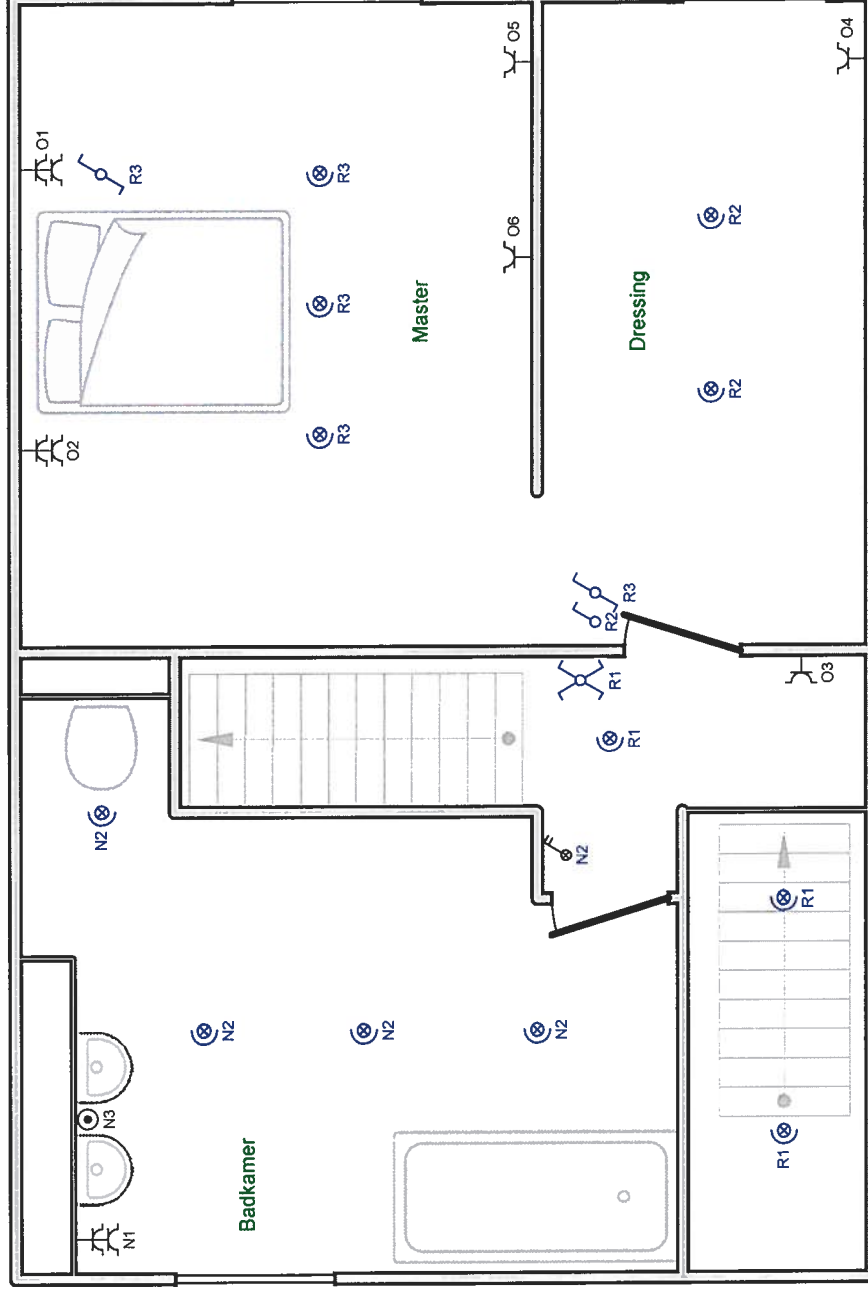

Plaats van de elektrische installatie
Ive De Spiegeleer
Middenstraat 7
Zandbergen


Installateur
Elektrotechniek Callebaut
Keibergstraat 42
9572 Lierde
GSM: 0485 19 59 62
e-mail: callebaut-kevin@telenet.be
BTW BE 0526.831.348

p. 4/5
Situatieplan
2 x 230V ~ 50Hz



17/01/2025
Jürgen Moëns
jürgen.moëns@ocb.be 0475/45.23.82

2e Verdieping

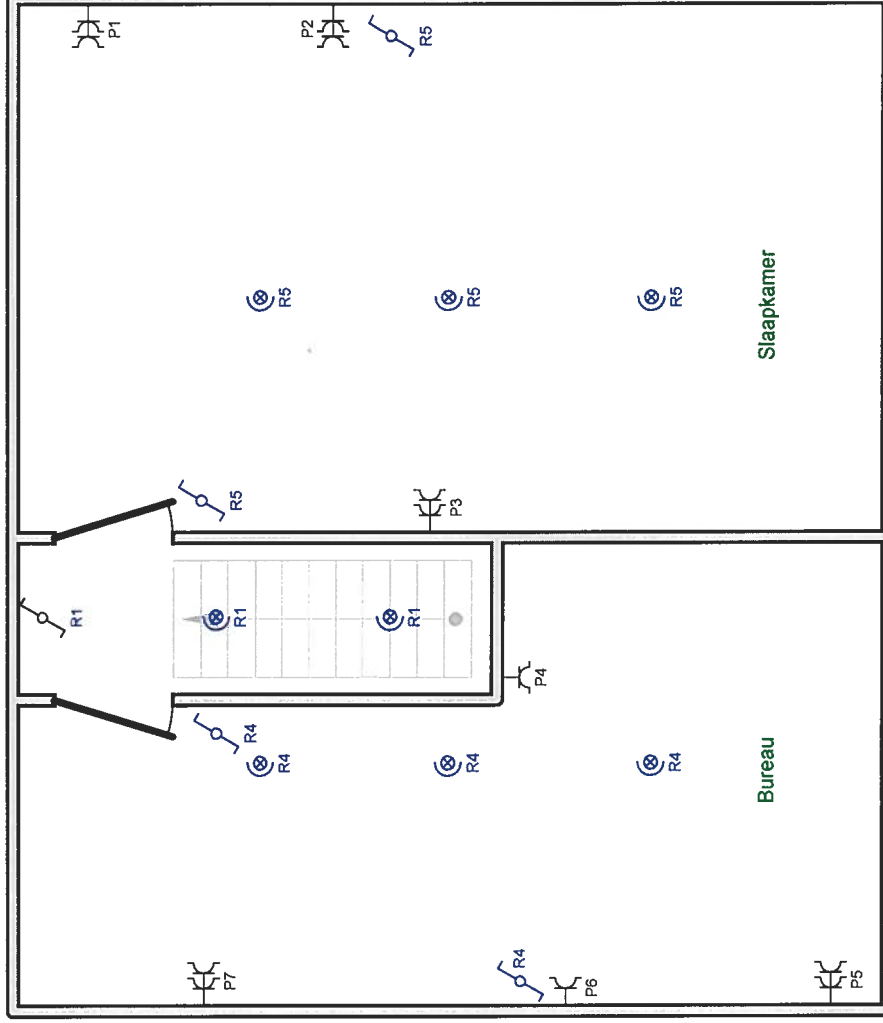


17/01/2025
Jurgen Moens
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie
 Ive De Spiegeleer
 Middenstraat 7
 Zandbergen

Installateur
 Elektrotechniek Callebaut
 Keibergstraat 42
 9572 Lierde
 GSM: 0485 19 59 62
 e-mail: callebaut-kevin@telenet.be
 BTW BE 0526.831.348



p. 5/5
 Situatieplan
 2 x 230V ~ 50Hz
