

# Rapport van ultrasonische inspectie

Dichtheidscontrole van een tank en bijhorende leidingen

- Periodieke reglementaire controle
- Reglementaire controle bij eerste ingebruikname
- Interventie op bestaande installatie

VDM Systems  
Fijnestraat 2  
1741 Wambeek



Erkenningsnr. SV02639

## Site

Naam **Tondeur Andre**  
Adres Poverstraat 96  
1701 Itterbek

## Reservoir

Identificatie \_\_\_\_\_  
Totale capaciteit **5000 m<sup>3</sup>**  
Constructiedatum \_\_\_\_\_  
Constructeur \_\_\_\_\_  
Type  metaal  
Wandtype  enkel


## Compartment

Identificatie \_\_\_\_\_  
Capaciteit \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>  
Opgeslagen product \_\_\_\_\_  
 ondergronds  
 dubbel  
 kelder


## Leidingen

Type	Materiaal	Wandtype	#	E85	Lekvrij
Primaire aanzuigleiding				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Secundaire aanzuigleiding				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Testresultaten

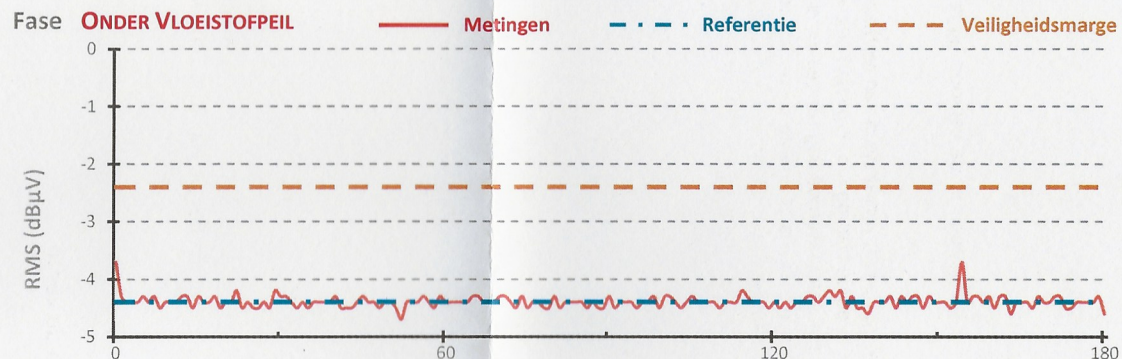

SDT270 **273200006** Sensor **114190038** Ref. genomen op **2022-01-31 13:00** Gemeten op **2022-01-31 13:01**

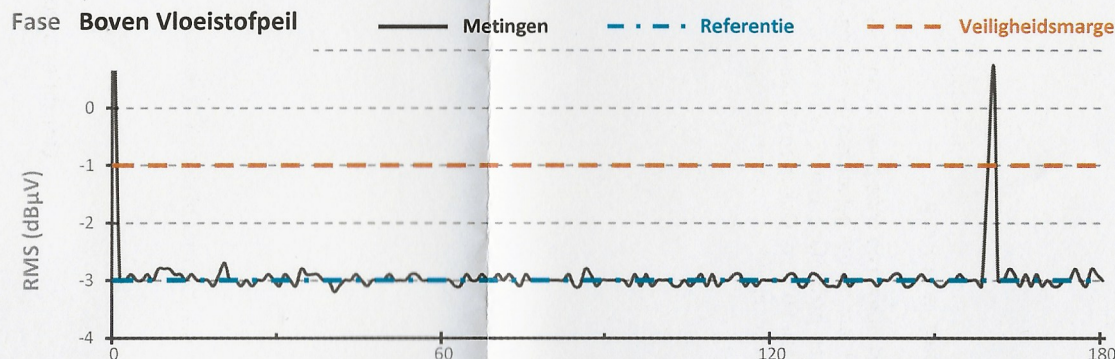

SDT270 **273200006** Sensor **14190038** Ref. genomen op **2022-01-31 13:01** Gemeten op **2022-01-31 13:05**

## Conclusie

- Alle metingen < 2dB dan referentiewaarde
- Geen enkele indicatie van lekkage
- Geen vacuümverval tijdens de test
- Vloeistofniveau ongewijzigd

## Opmerkingen

Groen label.

## Operator

Wim Van der Mauten

## Handtekening
