

A"S"C.

AUTONOME SECURITY CONTROLE

Erkend keuringsorganisme



KEURINGSVERSLAG

Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie

Ref : AREI 270	Werkinstructie	006	A"S"C. Procedure	23 - 42
Datum onderzoek :	08-12-2017	Geldig tot	08-12-2042 (*)	ID-nr
Adres installatie	Sint-Jacobsplein 21 bus 0405, 3000 Leuven			
Eigenaar / DNG				
Installateur	BVT Electrotechnieken V.O.F., Onze-Lieve-Vrouwplein 85, B 3020 Herent	BTW nr	BE0544.843.132	
DNB	Eandis	EAN referentie		
Teiler Nr	5246452	Index dag	Index nacht	
Meettoestel	Fluke 1654B	IDMT nr	0115	

(*) De geldigheid van dit keuringsverslag vervalt na een belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding v.d. elektrische installatie (AREI Art 270). De eigenaar, beheerder of huurder is desgevallend verplicht een nieuwe controle van de installatie uit te laten voeren.

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode
3x230	8	> 21	Pennen
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v.d. bescherming v.d. aansluiting	Voedingskabel type en ϕ	Borden
---	Zie ALSB	3g6 xvb	Eind - stroombanen
			1 3

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen	Voor ☒	Na ☐	01/10/1981	Installatie	Voor ☐	Na ☒	01/10/1981
Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) - Art. 270 – art. 86 Voorschriften van de DNB							
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Appartement 4^e verd. links: Zie bijgevoegd ééndraadsschema en situatieplan							
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.							
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden							
3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN	Geen.							


4.- BESLUIT

- 1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.).
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, uiterlijk op 08-12-2042 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling
- Het (de) ééndraadsschema (s) werd (en) geïnciseerd.

Inspecteur Code
Erwin Cockx EC


Vr de Technisch Directeur

Autonome Security Controle VZW		IBAN : BE32 7512 0493 7802		BTW nr : BE0826 131 776	
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111,	B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700	Fax : 011/582961	Mail : assaut@alacnet.be
Secretariaat	Singellaan 16 A,	B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830		Mail : bureau@sec-autonome.be
A"S"C. - Document	«Document	Revisie : 03			01 / 01 / 2016
	referentie»				





xVB 3G6

- 1: VOCHTIGE DIFF
- 2: KOOKFORNUIS
- 3: BEOK + STOPK STUDIO
- 4: VERL STUDIO + STOPK FRIGO + WERKVLAK

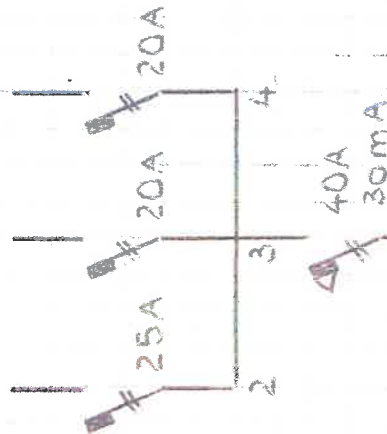

xVB 3G6

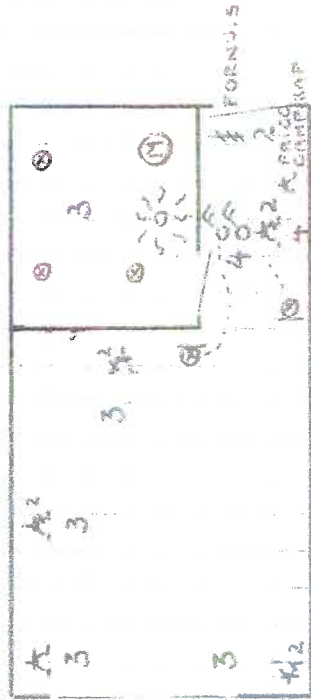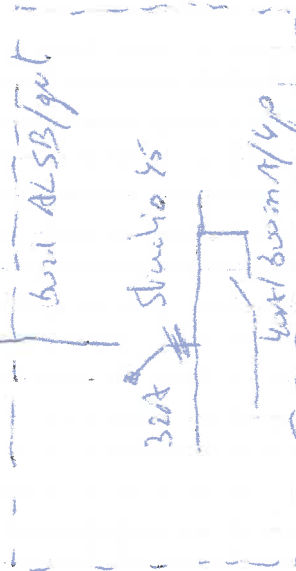

FAM VERBEEREN

SINT-JACOBSPLEIN 21 / 0405

3000 LÉUVEN

W. JACOBX
E. JACOBX
(BRUXELLES)

12/09/18

BVT ELECTROTECHNIKEN
ONZE-LIEVE-VROUWPLEIN 85
3020 HERENT
0477/557827
BE0544.843.132 7/12/17
