


# PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

## ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 36/2020/59744/01:1

**DATUM VAN CONTROLE** 22/05/2020 **AGENT** Angelo Gallo  
**ADRES VAN CONTROLE** Sint-Janskerhof 5 (verdieping Gelijkvloer) - 2800 mechelen **TYPE CONTROLE** Periodieke keuring (Art. 271)

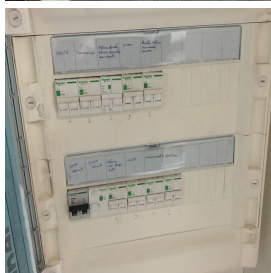

### > ALGEMENE GEGEVENS

**Adres van de installatie** Sint-Janskerhof 5 (verdieping Gelijkvloer) - 2800 mechelen  
**Type van lokalen** Wooneenheid (appartement)  
**Andere**  
**Verantwoordelijke voor de werken** Jens bvba  
**Afwijking van toepassing/toegepast** Art. 271bis

### > GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

**Distributienetbeheerder (DNB)** IVERLEK  
**EAN code** niet gecommuniceerd  
**Nummer teller** 31530839  
**Meterstand dag/nacht** 12054/  
**Type verbinding** ondergronds  
**Voedingskabel hoofdbord** XVB 4 x 10 mm²  
**Nominale spanning** 230V - AC  
**Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting)** 40A

### > CONTROLE

**Conformiteit eendraadschema's en situatieschema's** OK | **Aantal verdeelborden** 2 | **Aantal stroombanen** 4+9

Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan

|                                              |                |                                                 |                                     |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| De funderingen dateren van                   | Vóór 1/10/1981 | Hoofd differentieelstroominrichting             | ID - 40A - 300mA - type A - test OK |
| Aarding                                      | Staven         | Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes  | ID - 40A - 30mA - type A - test OK  |
| Aardingsweerstand ( $\Omega$ )               | 10,05          | Aansluiting                                     | OK                                  |
| Gelijkvormigheid v/d equipotentiaal en de PE | OK             | Visuele inspectie v/ vaste &/ mobiele apparaten | OK                                  |
| Aardingscontinuïteit                         | Besluitende    | Verlichting/toestellen                          | OK                                  |
| Foutlus controle                             | Afdoende       | Bescherming tegen rechtstreekse aanraking       | OK                                  |
| Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking  | OK             | Minimum gemeten isolatieweerstand ( $M\Omega$ ) | 73,5                                |

## BESLUIT : CONFORM

Op de datum 22/05/2020, elektrische installatie Sint-Janskerhof 5 (verdieping Gelijkvloer) - 2800 mechelen is conform bij het algemene reglement op Elektrische installaties.

De controle uitgevoerd door **Certinergie** is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

Een verlodging stroomopwaarts en stroomafwaarts de differentieelstroominrichting werd geplaatst zodat de klemmen onbereikbaar zijn.

Eén of meerdere eendraadschema's / situatieschema's zijn gecontroleerd geweest en zijn conform met de installatie.

Zonder belangrijke wijzigingen van de elektrische installatie moet de volgende controle voor 22/05/2045 gebeuren.

### Handtekening agent

*Angelo*

## PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 36/2020/59744/01:1

### › Plichten van de Eigenaar, Beheerder of Huurder van Huishoudelijke Installaties :

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan de elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie, te voorzien dat de installatie te allen tijde conform blijft, een nieuwe controleonderzoek te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuken of een deel ervan standhouden moet het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag versturen naar de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

Samengevat, welke acties dienen er genomen te worden indien de elektrische installatie conform is?

| 1                                    | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                 | 4                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lees nadrukkelijk dit proces-verbaal | In het geval van uitbreidingen, belangrijke veranderingen aan de installatie, laat de installatie opnieuw controleren | Als het geldigheidstermijn van het rapport is verstreken, laat de installatie opnieuw controleren | Certinergie is tot uw dienst<br>0800 82 171 |


## PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR


REF. 36/2020/59744/01:1

### BIJLAGEN

Eendraadschema('s) van de installatie

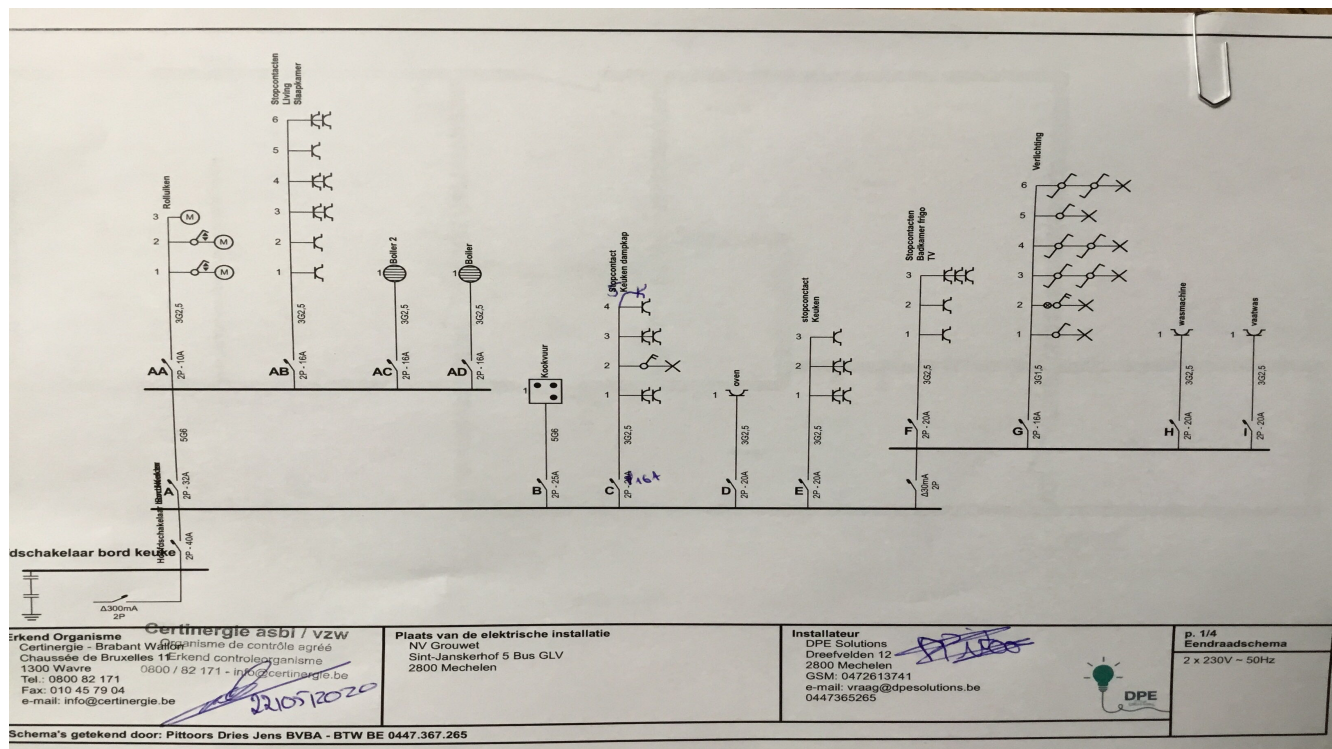

### Situatieschema van de installatie

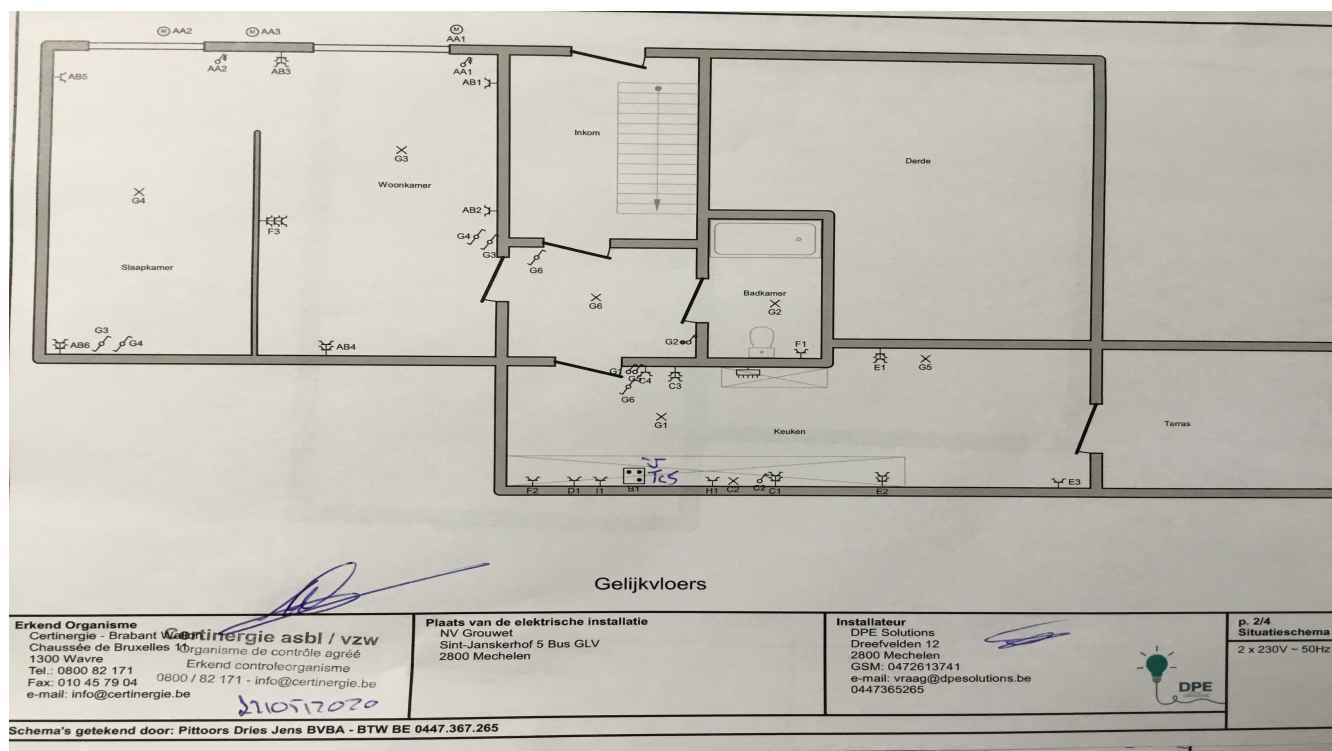

# PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 36/2020/59744/01:1

## BIJLAGEN

Situatieschema van de installatie

