



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 29/02/2024

Inspecteur: Jeffrey De Bisschop

Mentor:

Installateur: Luvicus BV

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 0798 675 135

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23120794

Datum verslag: 29/02/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Benedenstraat
Huisnummer: 67
Busnummer:
Postcode: 9520
Gemeente: Sint-Lievens-Houtem
Land: België

Eigenaar

Naam: Pieter De Wachter
Straatnaam: Benedenstraat
Huisnummer: 67
Busnummer:
Postcode: 9520
Gemeente: Sint-Lievens-Houtem
Land: België

Installateur

Naam: Luvicus BV
BTW nr.: BE 0798 675 135
Telefoonnummer: +32 498 76 78 69
E-mail: info@luvicus.be

Type : woning

EAN : 541448820048605432

Teller Nr.: : 1SAG3105170660

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor
01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 24


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0,94 MΩ

RE: 4,35 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	24	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	20		4	6
1	C	16	Reserve	2	-
3	C	16		2	1,5
2	C	16		2	2,5
17	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- nota/note 4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
- nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 1/3/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 8

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jeffrey De Bisschop

Handwritten signature of Jeffrey De Bisschop

Jeffrey De Bisschop
ACEG VZW - #322

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 1/3/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



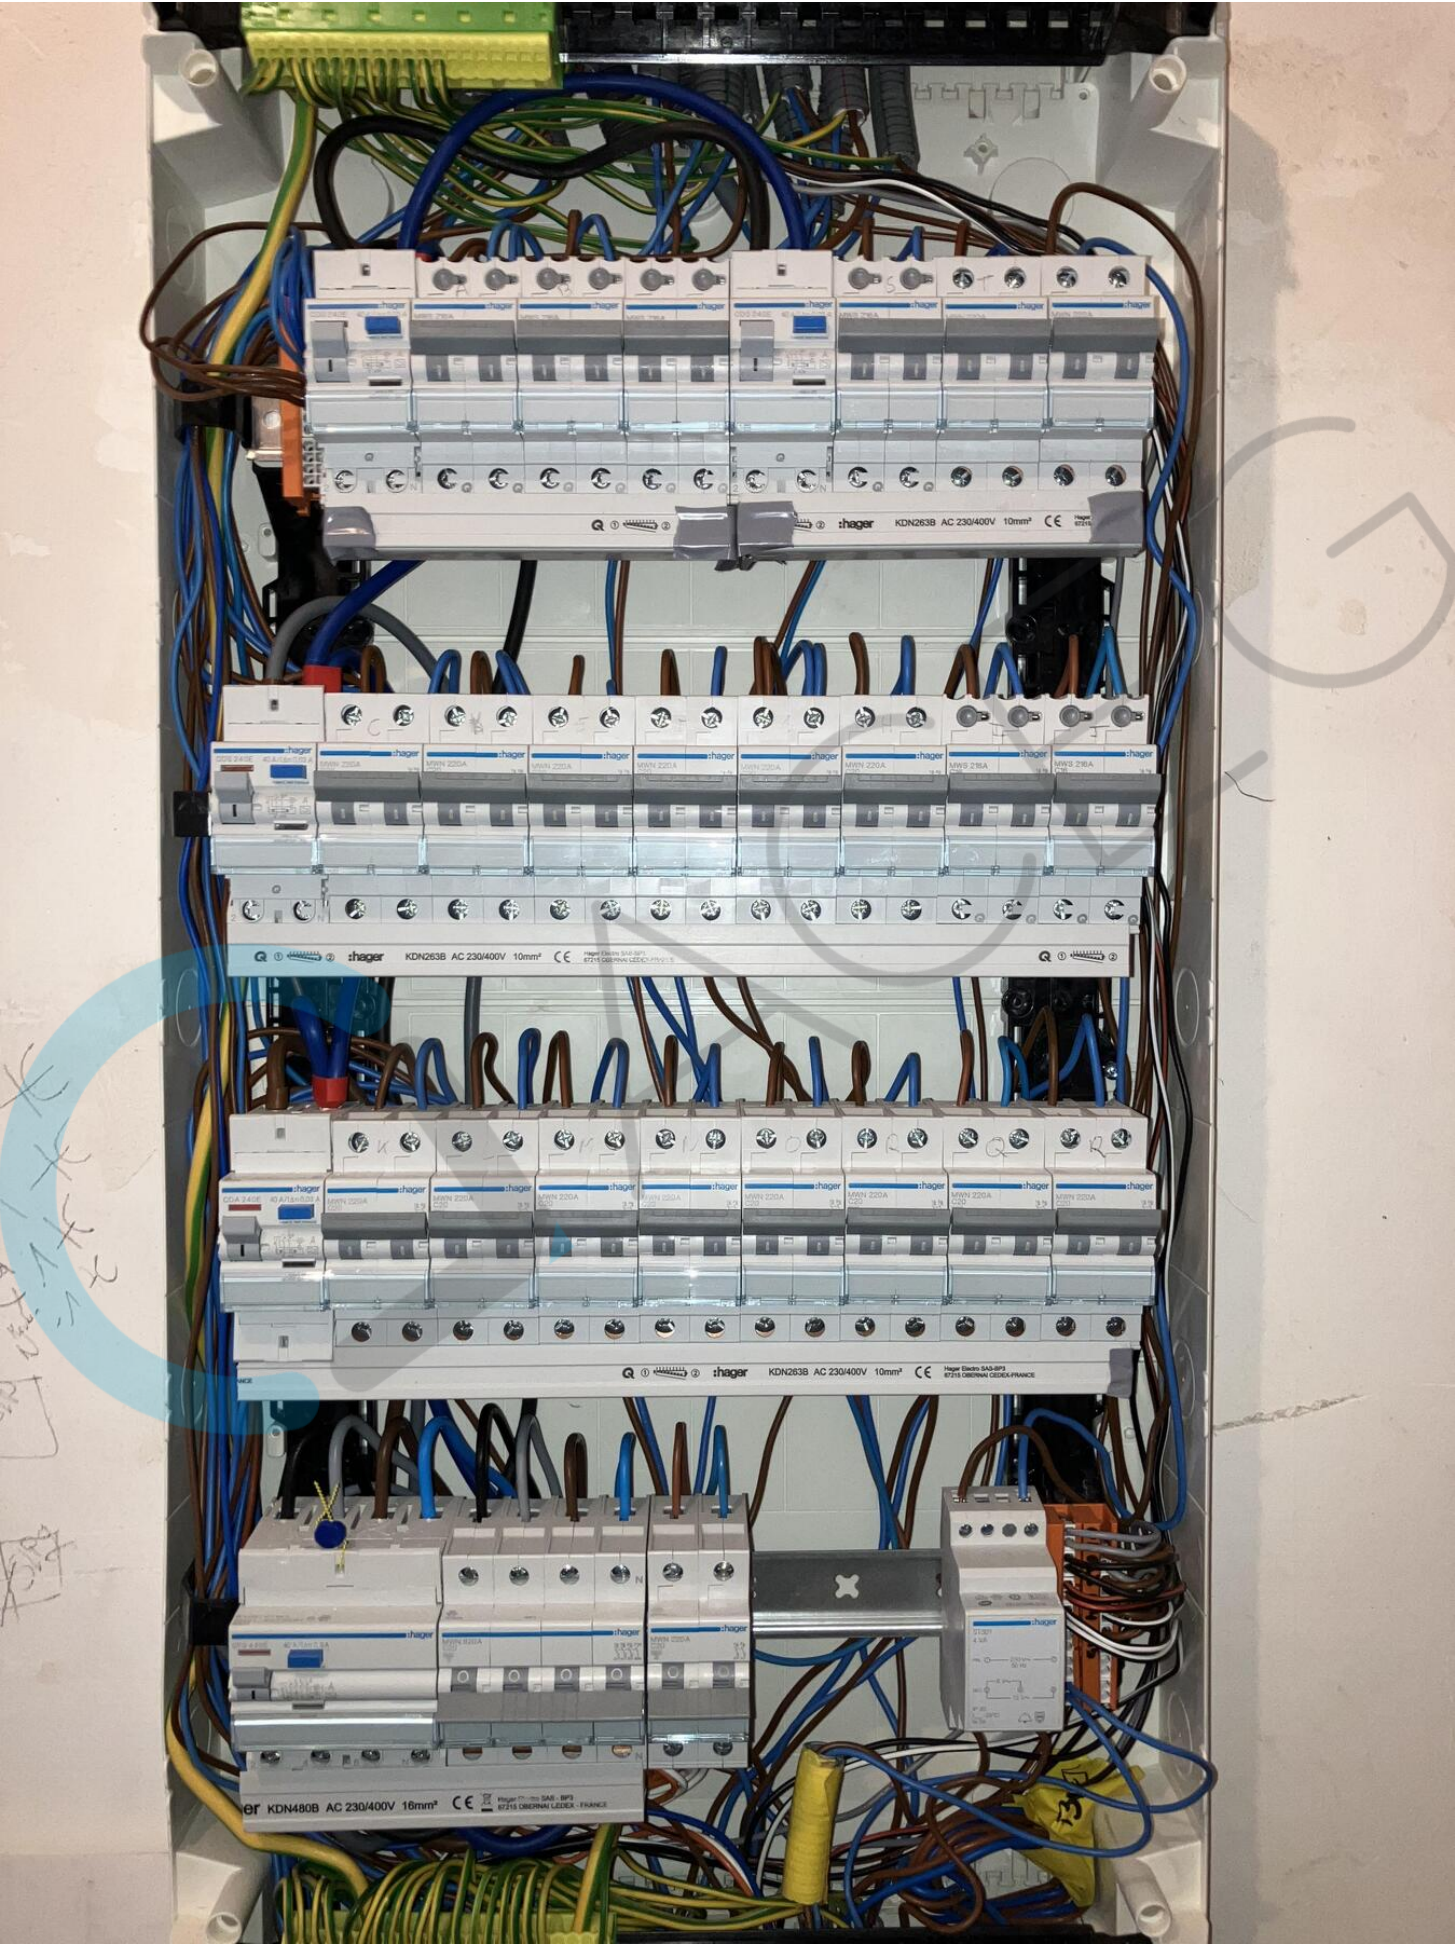







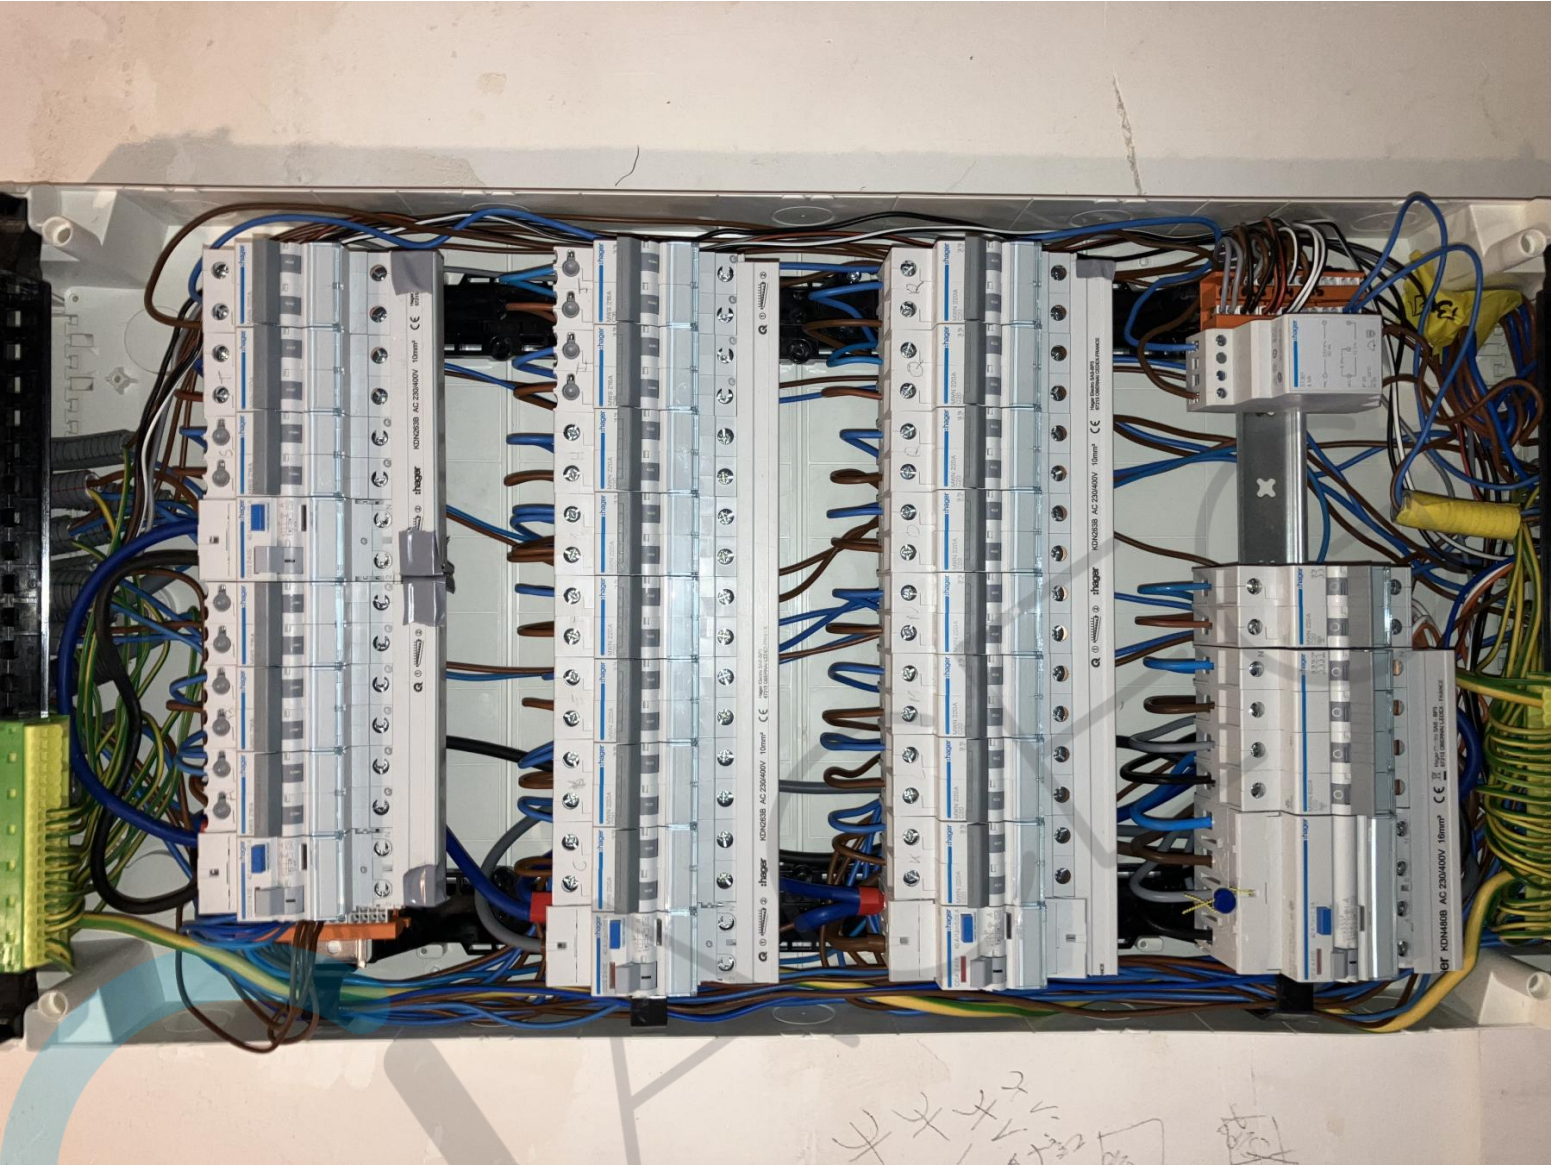



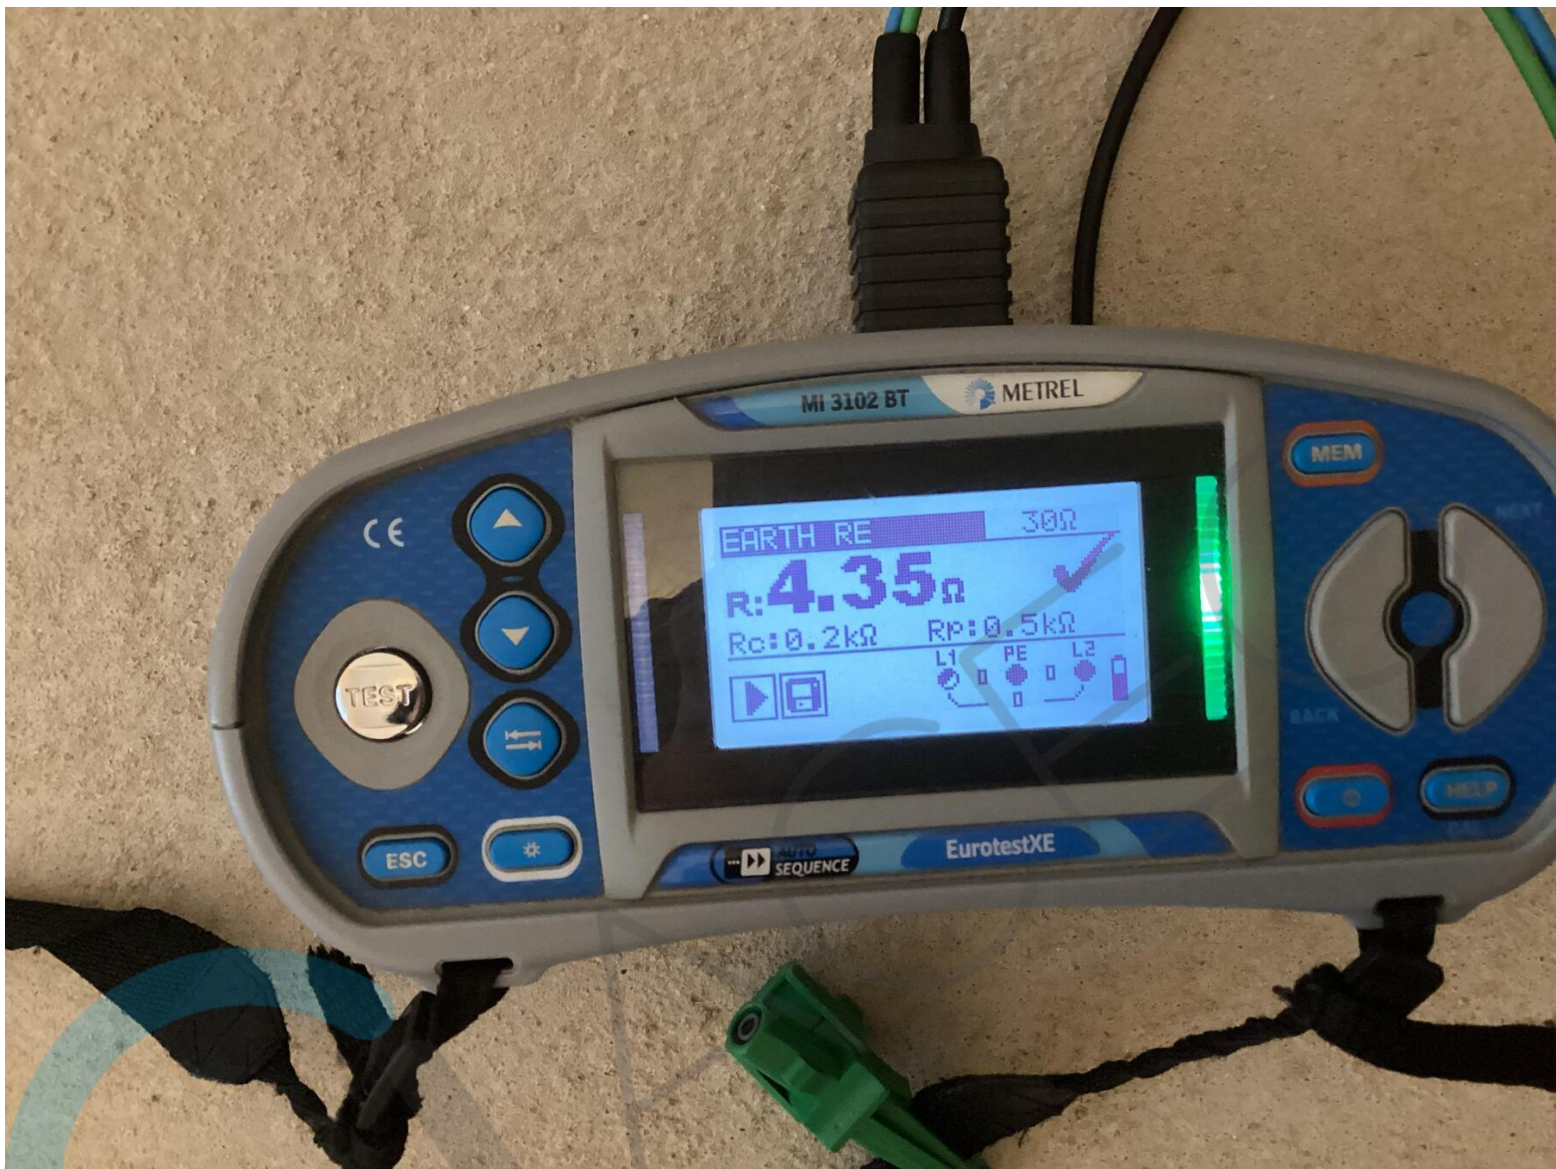



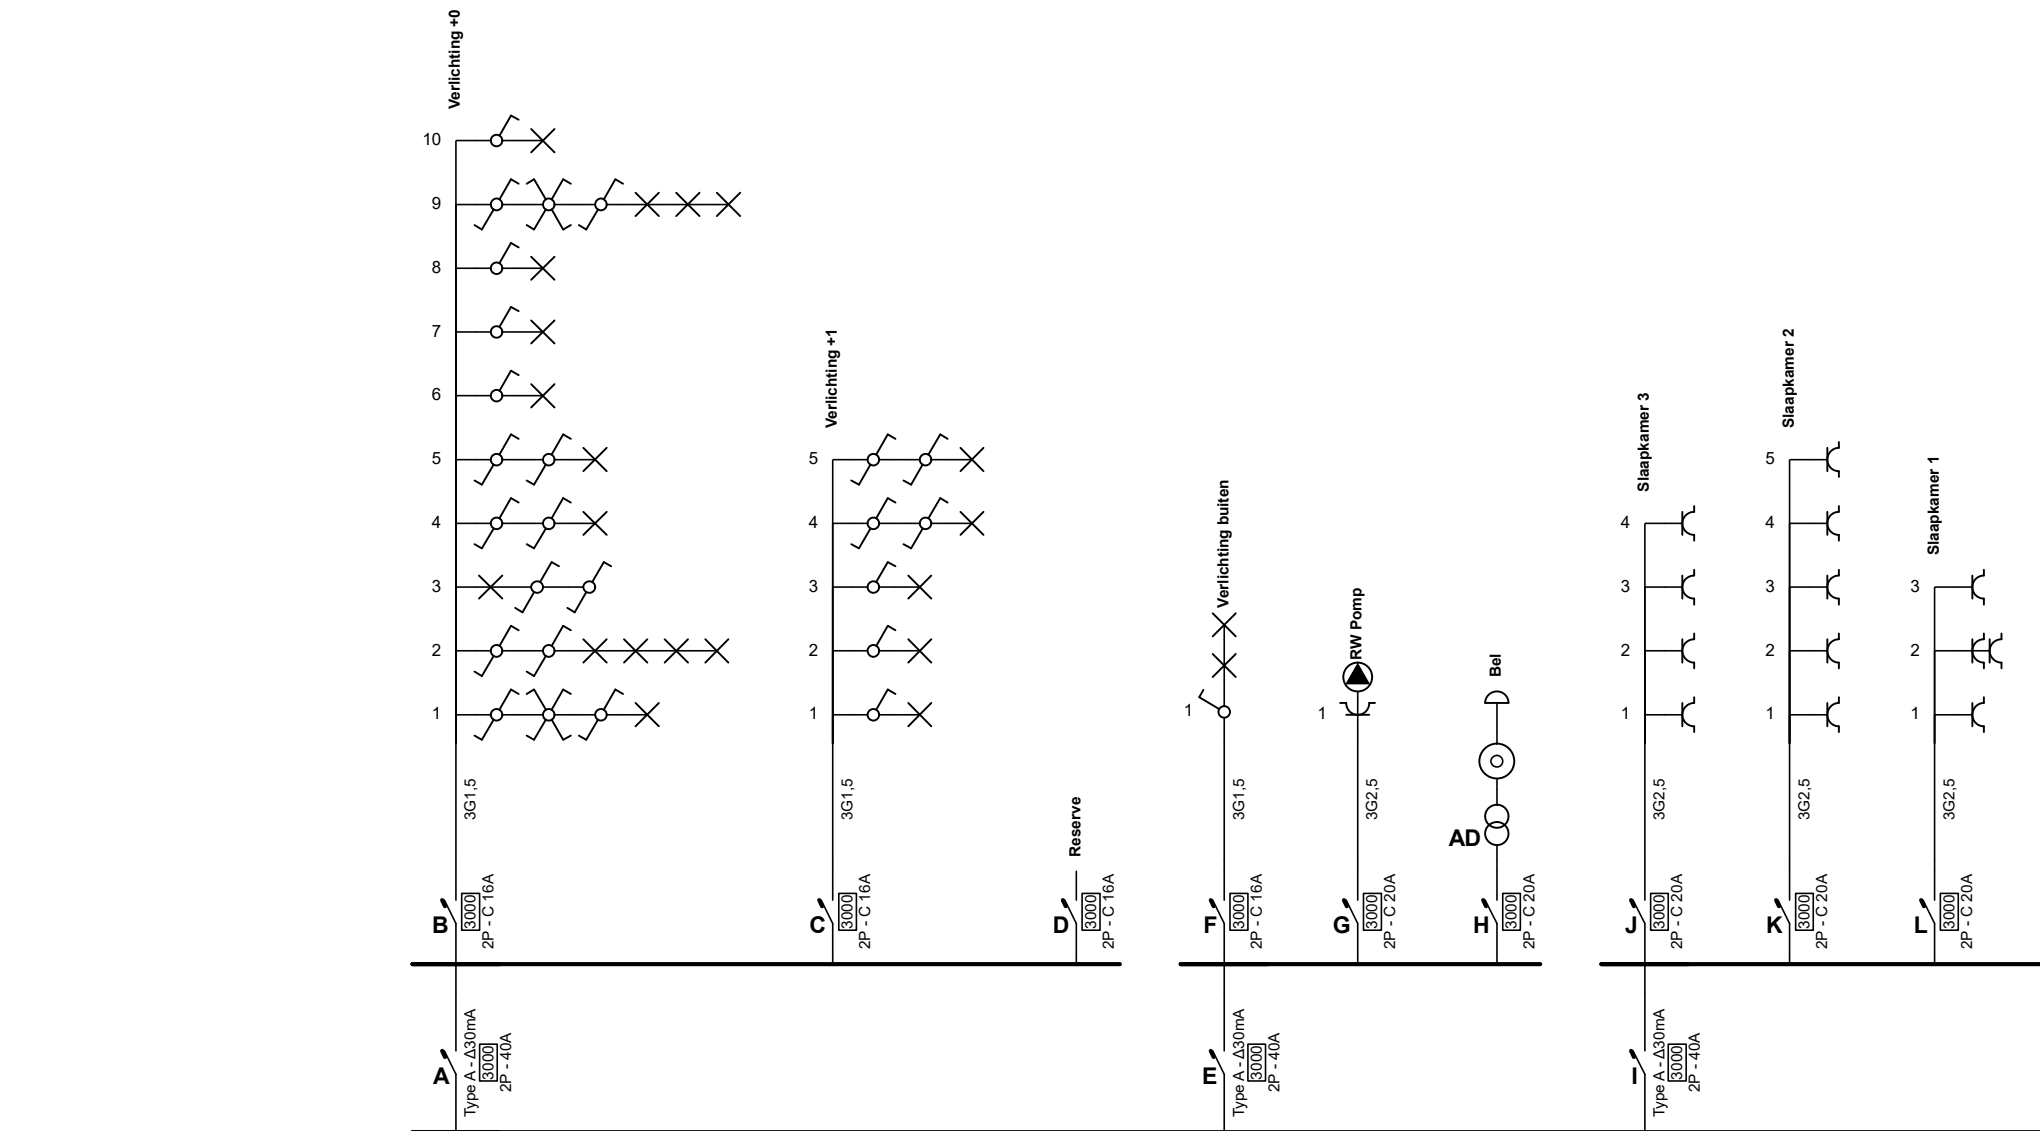

EXVB 4x10
10000
4P - 40A
kWh
Type A - Δ30mA
3000
4P - 40A

ACEG
Jeffrey de Bisschop

322

29/02/2024

Plaats van de elektrische installatie
DE WACHTER Pieter
BENEDENSTRAAT
SINT LIEVENS HOUTEM


Installateur
Luvicus
Buisstraat 10
9200 Dendermonde
GSM: +32 498 76 78 69
e-mail: info@luvicus.be
BTW BE 0746.893.565

p. 1/6
Eendraadschema

Datum: 27/11/2023

3 x 230V ~ 50Hz

V.2024-02-29 10:32:03

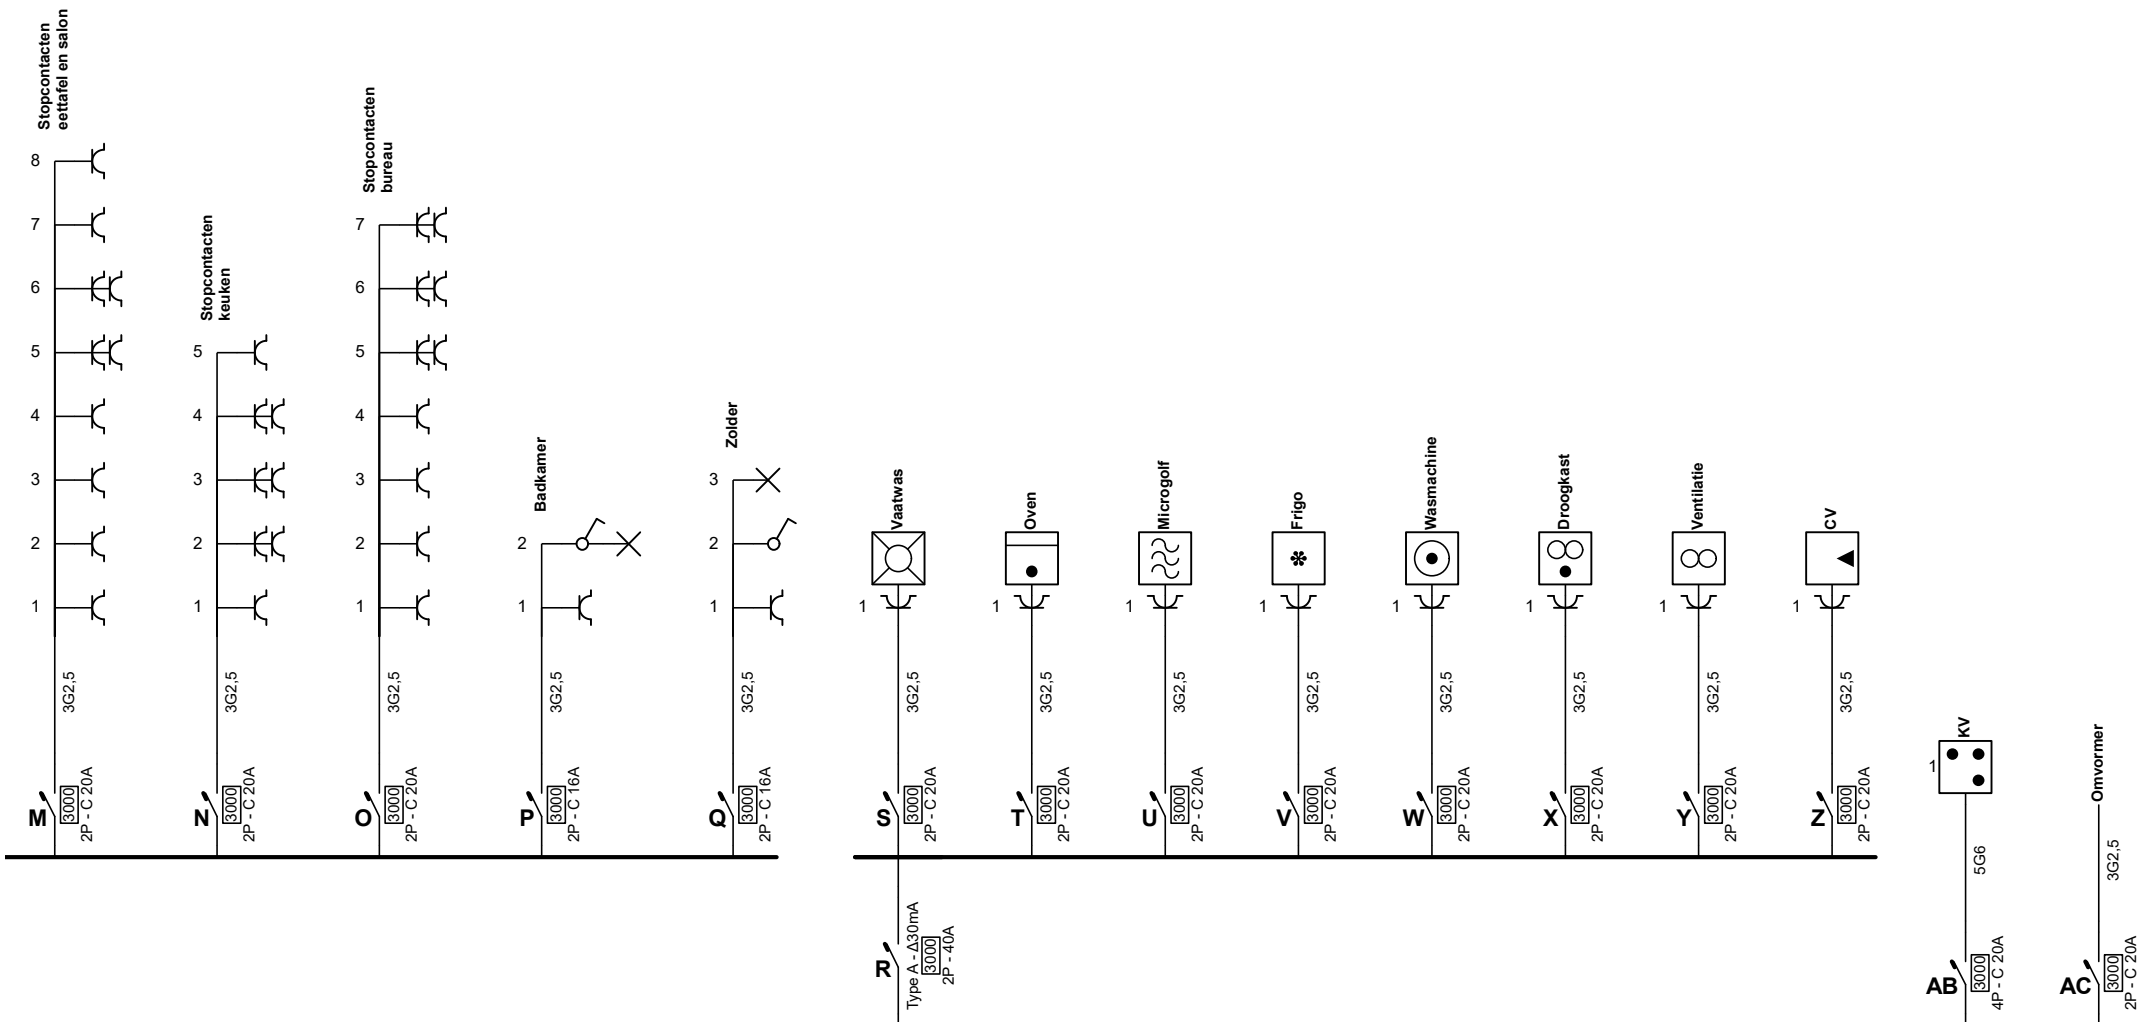


ACEG 322
Jeffrey de Bisschop

29/02/2024

Plaats van de elektrische installatie
DE WACHTER Pieter
BENEDENSTRAAT
SINT LIEVENS HOUTEM

Installateur
Luvicus
Buisstraat 10
9200 Dendermonde
GSM: +32 498 76 78 69
e-mail: info@luvicus.be
BTW BE 0746.893.565

p. 2/6
Eendraadschema
Datum: 27/11/2023
3 x 230V ~ 50Hz
V.2024-02-29 10:32:03

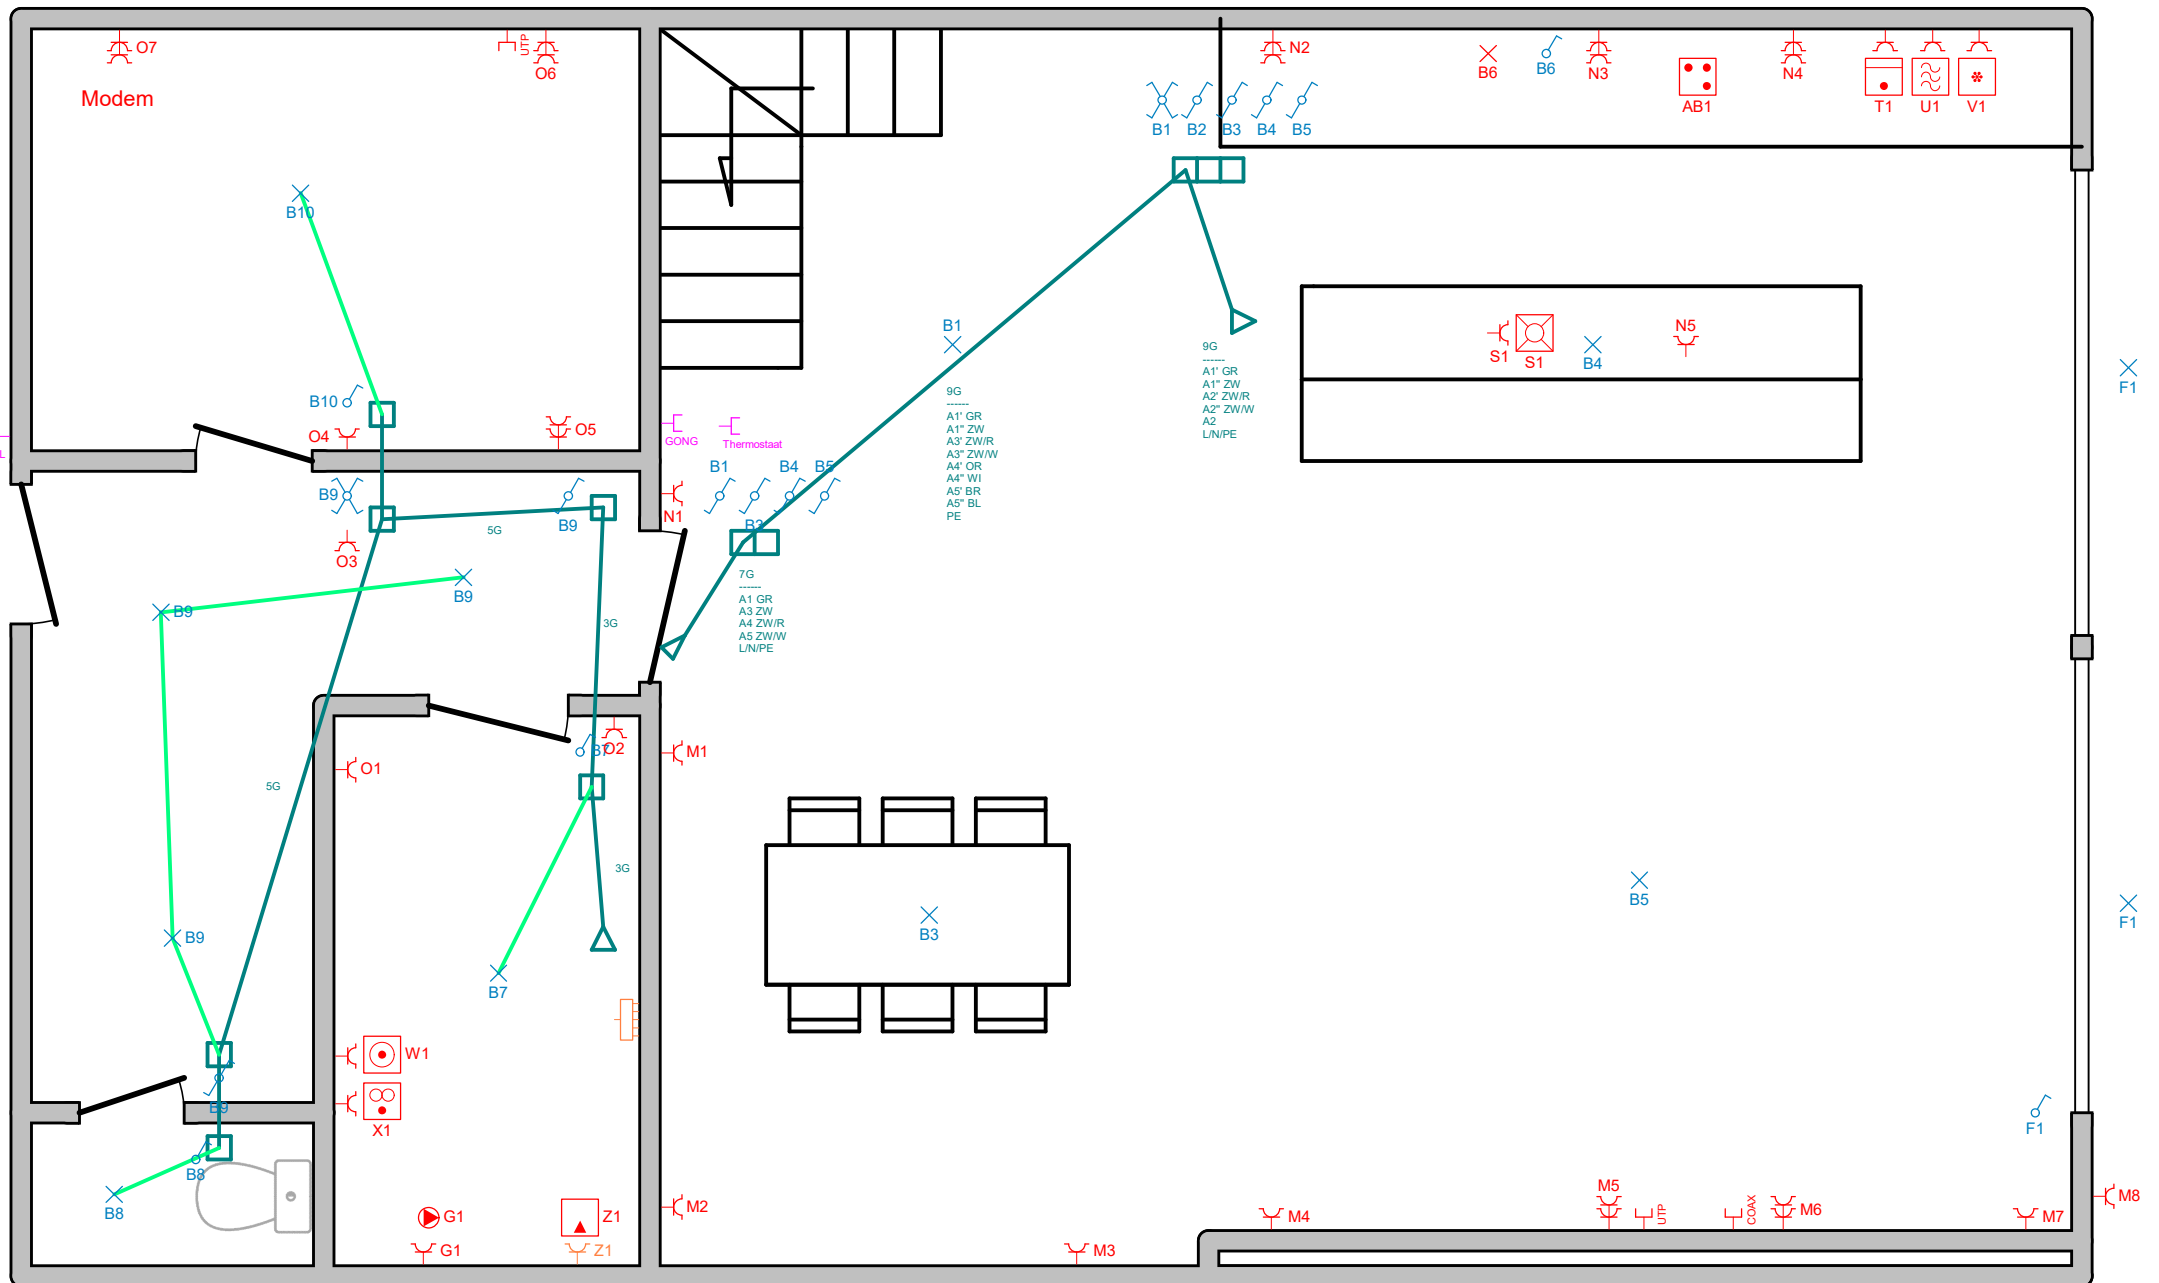


Plaats van de elektrische installatie
 DE WACHTER Pieter
 BENEDENSTRAAT
 SINT LIEVENS HOUTEM

Installateur
 Luvicus
 Buisstraat 10
 9200 Dendermonde
 GSM: +32 498 76 78 69
 e-mail: info@luvicus.be
 BTW BE 0746.893.565

p. 3/6
Situatieschema
 Datum: 27/11/2023
 3 x 230V ~ 50Hz
 V.2024-02-29 10:32:03

ACEG
 322
Jeffrey de Bisschop

29/02/2024

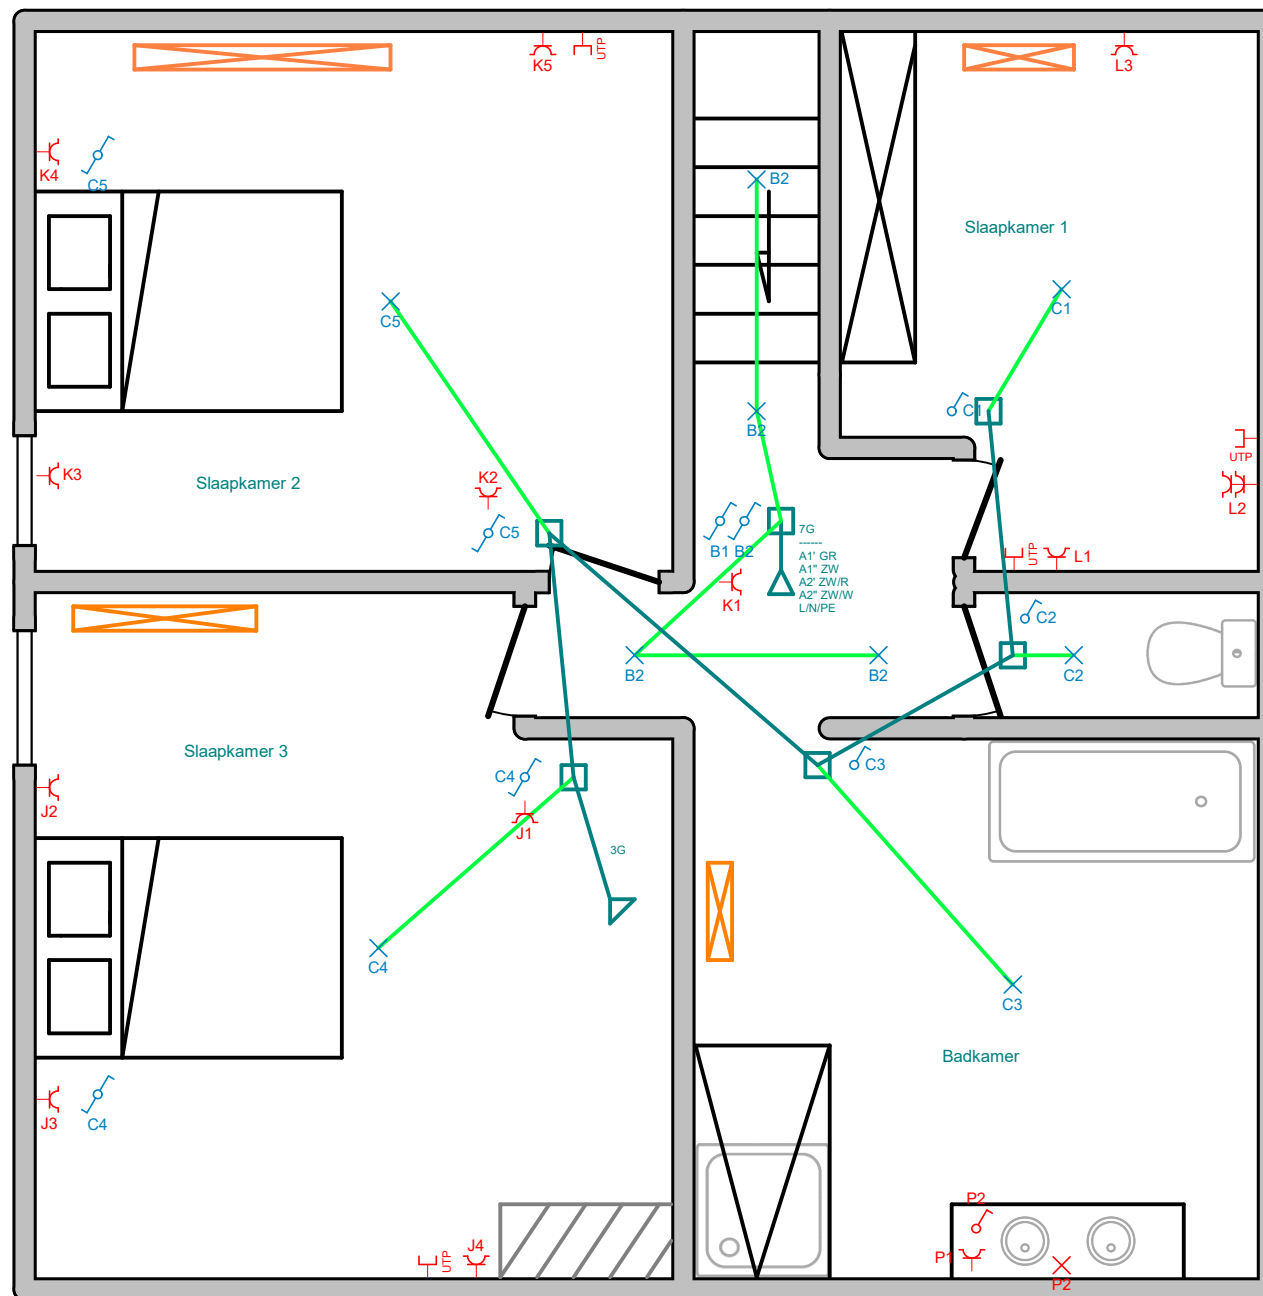

GACEG 322
 Buisstraat 10
 9200 Dendermonde
 Jeffrey de Bisschop

29/02/2024

Plaats van de elektrische installatie

DE WACHTER Pieter
 BENEDENSTRAAT
 SINT LIEVENS HOUTEM

Installateur


Luvicus
 Buisstraat 10
 9200 Dendermonde
 GSM: +32 498 76 78 69
 e-mail: info@luvicus.be
 BTW BE 0746.893.565

**p. 4/6
 Situatieschema**

Datum: 27/11/2023

3 x 230V ~ 50Hz

V.2024-02-29 10:32:03

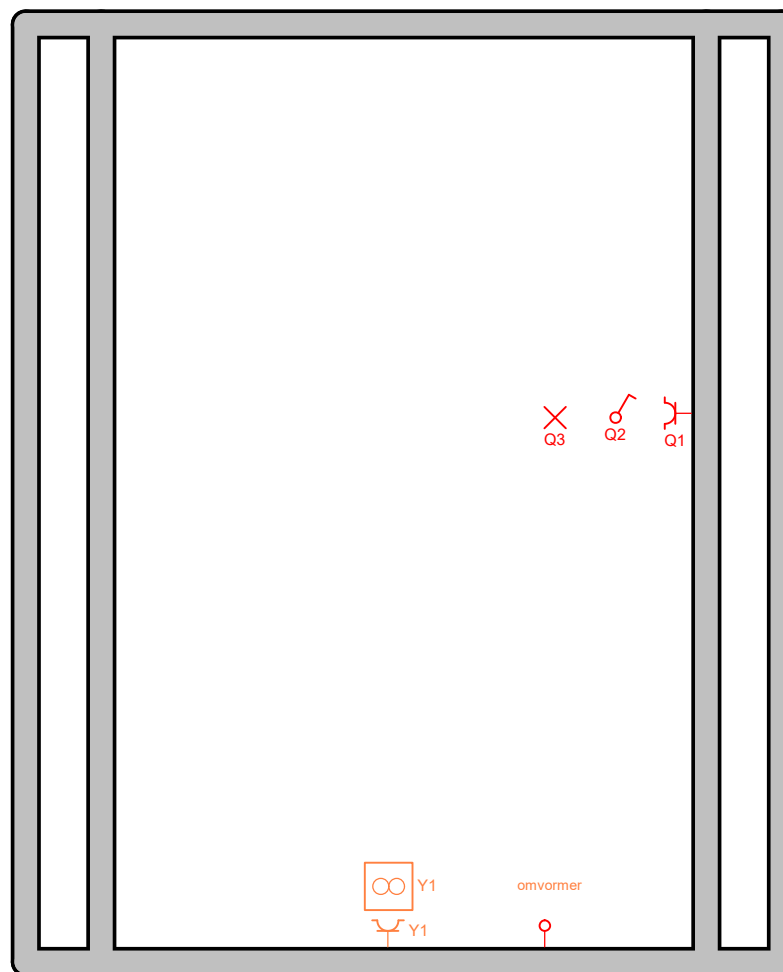

ZOLDER

Plaats van de elektrische installatie

DE WACHTER Pieter
BENEDENSTRAAT
SINT LIEVENS HOUTEM

Installateur

Luvicus
Buisstraat 10
9200 Dendermonde
GSM: +32 498 76 78 69
e-mail: info@luvicus.be
BTW BE 0746.893.565

p. 5/6

Situatieschema

Datum: 27/11/2023

3 x 230V ~ 50Hz

V.2024-02-29 10:32:03

ACEG 322
Bijzondere Aankomst
Jeffrey de Bisschop

29/02/2024

AA	
A	
B	Verlichting +0
C	Verlichting +1
D	Reserve
E	
F	Verlichting buiten
G	RW Pomp
H	
AD	
I	
J	Slaapkamer 3
K	Slaapkamer 2
L	Slaapkamer 1
M	Stopcontacten eettafel en salon
N	Stopcontacten keuken
O	Stopcontacten bureau
P	Badkamer
Q	Zolder
R	
S	Vaatwas
T	Oven

U	Microgolf
V	Frigo
W	Wasmachine
X	Droogkast
Y	Ventilatie
Z	CV
AB	KV
AC	Omvormer
