

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0083-160622-05 Datum van het onderzoek : 22/06/2016
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : INTERIEUR DESIGN VERMOESEN
PULLAAR 227
2870 PUURS

EIGENAAR : INTERIEUR DESIGN VERMOESEN
Adres : PULLAAR 227
2870 PUURS

OPDRACHTGEVER : INTERIEUR DESIGN VERMOESEN
Adres : PULLAAR 227
2870 PUURS

INSTALLATEUR : INTERIEUR DESIGN VERMOESEN
Adres : PULLAAR 227
2870 PUURS

BTW of IK : BE 0547.921.227

EAN : Teller nr. Index :

Visualisatie van de installatie



ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :		Type der Lokalen :	Schrijnwerkerij en conciërgewoning
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/01/83
Aansluiting spanning :	3x400V + N	AREI art. :	87
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 16 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	50 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	4p 63A/300mA
Aantal borden :	2	Aantal eindstroombanen :	87
Uitwendige invloedsfactoren :	CA1/BD1/ BE3	Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,
Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 3,9 Ohm RI tot 2 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

Geen

Besluit De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/06/2021 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0083 JOHAN SEGERS

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlus en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

Plichten van de Eigenaars, Beheerders, Huurders

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te melden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.


STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 22/06/2021.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's

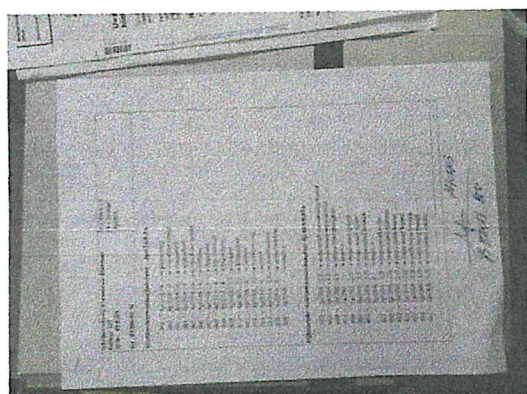

Schrijnwerkerij Vermoesen Herman
Pullaar 227
2870 PUURS

3 x 400V+N
4 x 16 mm²
4p/40A


Tel : 03/886.95.76

Hoofdverliesstroomschakelaar 4p/63A/0,3A

- 001 = 4p/25A : 4 → paneelzaag
- 002 = 4p/25A : 4 → van dikke schaaf
- 003 = 4p/25A : 4 → vacuümlift
- 004 = 4p/25A : 4 → vlakschaaf
- 005 = 4p/25A : 4 → van dikke schaaf
- 006 = 4p/25A : 4 → lintzaag
- 007 = 4p/25A : 4 → draaibank
- 008 = 4p/25A : 4 → top verticaal
- 009 = 4p/25A : 4 → top schuin
- 010 = 4p/16A : 2,5 → longgat
- 011 = 4p/16A : 2,5 → kettingboor
- 012 = 4p/25A : 4 → laspost
- 013 = 4p/16A : 2,5 → stofafzuiging
- 014 = 4p/25A : 4 → poort
- 015 = 4p/16A : 2,5 → boormachine
- 016 = 4p/25A : 4 → schaafmachine
- 408 = 4p/25A : / → reserve

Bijkomende verliesstroomschakelaar 4p/40A/0,03A

- 402 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact verwarming bureel
- 403 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact wasmachine
- 404 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact droogkast
- 413 = 2p/20A : / → reserve
- 406 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact ijskast
- 401 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact vijver
- 405 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact keuken
- / = 2p/20A : / → reserve
- 407 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact oven
- 409 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact vaatwas
- 410 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact bureel
- 411 = 2p/20A : 2,5 → stopcontact bureel
- 412 = 2p/10A : 1,5 → verlichting keuken
- 414 = 2p/10A : 1,5 → verlichting bureel
- 415 = 2p/10A : 1,5 → verlichting inkom


83 STEELS BVV
22/04/03

4p163A/013

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

408

4p140A/0103

402

403

404

413

406

401

405

407

409

410

4p163A/10/3

4p140A/10/3

411

412

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

203

204

301

302

303

304

305

101

102

103

104

105

106

107

4p163A/0,3

108

109

110


111

112

201

202

30/07/2006

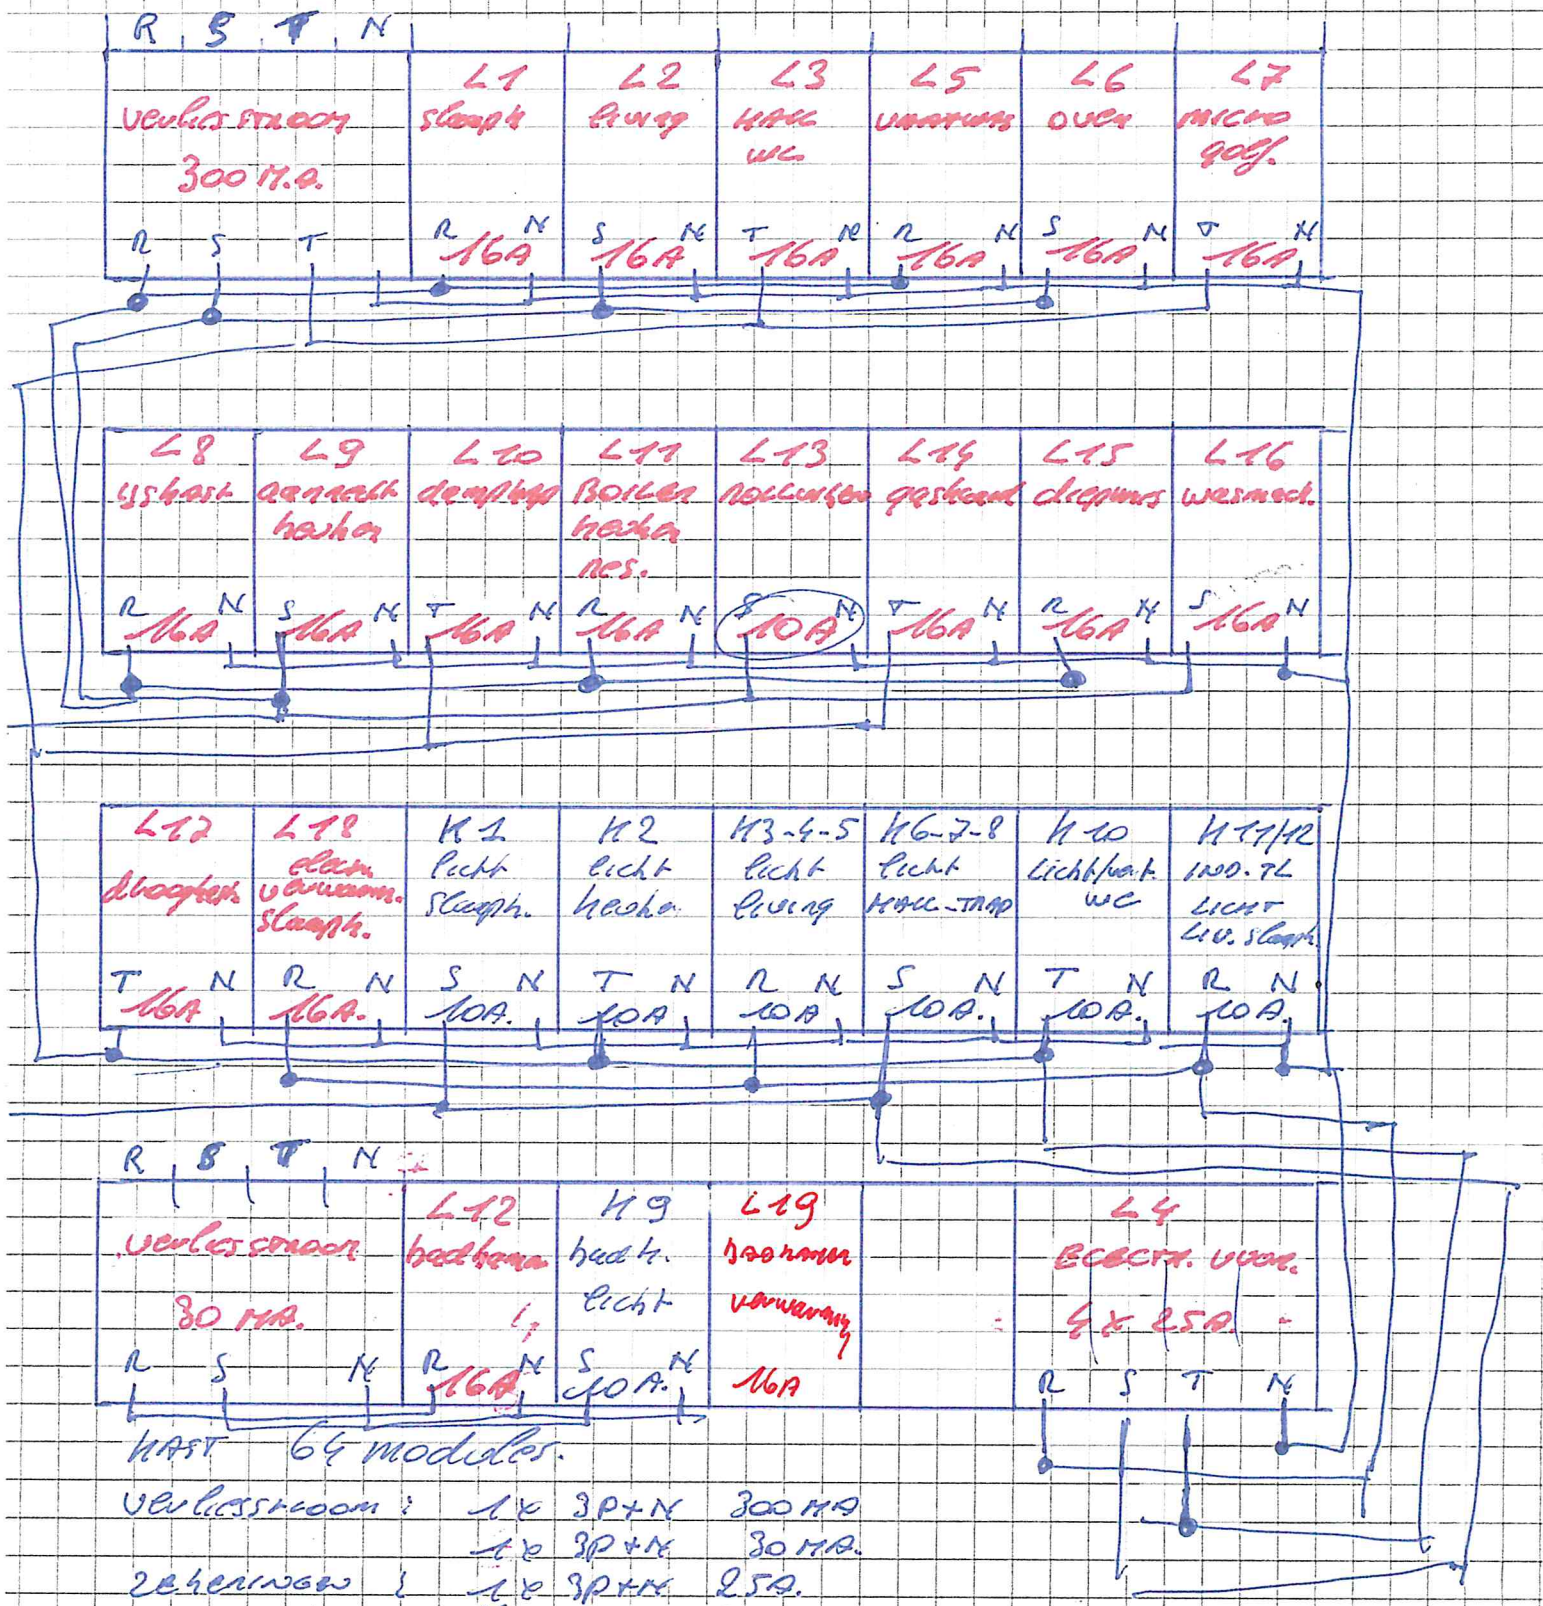

Verlesstroom: 1x 3P+N 300 H.A.
 1x 3P+N 30 H.A.
 Zekeringen: 1x 3P+N 25A.
 16x 2P. 16A
 8x 2P. 10A.

Schakelaar: 1x huis
 1x wasser
 6x def. polg
 6x nulcorg
 6x blind gldg
 2x dist. Polg
 1x internet

Privees 54K.
 Voor 1x trapstaple 1x
 Spots 400L 5
 TL 1x 1,80
 1x 9,20
 trap 50K

ELECTRICITEIT.

SLAAPKAMER	L 1	STOPCONTACT
	L 18	STOPCONT. VERWARMING.
BAD KAMER	L 12	Leve to stopcontact
	L 19	VERWARMING
KEUKEN	L 11	ROKKE
	L 10	dampkap (AEG/oud)
	L 9	aerzucht
	L 8	YSKAST
	L 7	MILKOGUJ
	L 6	OVEN
	L 5	WASTWAS
	L 4	5x4mm ² kookplaat
LIVING	L 2	STOPCONTACT.
Buitenruimte ?? = L 20		

os 2 = !!. ungerade

12/11/20

32

2020/05/20

2x 4mm 5 knot/cut

۱۳۰۲

1990

12/01/24

2/24/20

2000

(20/21) optimal

1000

НЗНУЗН



20

22

7 7



✓ 43 Vermerk



Cause to / Effect answer



2017.05.14

20190325

33. 11. 2019
