

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/02/2020 Inspecteur: Jeroen De Bondt Mentor: Installateur: Verba Elek - 3868
ID-label: B.T.W. nr.: BE 474 265 068 Client reference: IK. nr.:
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 3464069

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Diepestraat
Huisnummer 37
Busnummer Glv
Postcode 1780
Gemeente Wemmel
Land België

Eigenaar

Naam VHD Estate
Straatnaam Diepestraat
Huisnummer 37
Busnummer Glv
Postcode 1780
Gemeente Wemmel
Land België

Naam contactpersoon VHD ESTATE
Telefoon 0478263877
Gsm nr. (SMS)

Installateur

Naam Verba Elek - 3868
BTW nr. BE 474 265 068
Telefoonnummer 0476/68.98.00 - 02/306.06.06
E-mail verba-elek@telenet.be

Type : appartement EAN : 54 Teller Nr. : 142720

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 11 Isolatie: 208 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 12,14 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☒
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing ☐ in afwachting			
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 10/2/2045
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jeroen De Bondt

Jeroen De Bondt

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/2/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

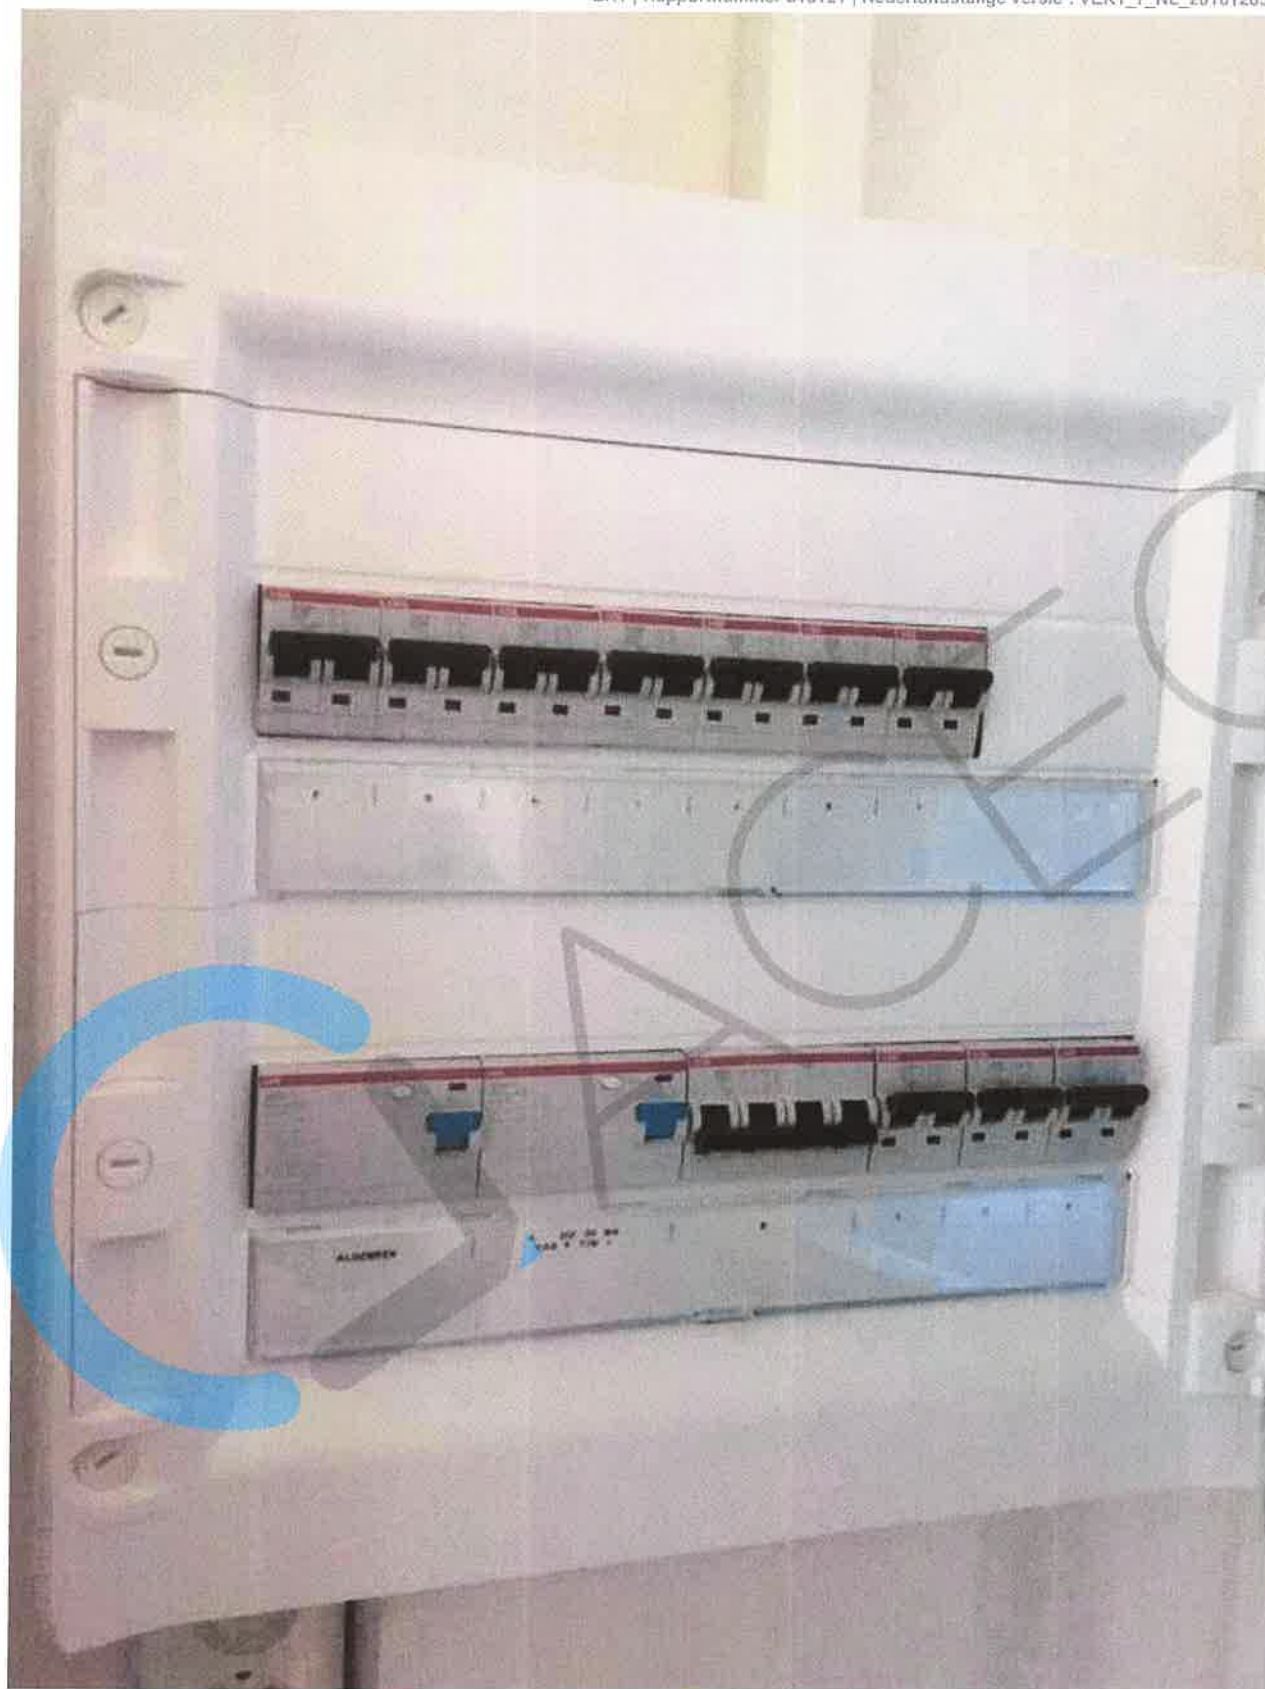





10/02/2020

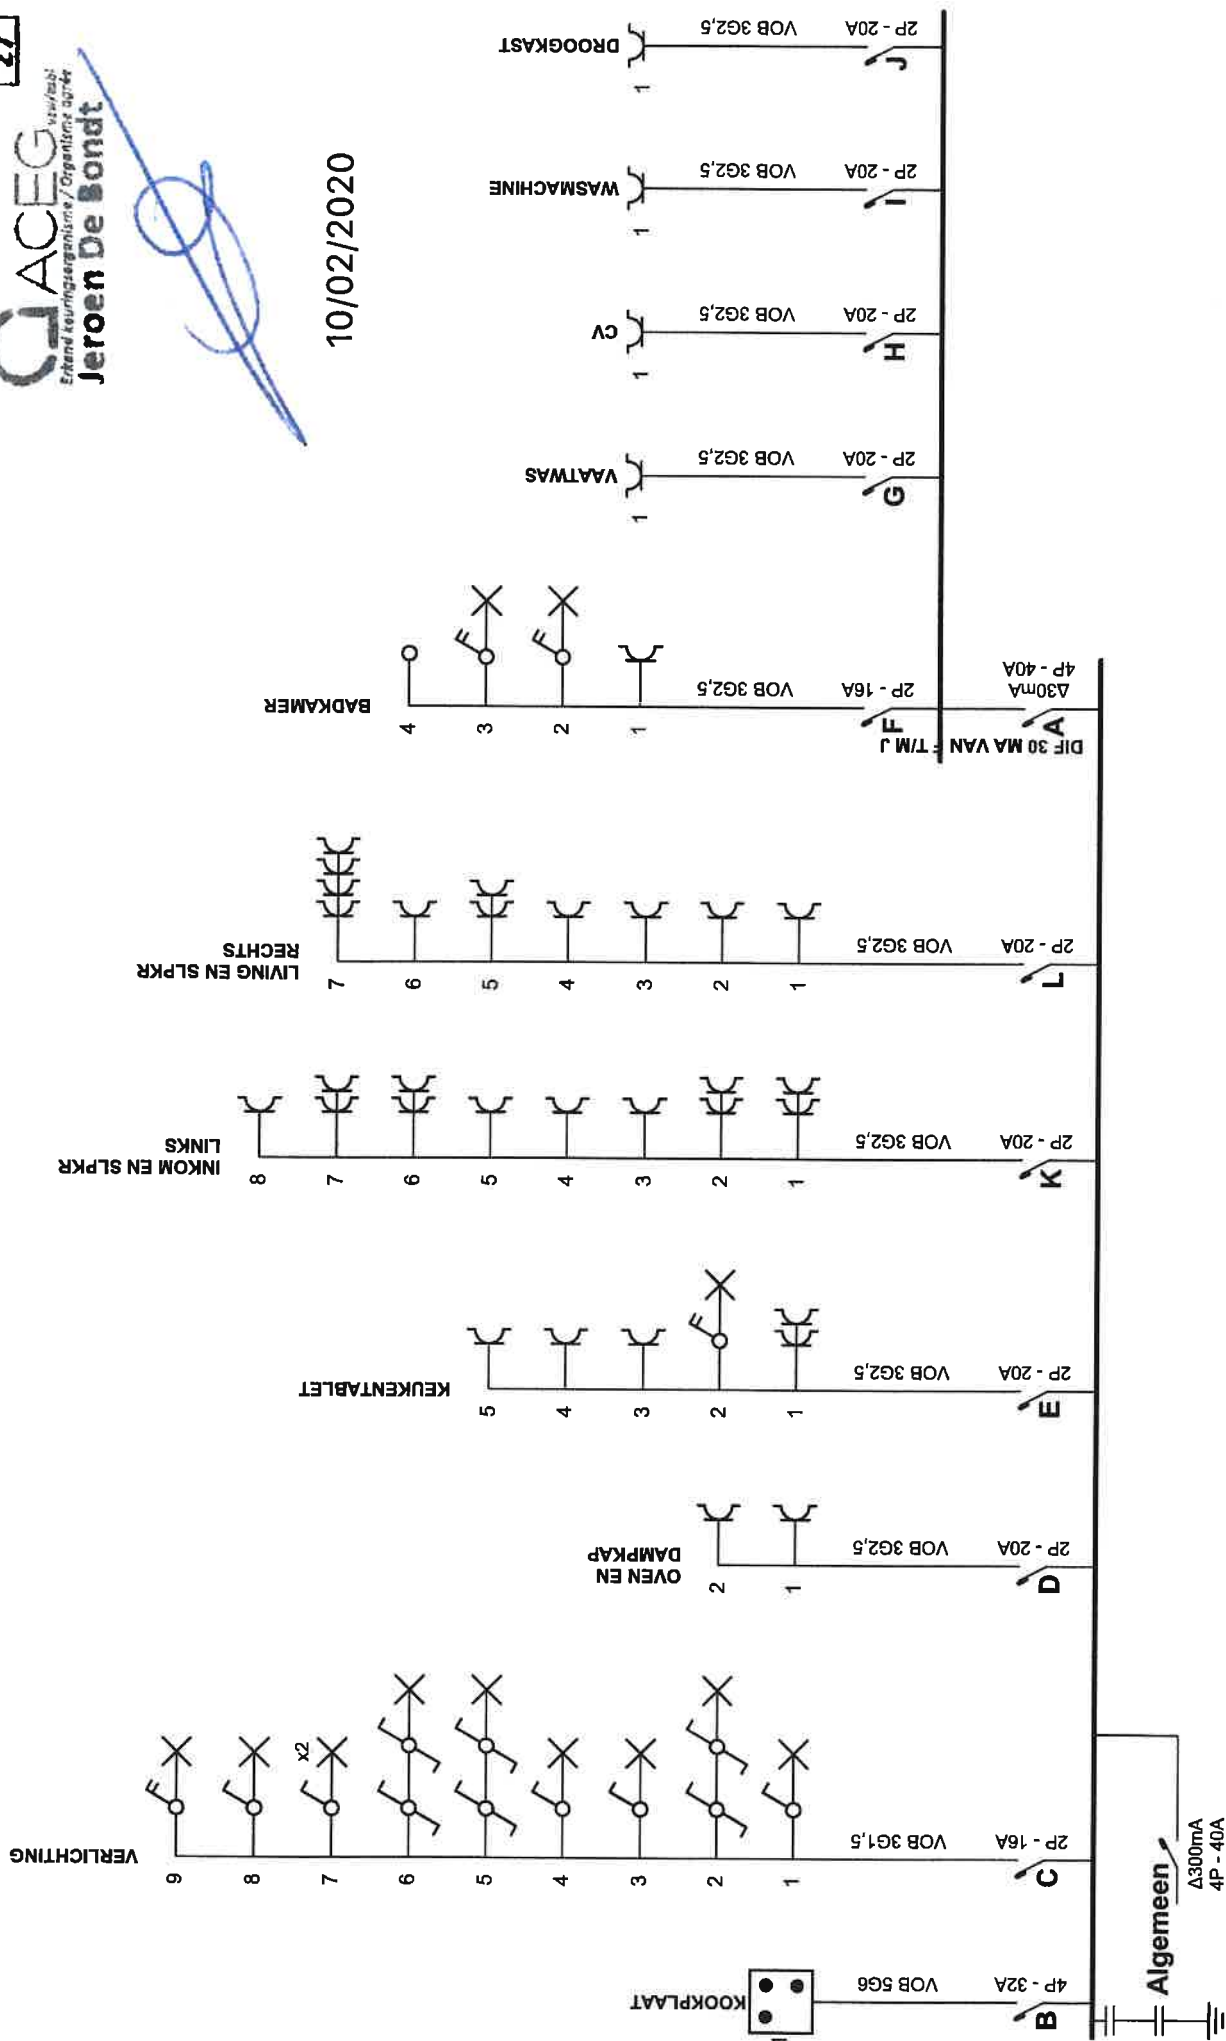

Erkend Organisme
 ACEG

Romeinsesteenweg 524 / 28b
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 VHD ESTATE
 DIEPESTRAAT 37 Bus 1
 1780 WEMMEL
 GSM: 0478/26.38.77

Installateur
 Verba-Elek


G. De Donderstraat 53
 1852 Beigem
 Tel.: 02/306.06.06
 0474265068

p. 1/3
 Einddraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

VERBA
 elek

10/02/2020

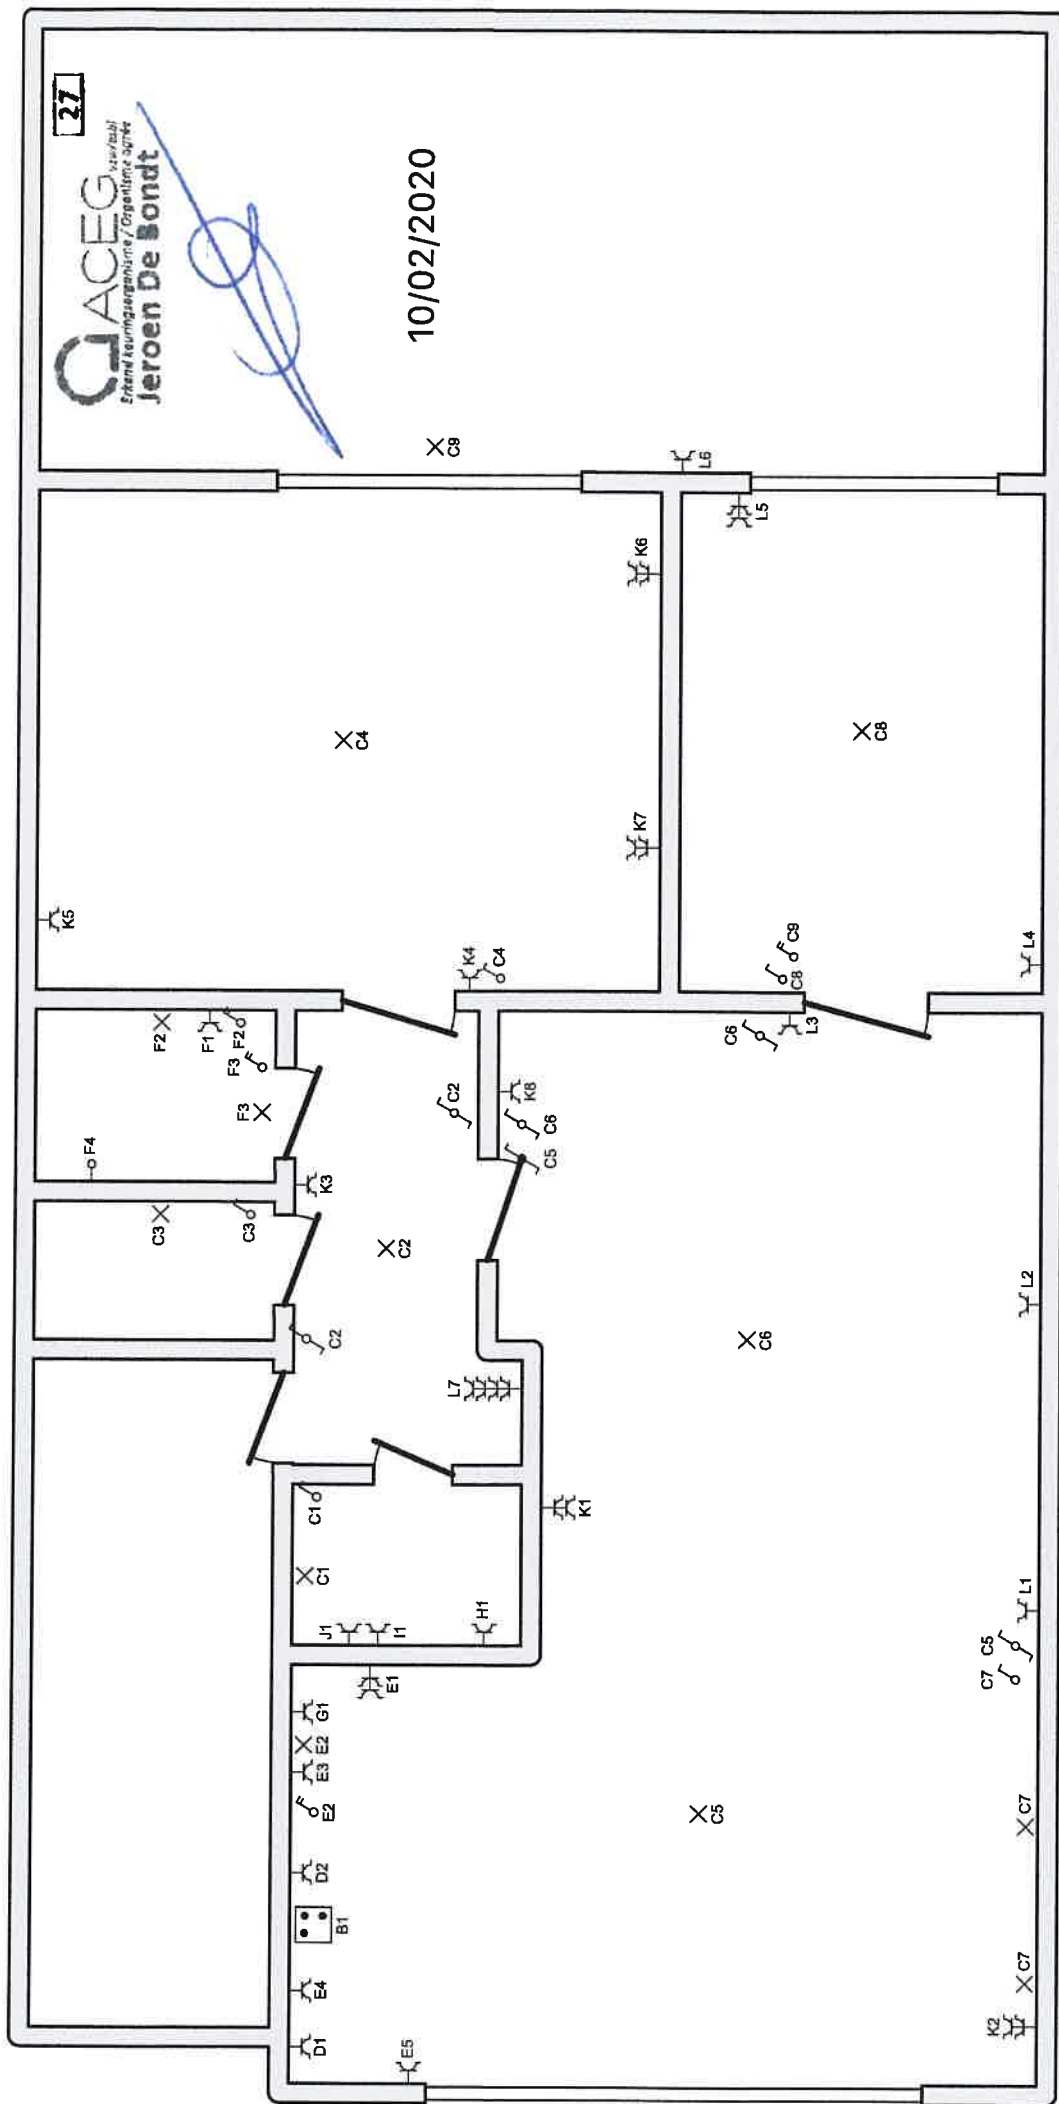

GELIJKVLOERS

Erkend Organisme

ACEG
Romeinsesleeweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

VHD ESTATE
DIEPESTRAAT 37 Bus 1
1780 WENMEL
GSM: 0478/26.38.77

Installateur

Verba-Elek
G. De Donderstraat 53
1852 Beigem
Tel.: 02/306.06.06
0474265068

p. 2/3

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

VERBA
elek

10/02/2020

Algemeen

- B KOOKPLAAT
- C VERLICHTING
- D OVEN EN DAMPKAP
- E KEUKENTABLET
- K INKOM EN SLPKR LINKS
- L LIVING EN SLPKR RECHTS
- A DIF 30 MA VAN F T/M J
- F BADKAMER
- G VAATWAS
- H CV
- I WASMACHINE
- J DROOGKAST

Erkend Organisme ACEG Romeinsesteenweg 524 / 28b 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be	Plaats van de elektrische installatie VHD ESTATE DIEPESTRAAT 37 Bus 1 1780 WEMMEL GSM: 0478/26.38.77	Installateur Verba-Elek G. De Donderstraat 53 1852 Beigem Tel.: 02/306.06.06 0474265068 	p. 3/3 Lijst Kringen 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: DBT Electrics - BTW BE 0839.878.161			
