



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 21/03/2025

Inspecteur: Jame Lattré

Mentor:

Installateur: JOSE VOF

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0836 099 814

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481245

Datum verslag: 31/03/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1862066

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Haeyershoek
Huisnummer 21
Busnummer
Postcode 9660
Gemeente BRAKEL
Land België

Eigenaar

Naam Van Twembeke Chris
Straatnaam Haeyershoek
Huisnummer 21
Busnummer
Postcode 9660
Gemeente BRAKEL
Land België

Installateur

Naam JOSE VOF
BTW nr. BE 0836 099 814
Telefoonnummer +32 494 77 48 41
E-mail info@a-attest.be

Type : woning

EAN : 541 448 820 062 960 708

Teller Nr. : 1SAG3100742998

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie van voor 1981 volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- hoofdstuk 8.4.3. en 4.2.4.3. en 8.2.1

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 21

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2,31 MΩ

RE: 26,5 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie eendraadschema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.
 N34 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 21/3/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:06 tot 14:44
 De inspecteur Jarne Lattré

Jarne Lattré
 ACEG VZW - #416

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 21/3/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



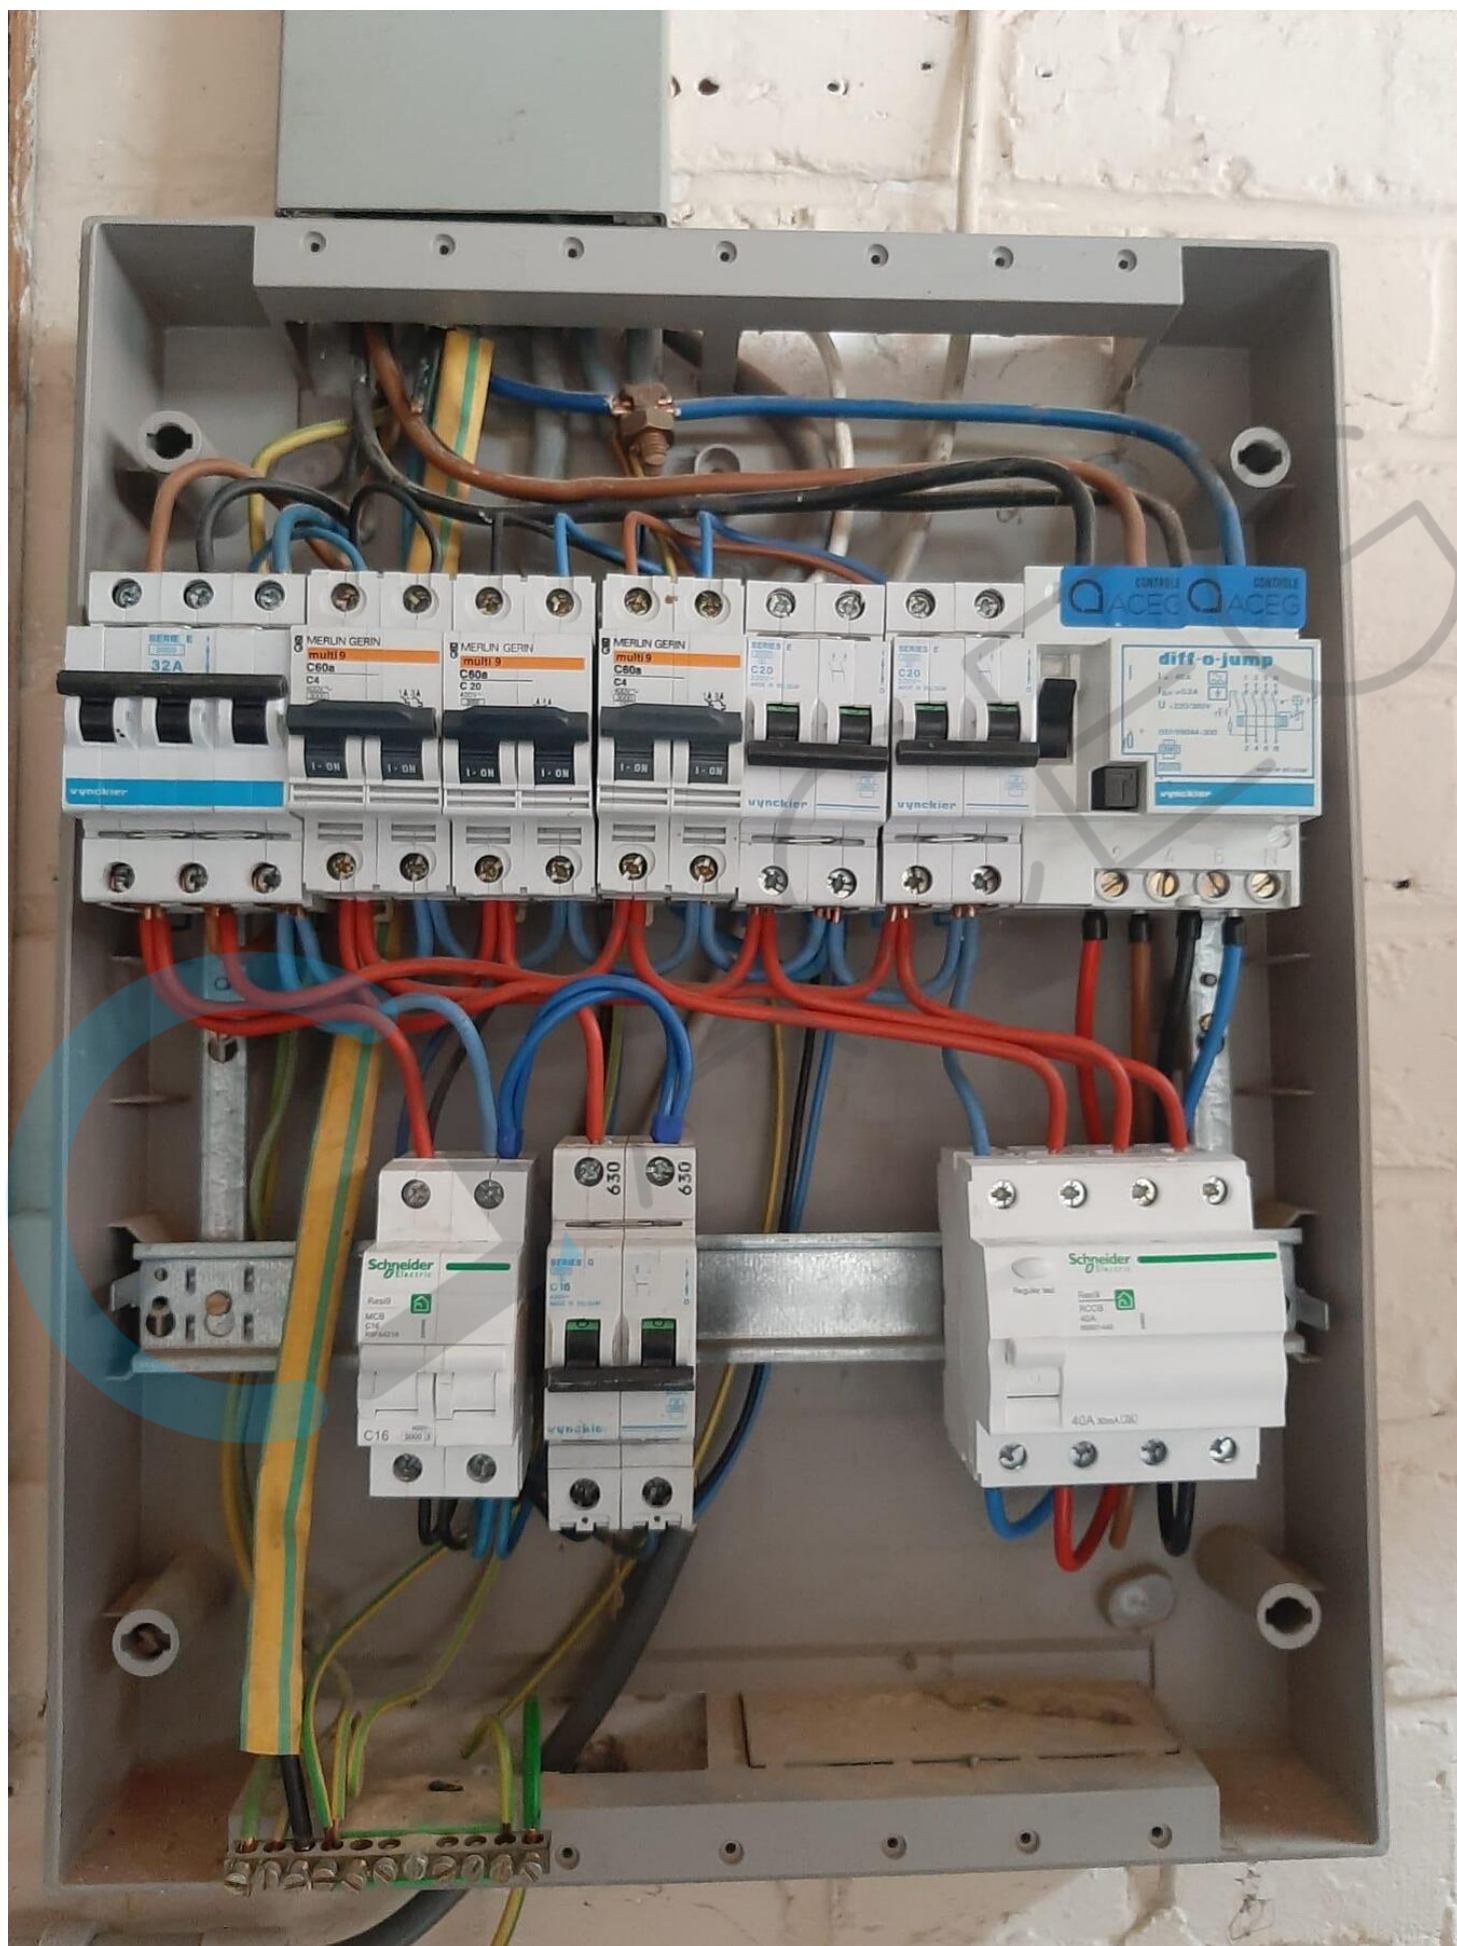




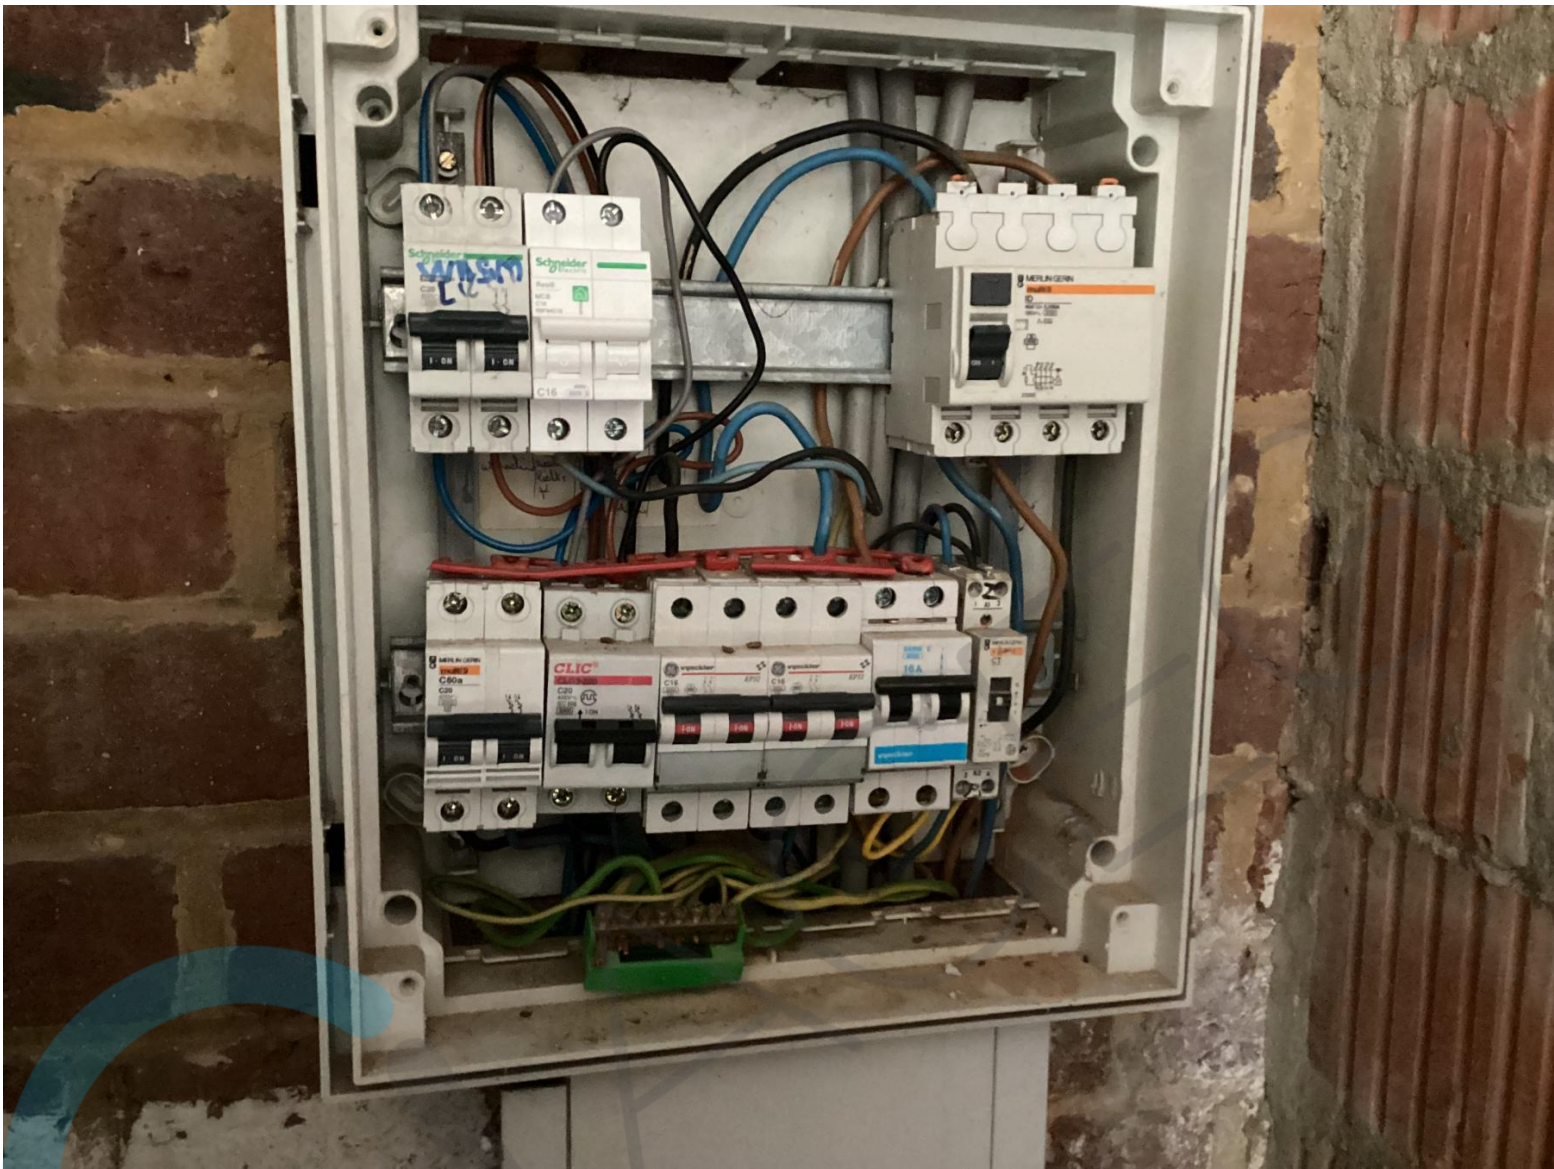





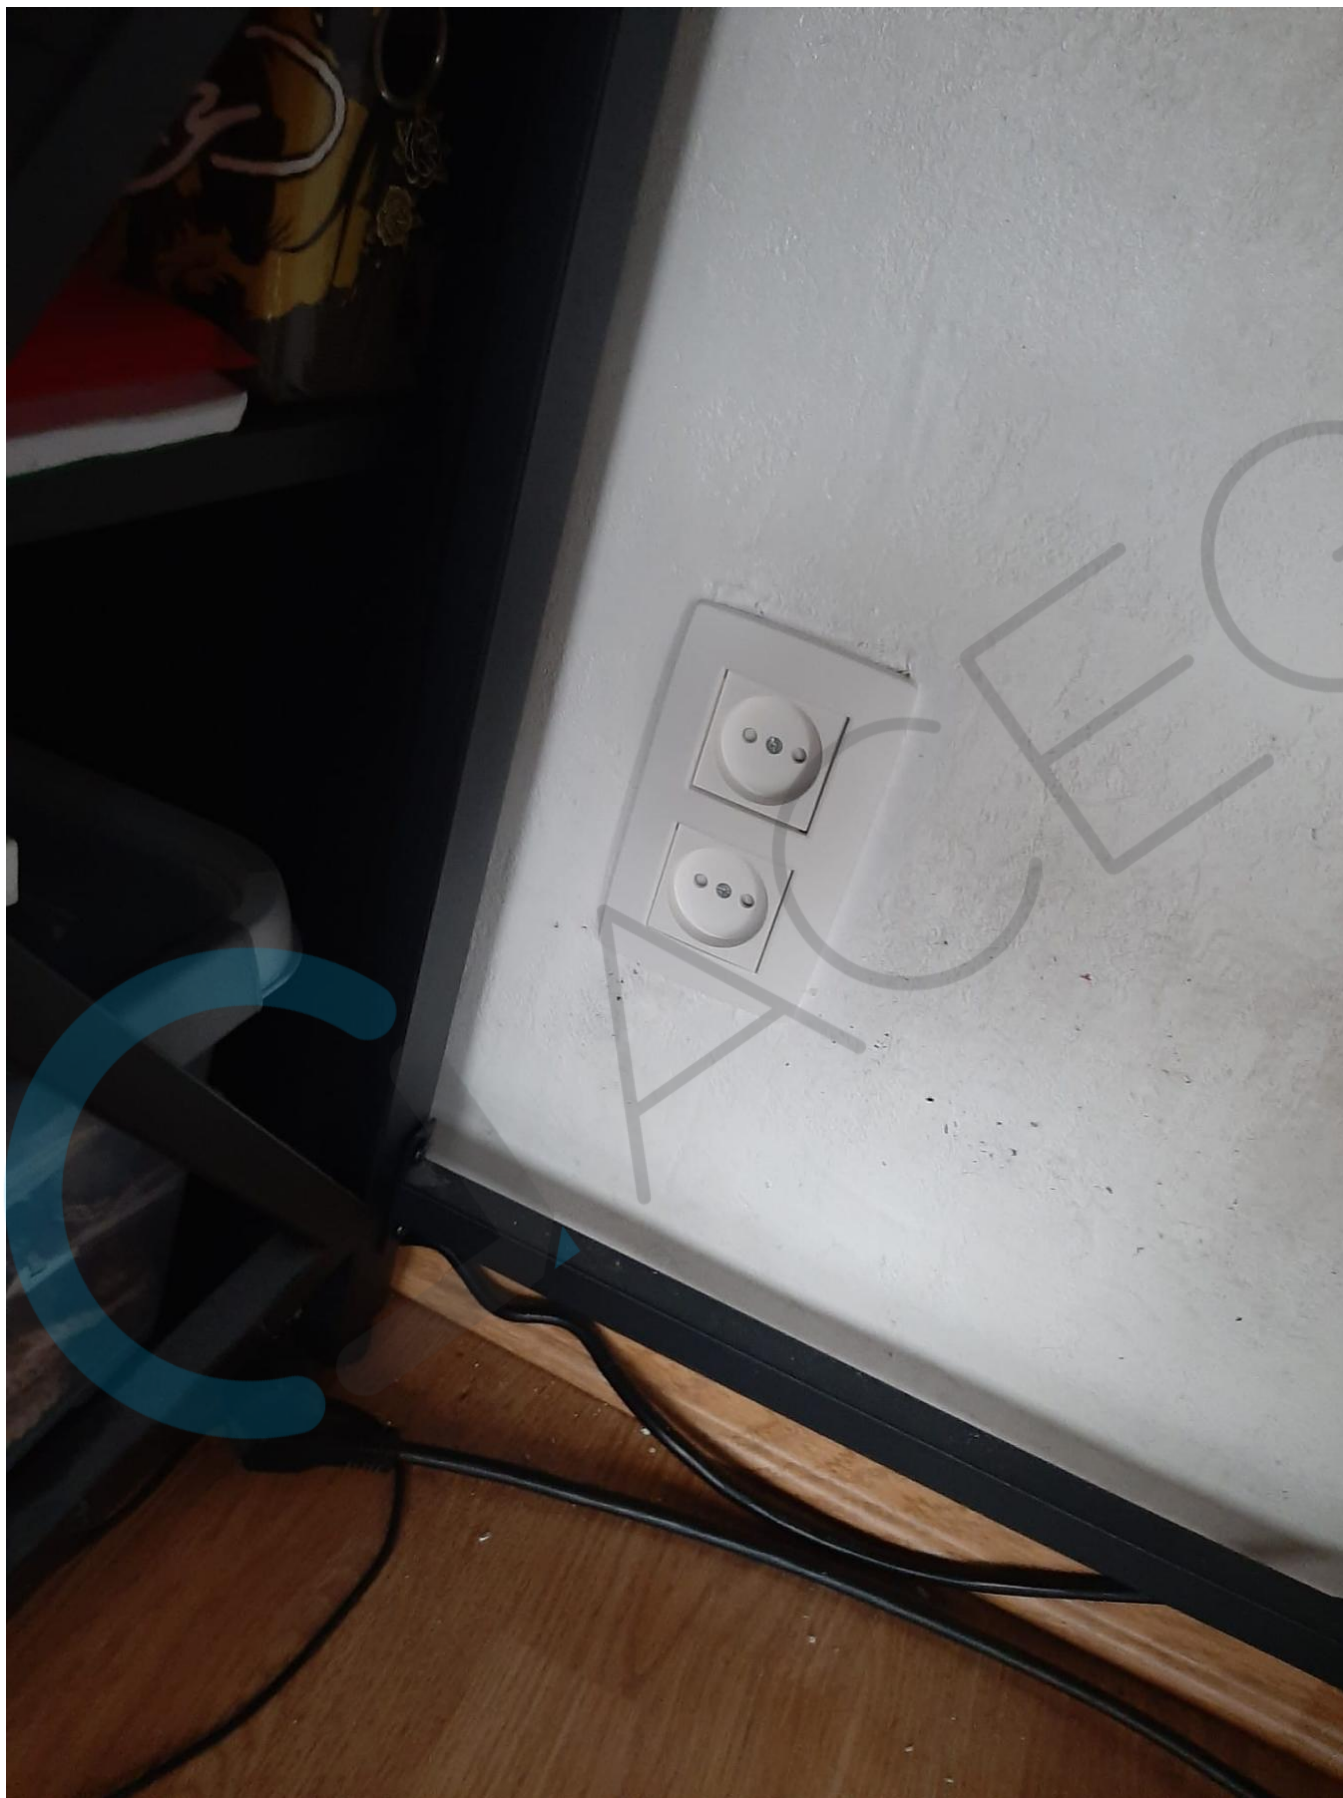



















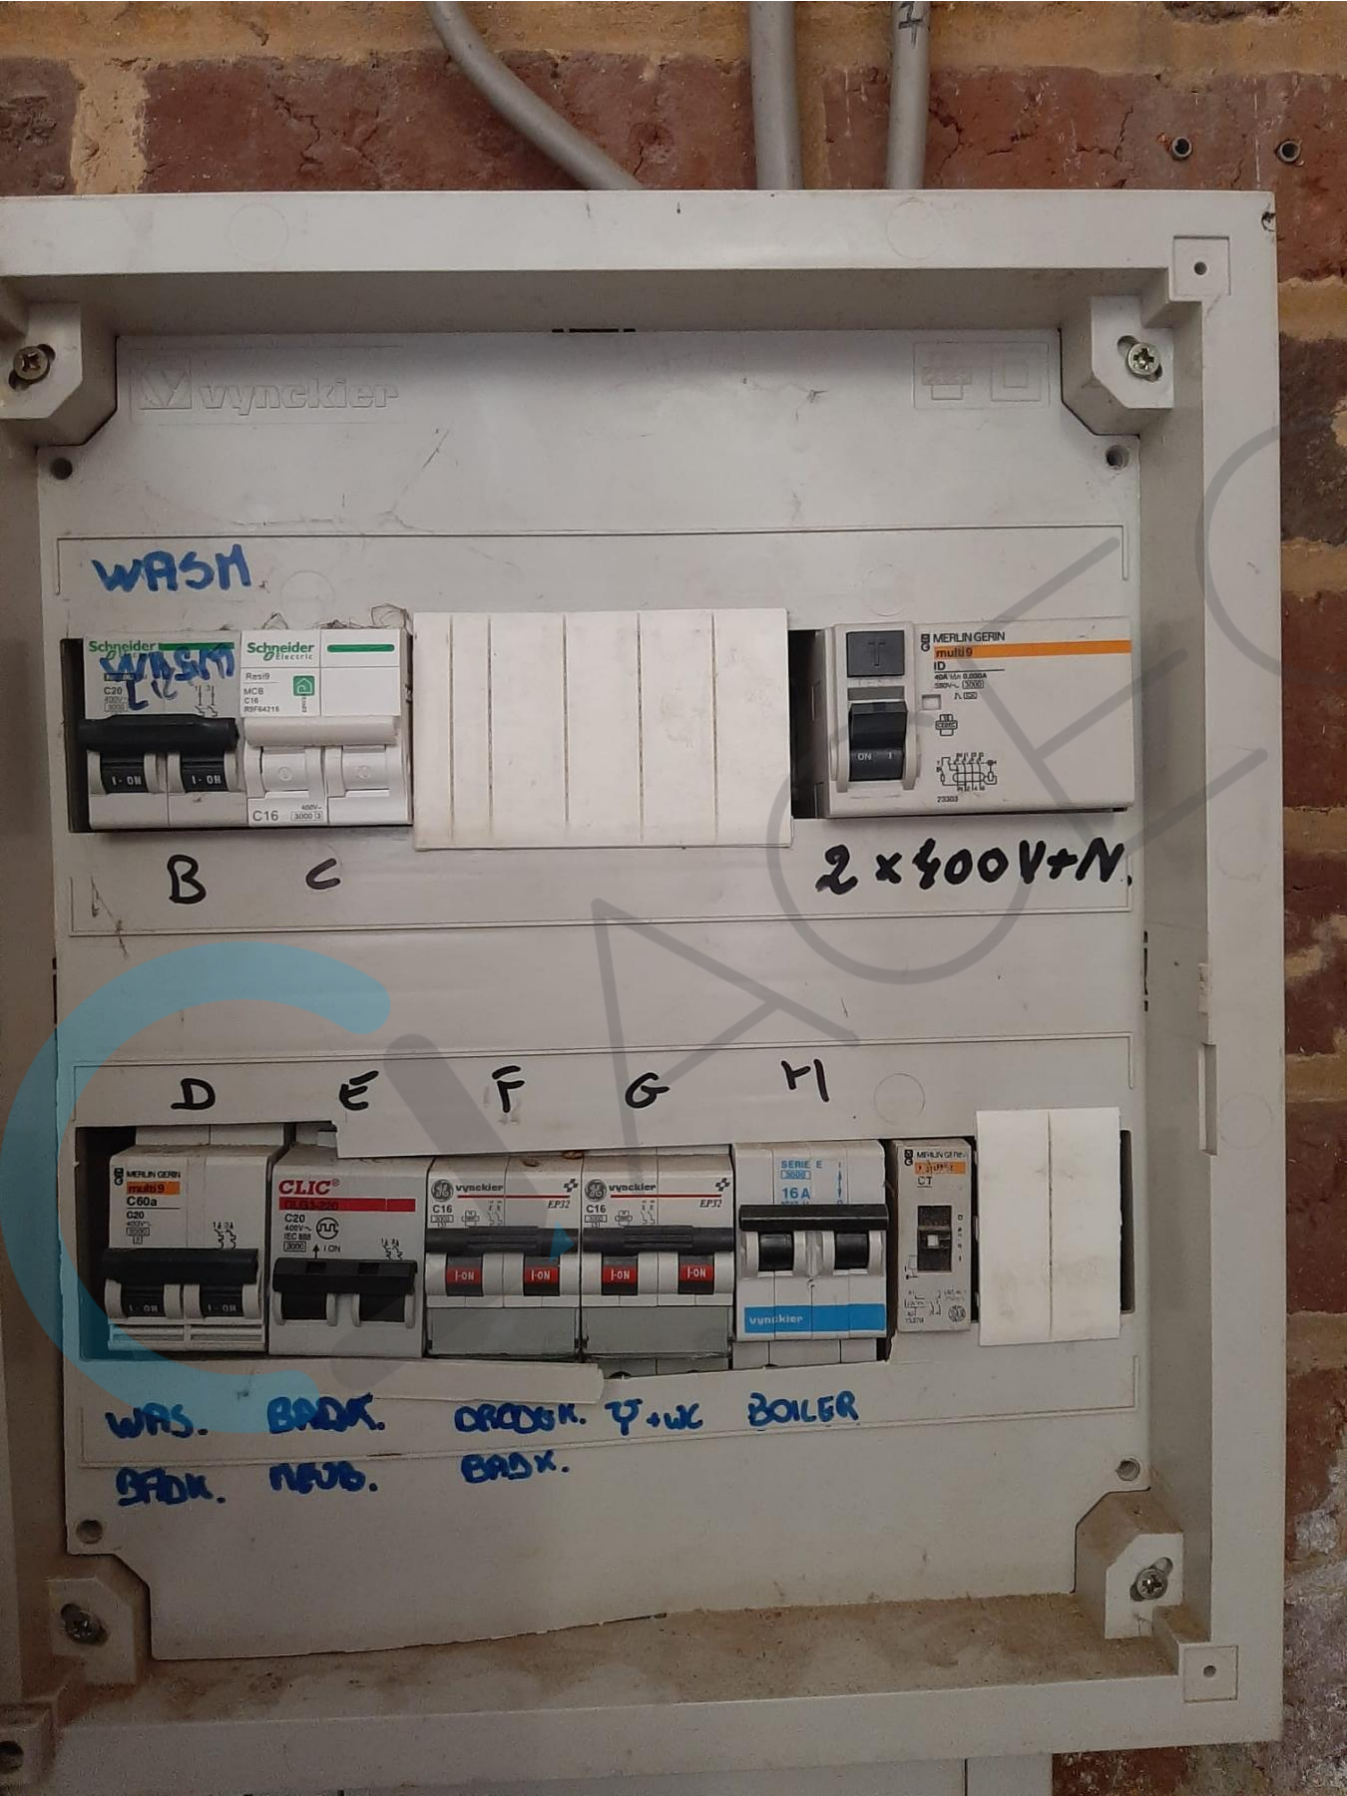


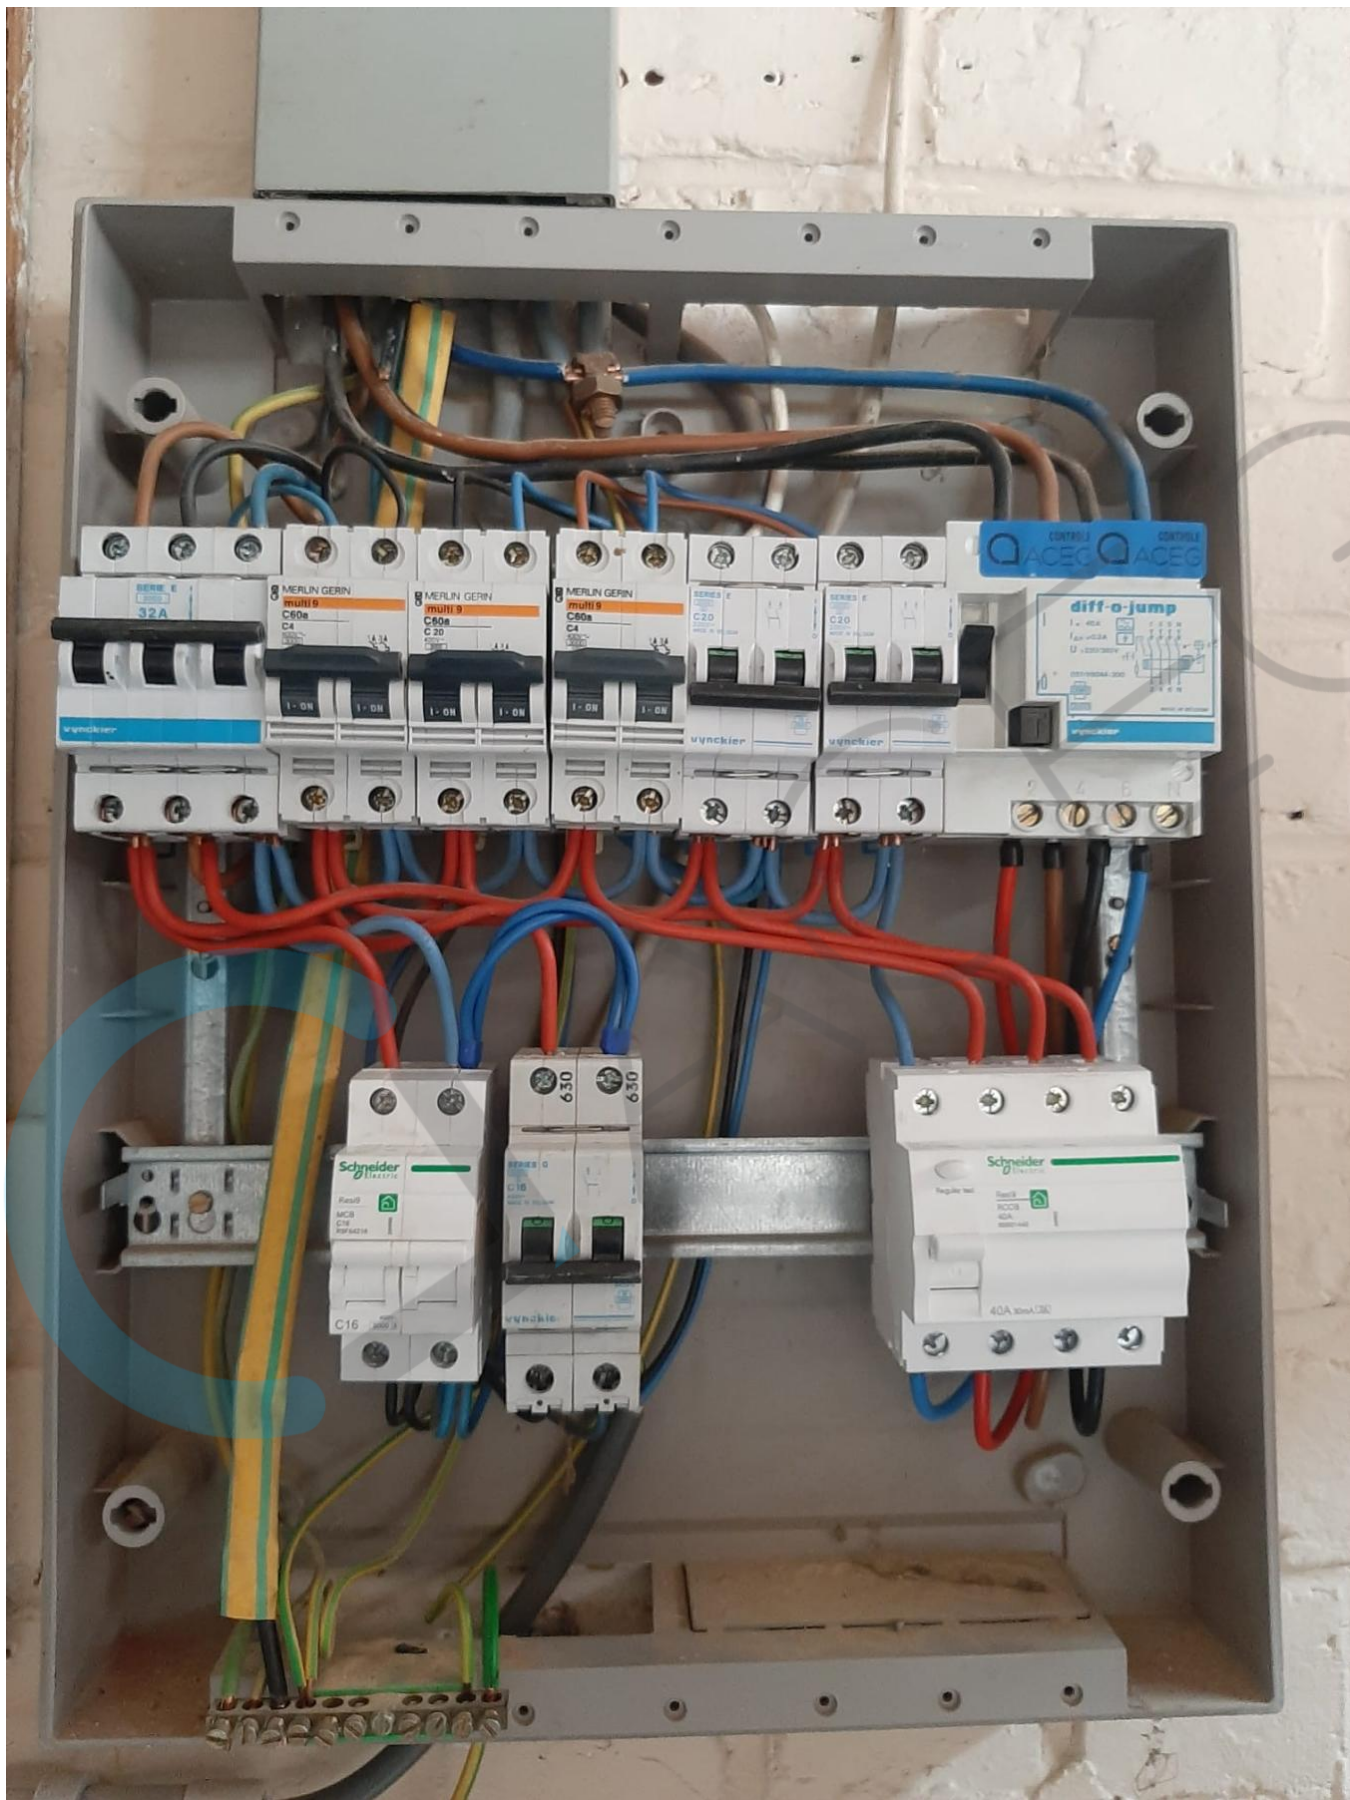





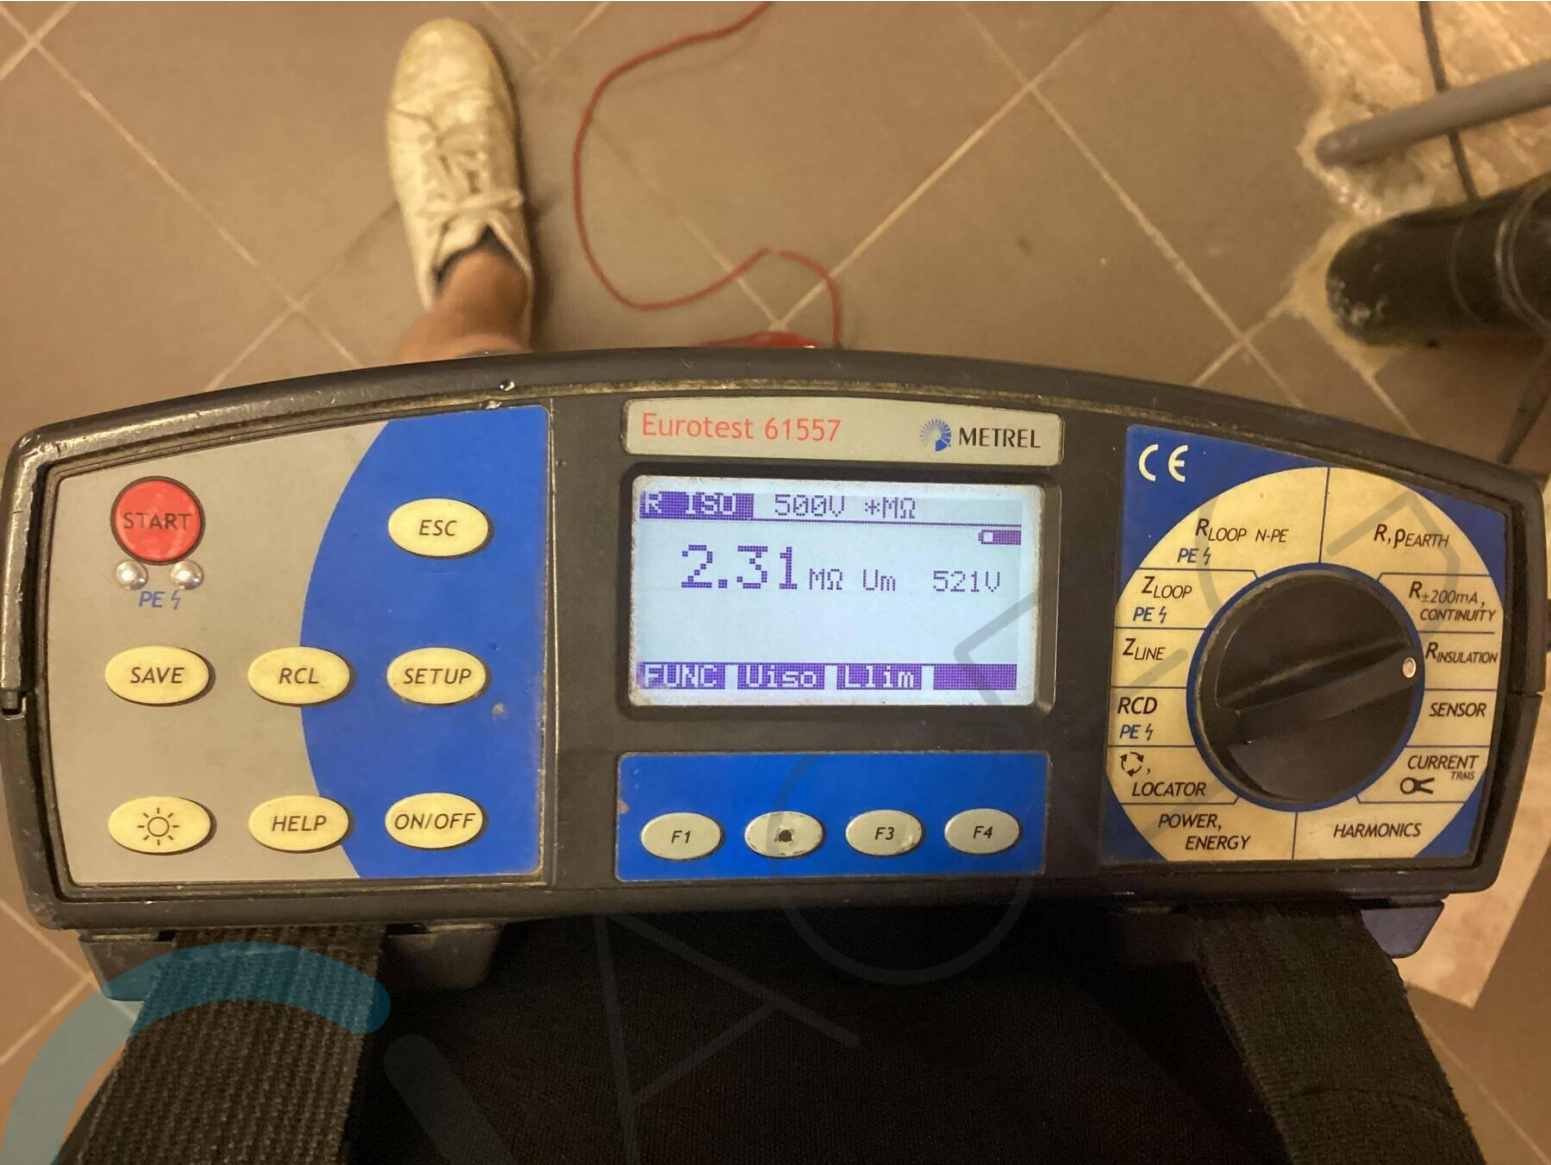

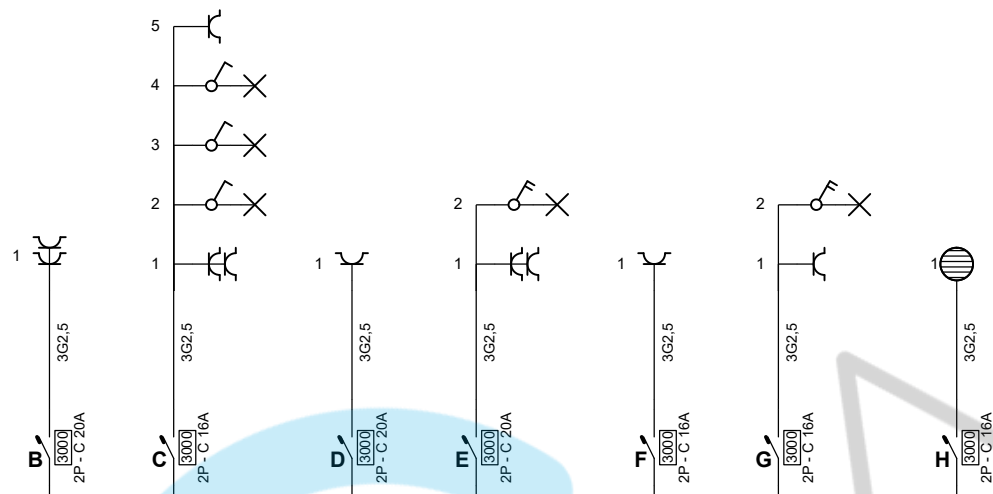

Plaats van de elektrische installatie
 Van Twembeke-De Pessemier
 Haeyershoek 21
 9660 Brakel

Installateur


p. 1/4
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Elektro De Pessemier - BTW BE 0898.414.691


31/03/2025

Jarne Lattré
 ACEG VZW - #416

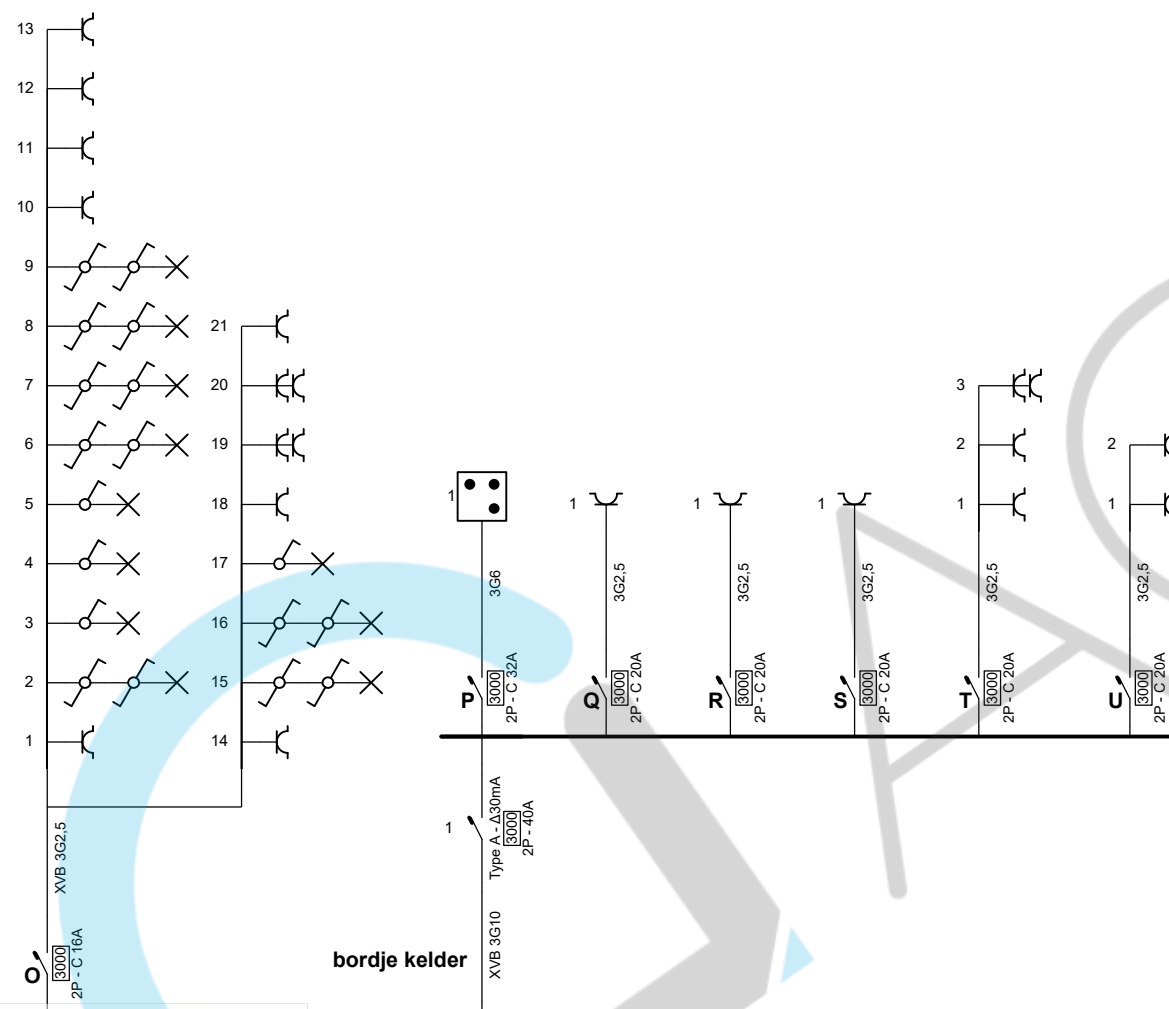

Janne Lattre
31/03/2025

Plaats van de elektrische installatie Van Twembeke-De Pessemier Haeyershoek 21 9660 Brakel	Installateur	p. 2/4 Eendraadschema
		3 x 400V + N ~ 50Hz
Schema's getekend door: Elektro De Pessemier - BTW BE 0898.414.691		

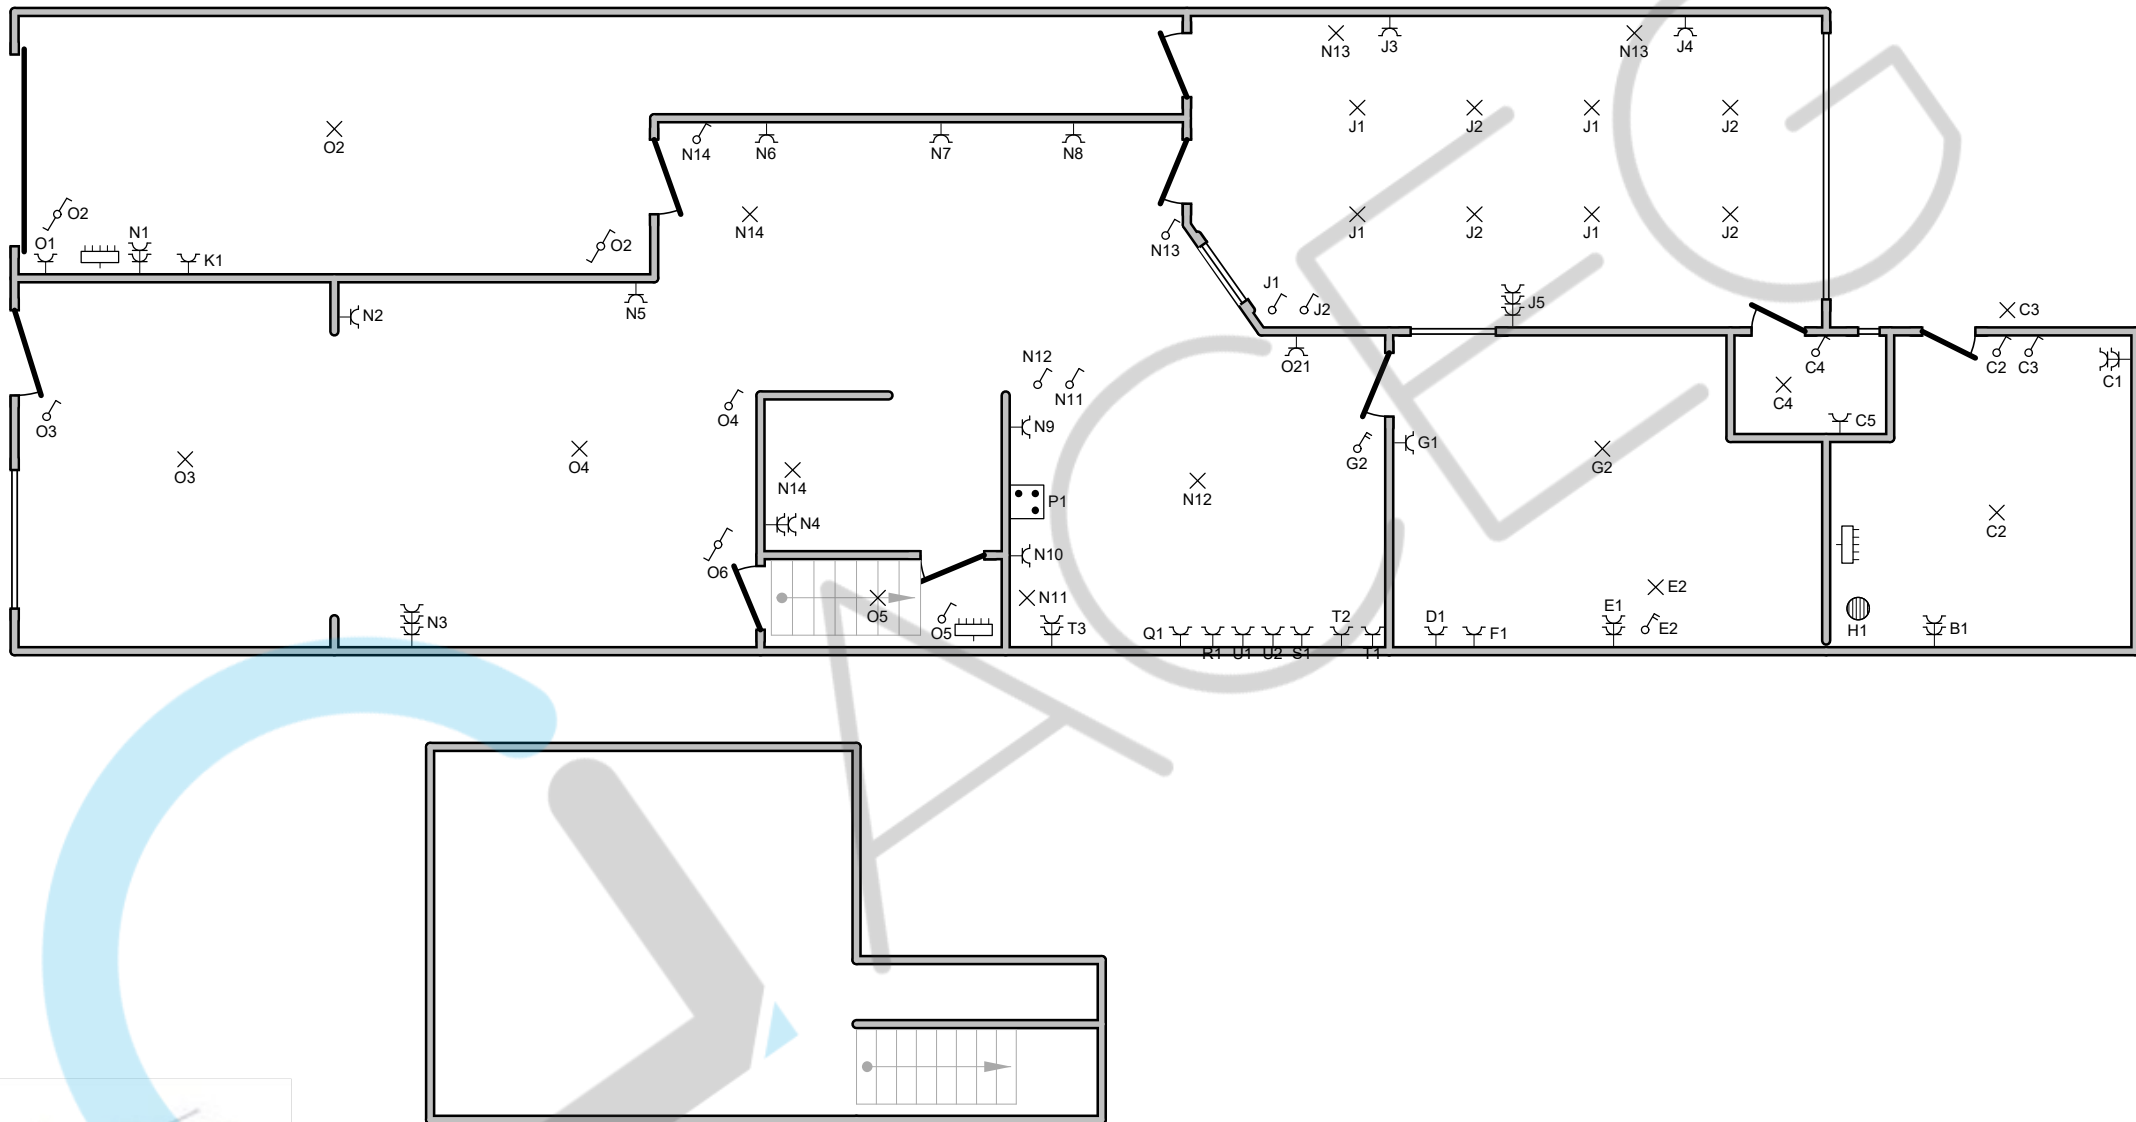

Plaats van de elektrische installatie

Van Twembeke-De Pessemier
Haeyershoek 21
9660 Brakel

Installateur

**p. 3/4
Situatieplan**

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Elektro De Pessemier - BTW BE 0898.414.691

