

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/03/2024

Inspecteur: Wesley Carels

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie: 2de

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serienummer: 19481250

Datum verslag: 15/03/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Sint-Amandsstraat
Huisnummer	16
Busnummer	3
Postcode	1853
Gemeente	Strombeek-Bever
Land	België

Eigenaar

Naam	Via immo
Straatnaam	Sint-Amandsstraat
Huisnummer	16
Busnummer	3
Postcode	1853
Gemeente	Strombeek-Bever
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : woning

EAN : 541448820072663958

Teller Nr.: : 34933023

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 6 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 16


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0,899 MΩ

RE: 9,16 Ω

OK

OK

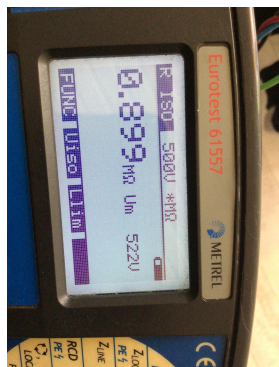

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40	-	-	A	11	OK	OK
300	40	-	-	A	Alle	OK	OK
30	40	-	-	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
6	-	20		2	2,5
1	C	6		2	1,5
2+1	-	10		2	1,5
2+1	-	andere	15	2	2,5
2	-	16		2	2,5
1	-	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 19 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 15/3/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 11

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Wesley Carels

De werknemer,
Wesley Carels
#113 - ACEG

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/3/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



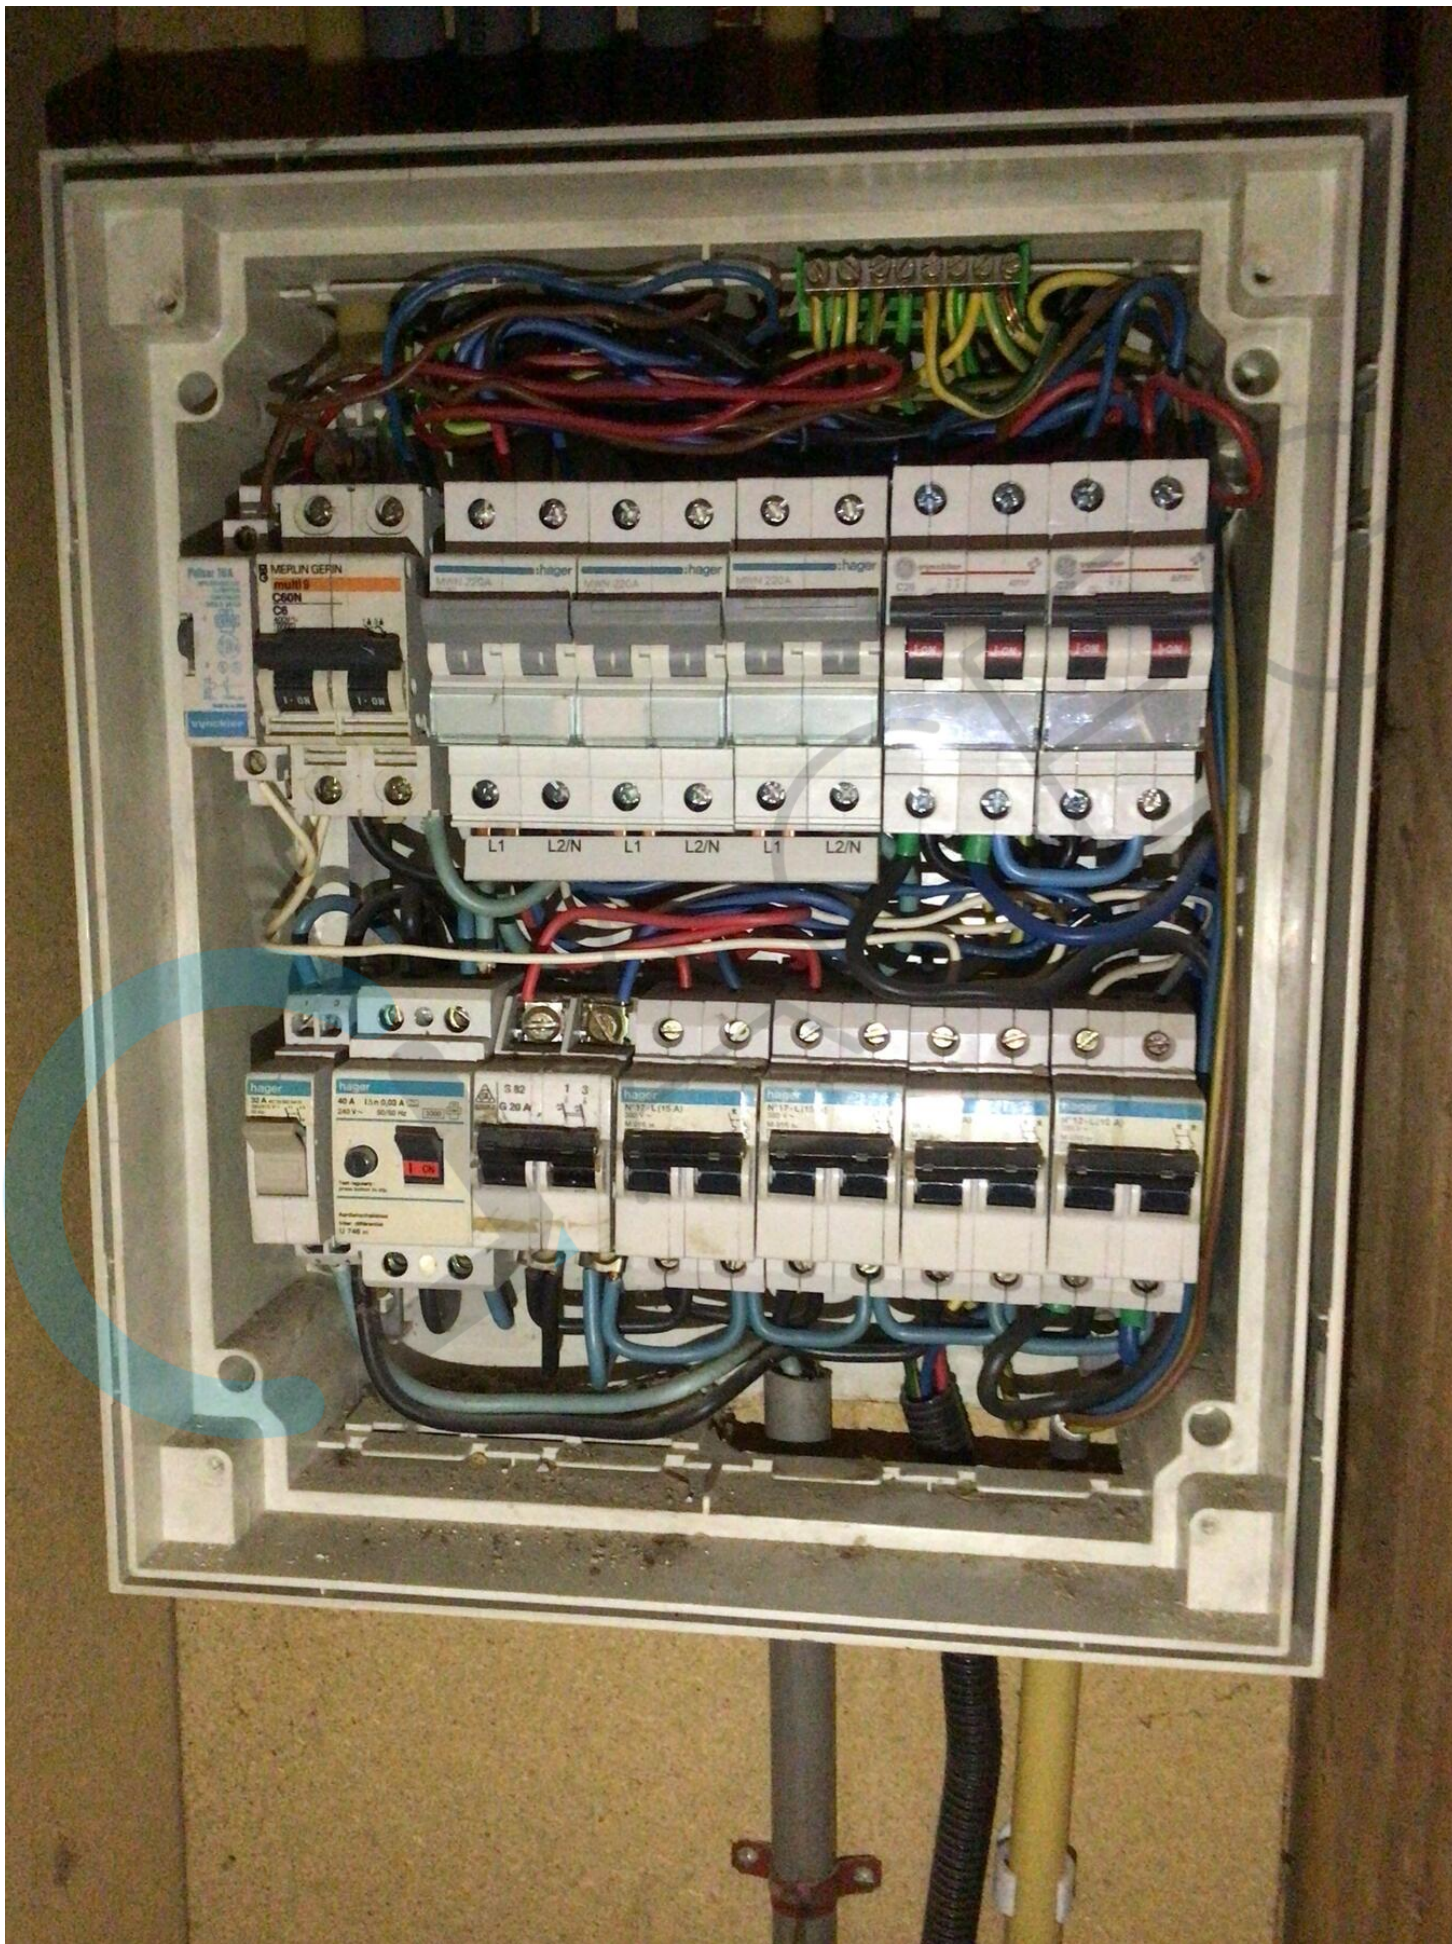

4

St-Amandsstraat, 16
1853 Strombeek-Bever


BISCHOP Silvie

Parapher


La date de la déclaration


est de

le 27/02/2023

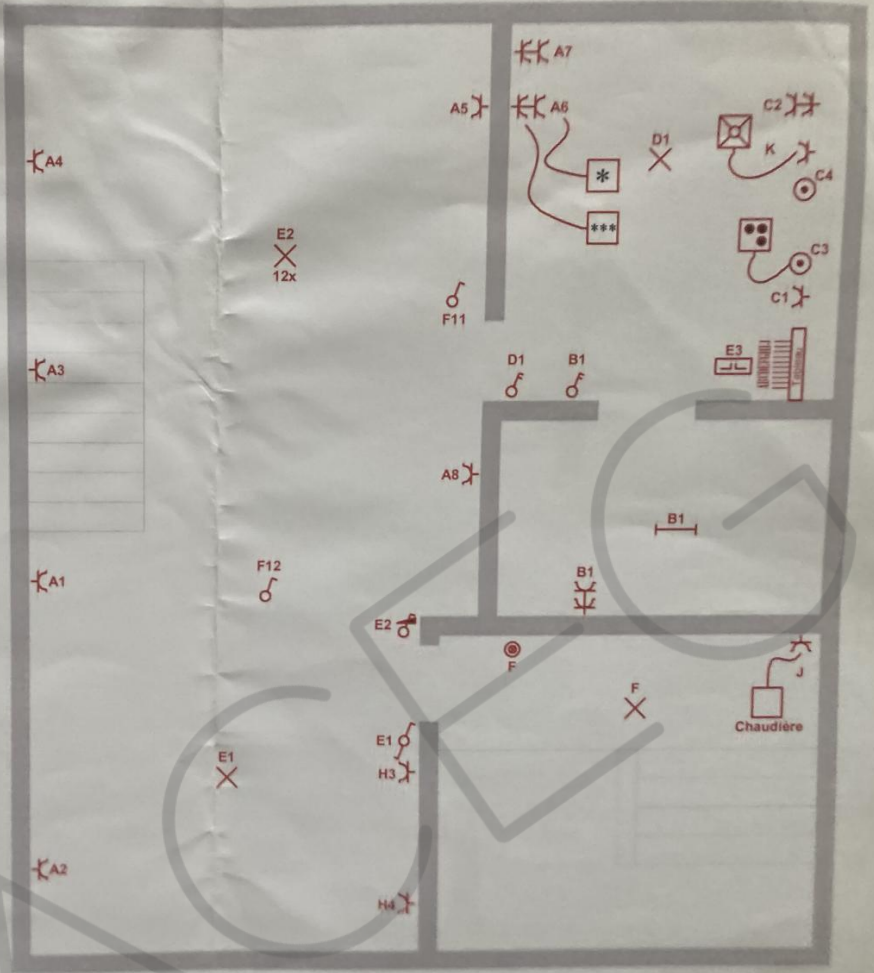



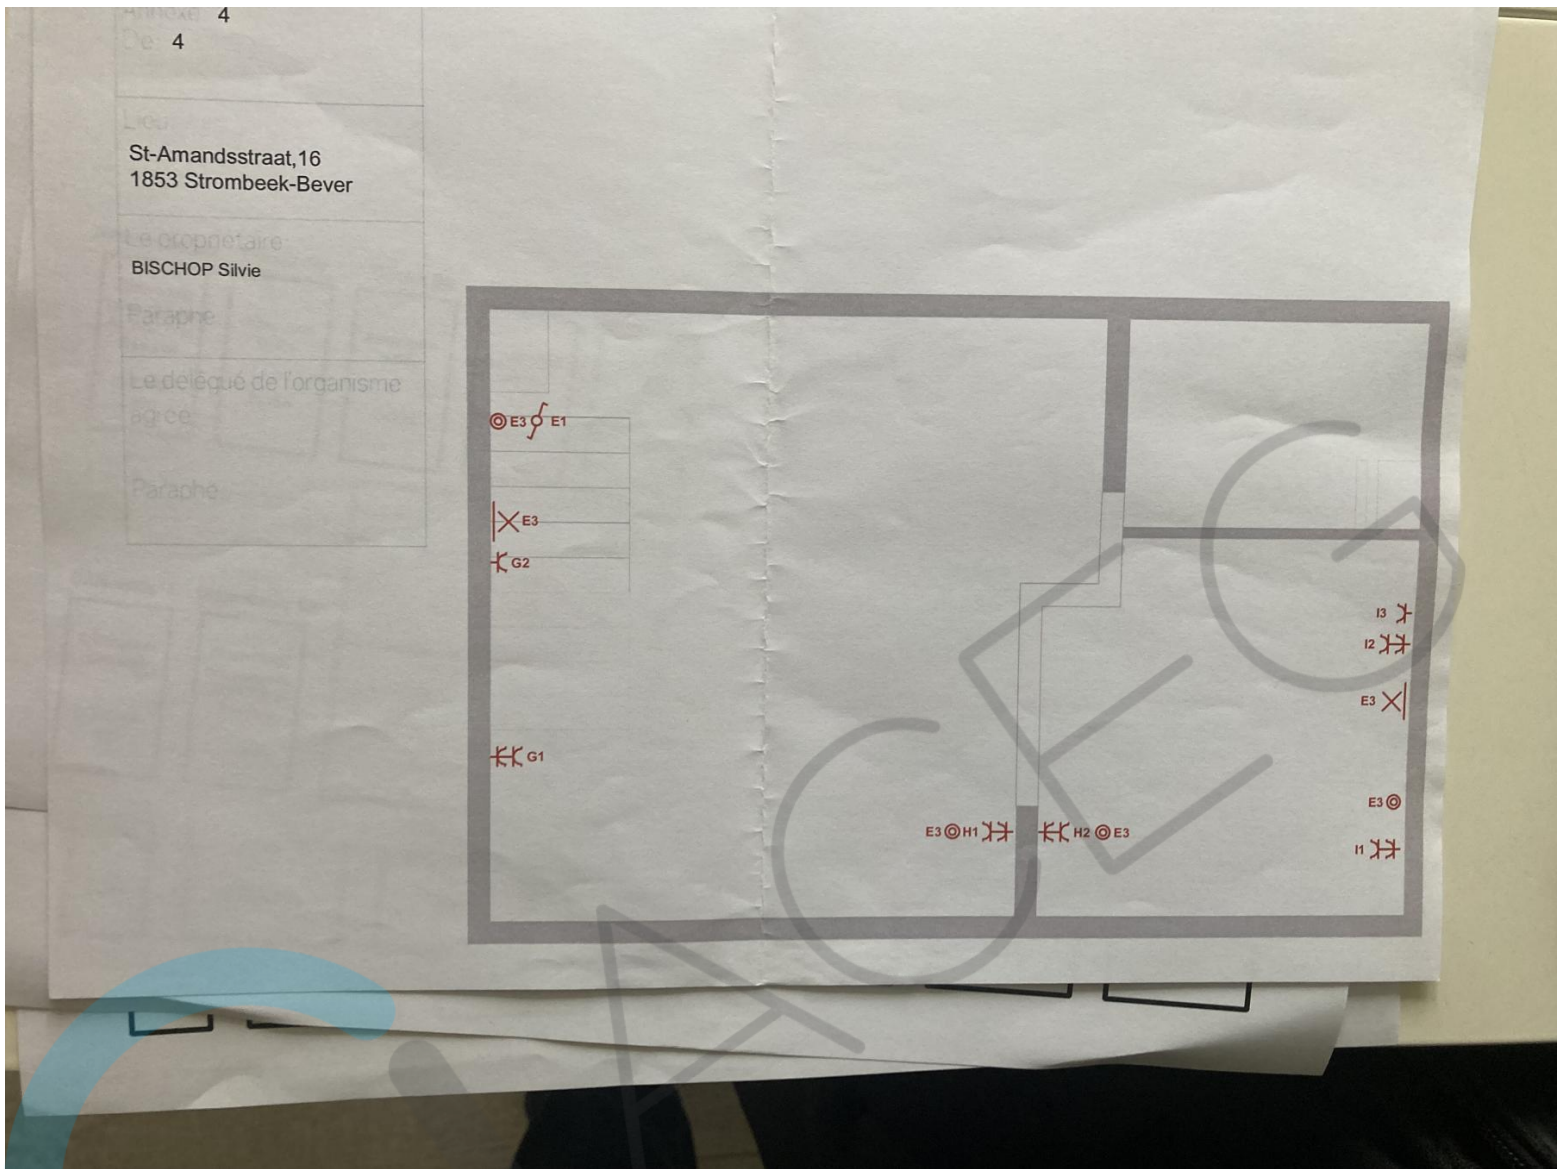

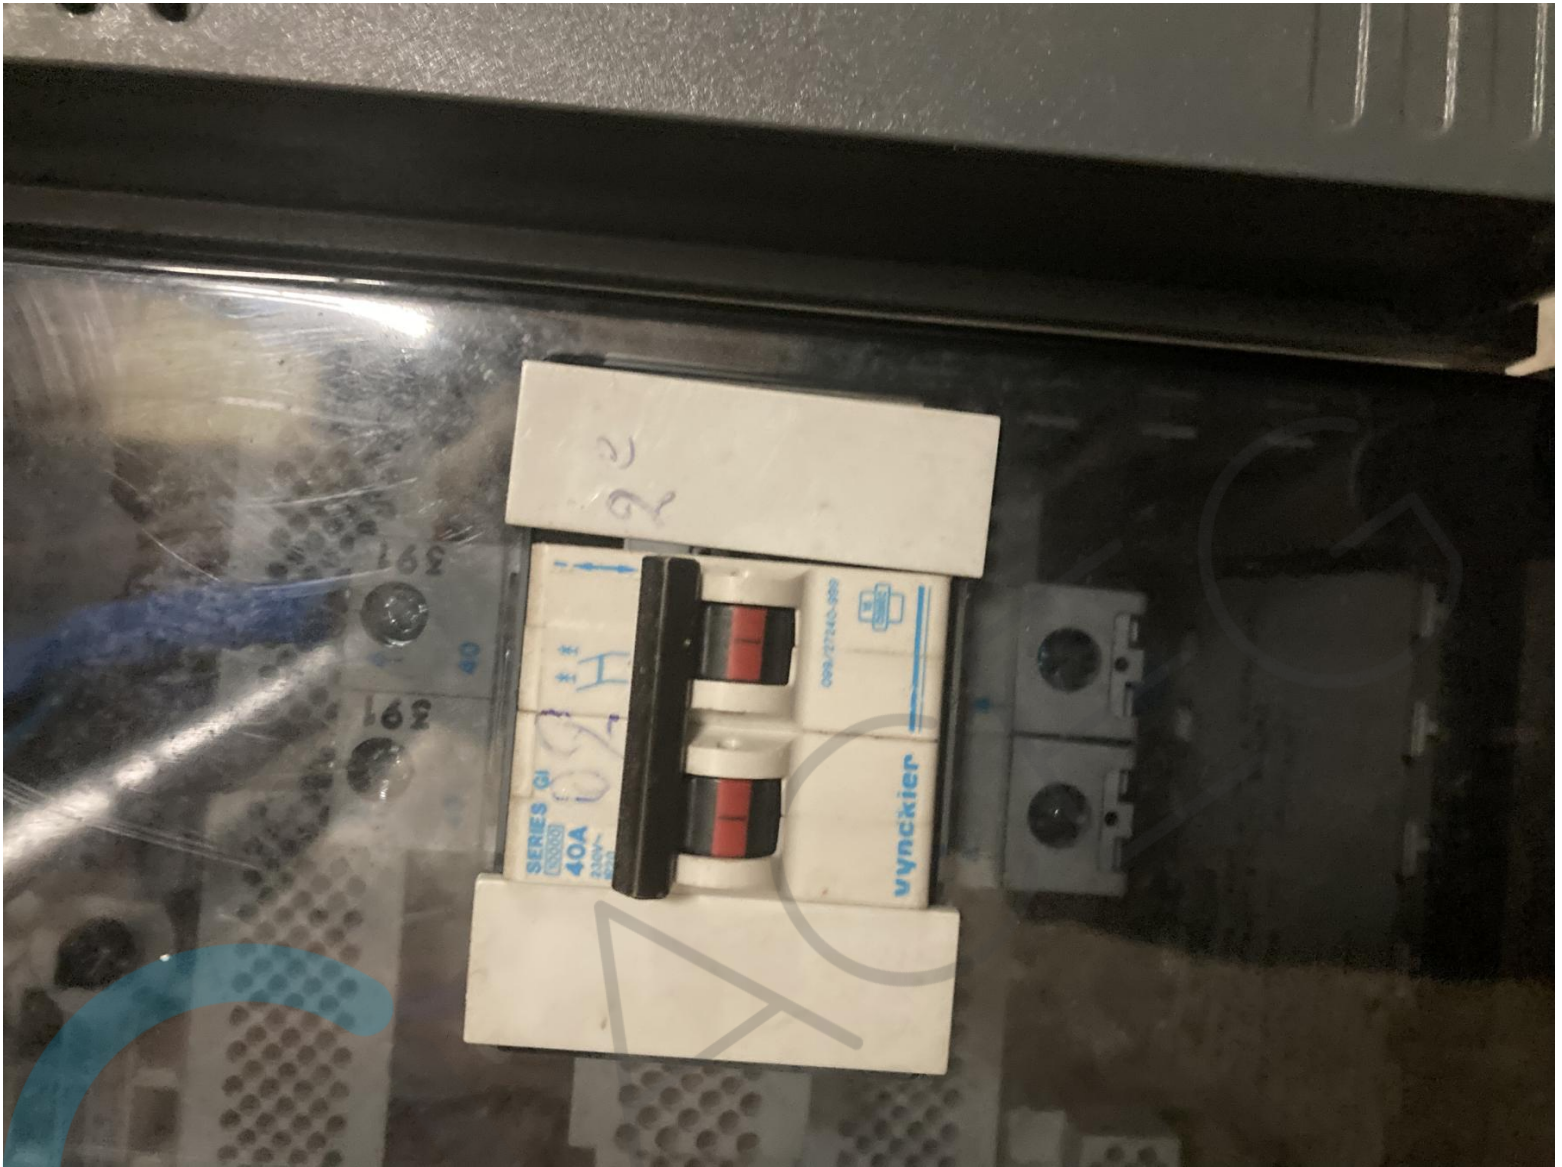


St-Amandsstraat 16
1853 Strombeek-Bever


L'installateur Pour l'organisme de contrôle agréé Le propriétaire

Nom Nom Nom BISCHOP Silvio
 TVA (ou n° CI + catel) Adresse St-Amandsstraat 16
 Signature Signature Signature
 Date Date Date

Nombre d'annexes: 1

QACEG 113
Wesley Carels
 15/3/24

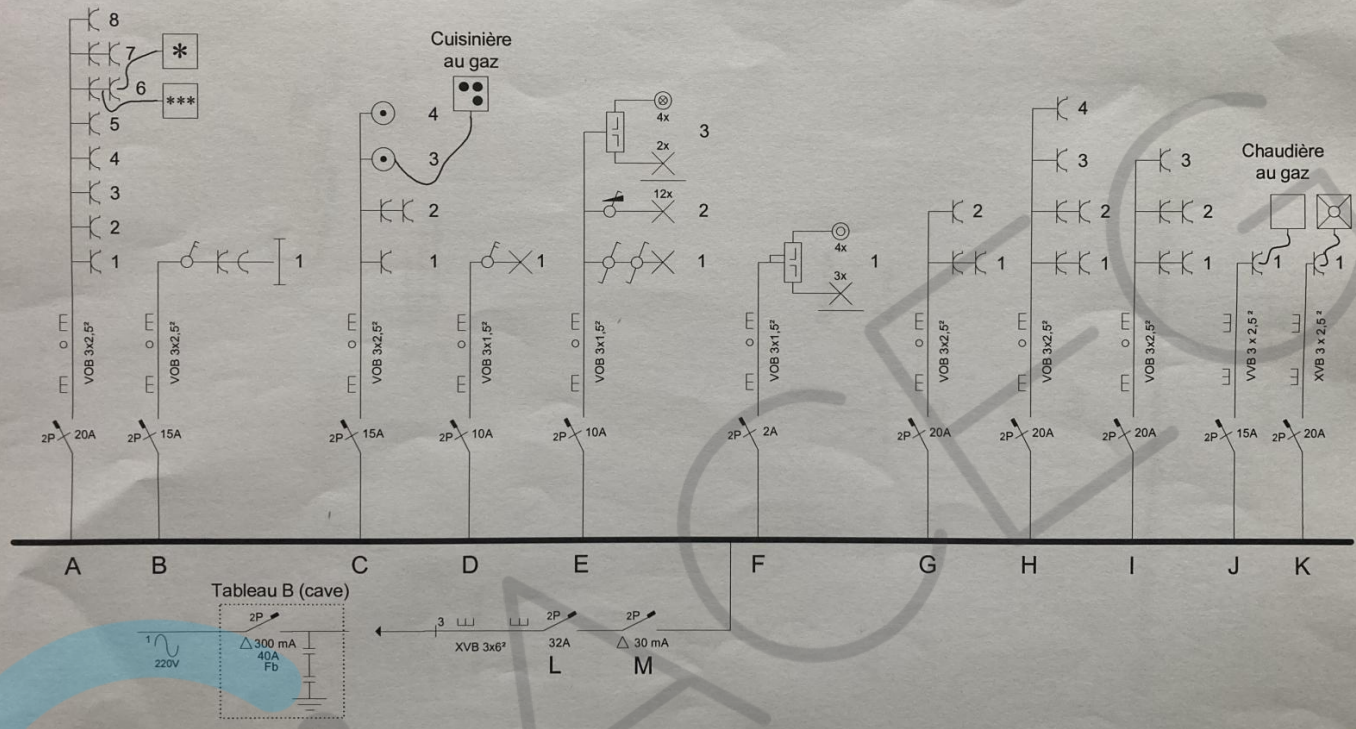

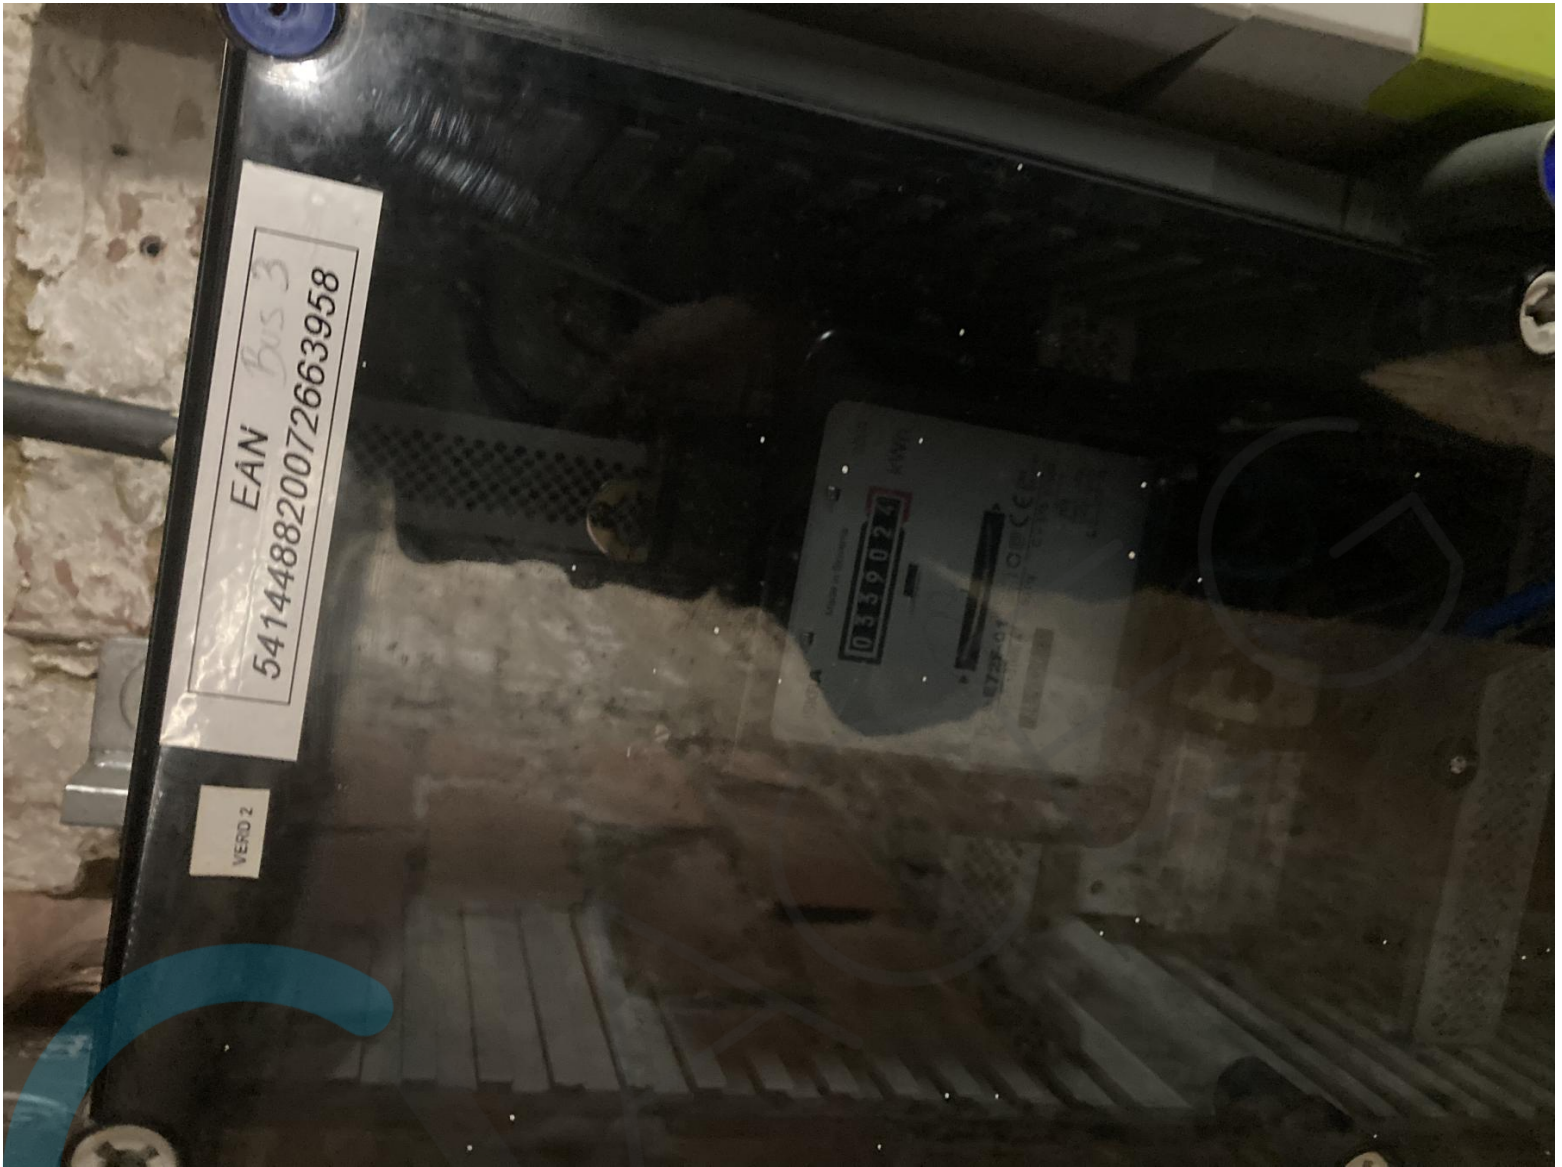



Handwritten date: 15/12/24 and a signature.

St-Amendstraat 16
1853 Strombeek-Bover

Le propriétaire
Nom: BISCHOP Silvio
Adresse: St-Amendstraat 16
1853 Strombeek-Bover

Signature and Date fields for the owner.

Adresse de l'installateur
St-Amendstraat 16
1853 Strombeek-Bover

L'installateur
Nom: [blank]
TVA (ou n° CI + date): [blank]

Signature and Date fields for the installer.

Nombre d'annexes: 1

