



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 04/07/2023	Inspecteur: Vincent Dehaes	Mentor:	Installateur: Quentin l'electricien
Étiquette d'identification: Maison	N° TVA:BE 0839 069 497	Référence client:	
Marque et type d'appareil de mesure: Metrel MI 3102 BT	Numéro de serie: 23021777		
Date rapport: 04/07/2023			

Adresse de l'installation		Propriétaire	
Rue	Avenue Clays	Nom	Pemois-Pollet
Numéro	77	Rue	Avenue Clays
Boîte		Numéro	77
Postcode	1030	Boîte	
Commune	Schaerbeek	Postcode	1030
Pays	Belgique	Commune	Schaerbeek
		Pays	Belgique

		Installateur	
		Nom	Quentin l'electricien
		N° TVA	BE 0839 069 497
		Numéro de téléphone	0494657287
		E-mail	Info@quentinlelectricien.be

Type : maison	EAN : 54	N° compteur : 6118206
----------------------	-----------------	------------------------------

☒ Non communiqué

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Visite de contrôle d'une installation domestique selon(AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.

Distributeur: SIBELGA

Tension: 3~230V

Liaison comp / tableau: 6 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 3

Nombre de circuits: 15+4+4


Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 1,5 MΩ

RE: 24 Ω

OK

OK

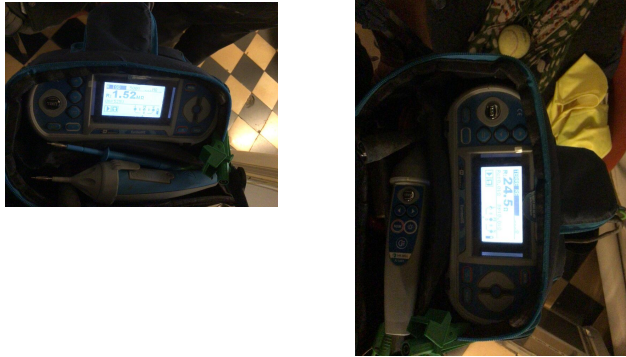

DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

Δ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I _{Δt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl	NA		
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

- nota/note 2 Aucune infraction .
- nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.
- nota/note 28 Selon RGIE livre 1 section 8.2.1. , les prises sans broche de terre peuvent rester en service. A ces endroits, seuls les appareils de classe 2 sont autorisés.
- nota/note 5 L'éclairage n'est pas définitivement installé.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 4/7/2048
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s): 3

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Vincent Dehaes

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
 - Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
 - Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.
- Qualité**
- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
 - Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 4/7/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.



