

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 09/11/2023 Inspecteur: Robin Dardenne Mentor: Installateur: MR Solar.

Étiquette d'identification: Bertholet Justin

N° TVA:BE 0842 496 864

Référence client:

Marque et type d'appareil de mesure:
Metrel MI 3102 BT

Numéro de serie: 23120903

Date rapport: 10/11/2023

Ce rapport remplace le rapport avec le numéro de rapport 1331302

Adresse de l'installation

Rue Rue des Pages
Numéro 13e
Boîte
Postcode 4210
Commune Burdinne Marneffe
Pays Belgique

Propriétaire

Nom Bertholet Justin
Rue Rue des Pages
Numéro 13e
Boîte
Postcode 4210
Commune Burdinne Marneffe
Pays Belgique

Installateur

Nom MR Solar.
N° TVA BE 0842 496 864
Numéro de téléphone +32 56 90 00 00
E-mail administratie@mrgroup.be

Type : Installation PV et/ou une batterie domestique

EAN : 541456700003547290

N° compteur : 91 752 084

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une installation PV $\leq 10\text{kVA}$ et/ou une batterie domestique (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3. et 7.112. et synergid C10/11.

L'installation a-t-elle été entamée avant le 01/06/2023? Non

Distributeur: RESA

Tension: 1N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 2

Prise de terre: Boucle

Ri général: 13.58 MΩ

RE: 7.44 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I _t	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Gehele installatie	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	40	Rem	2	6
1	C	25	Pv 1	2	4


Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl		NA	
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	OK	Fonctionnement en ilotage	OK

FORMULAIRE GRD-CWAPE

Meter type: Compteur magnétique


MAGNETIC METER

Jour: Index: 032091.1

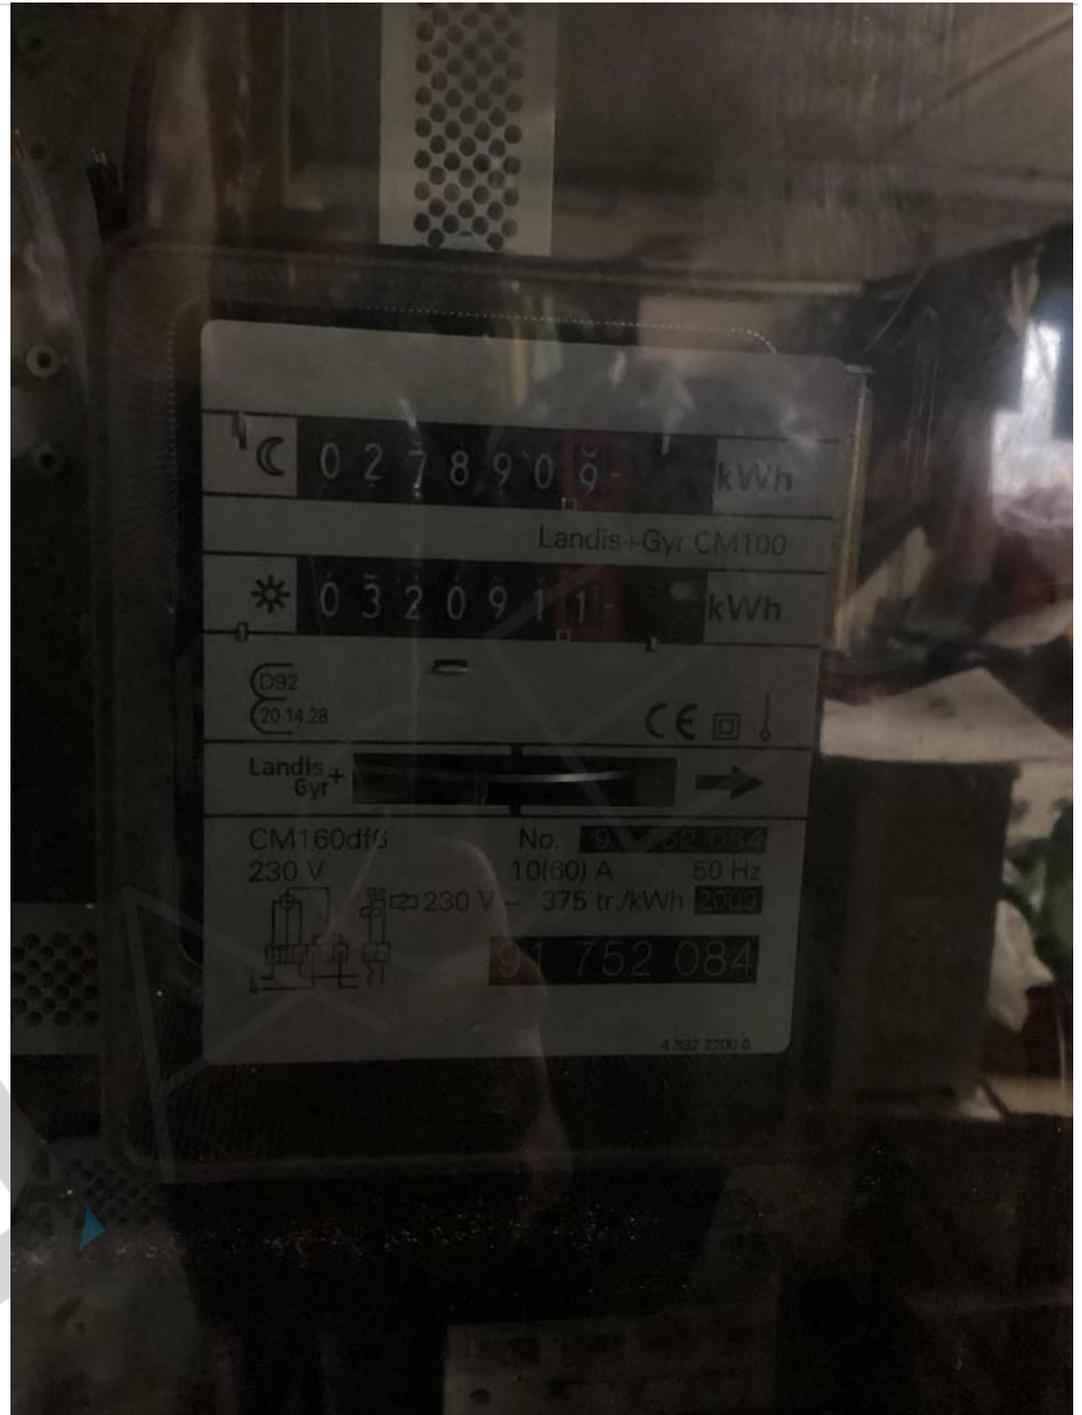

Nuit: Index: 027890.9

Excl. Nuit: Index: -

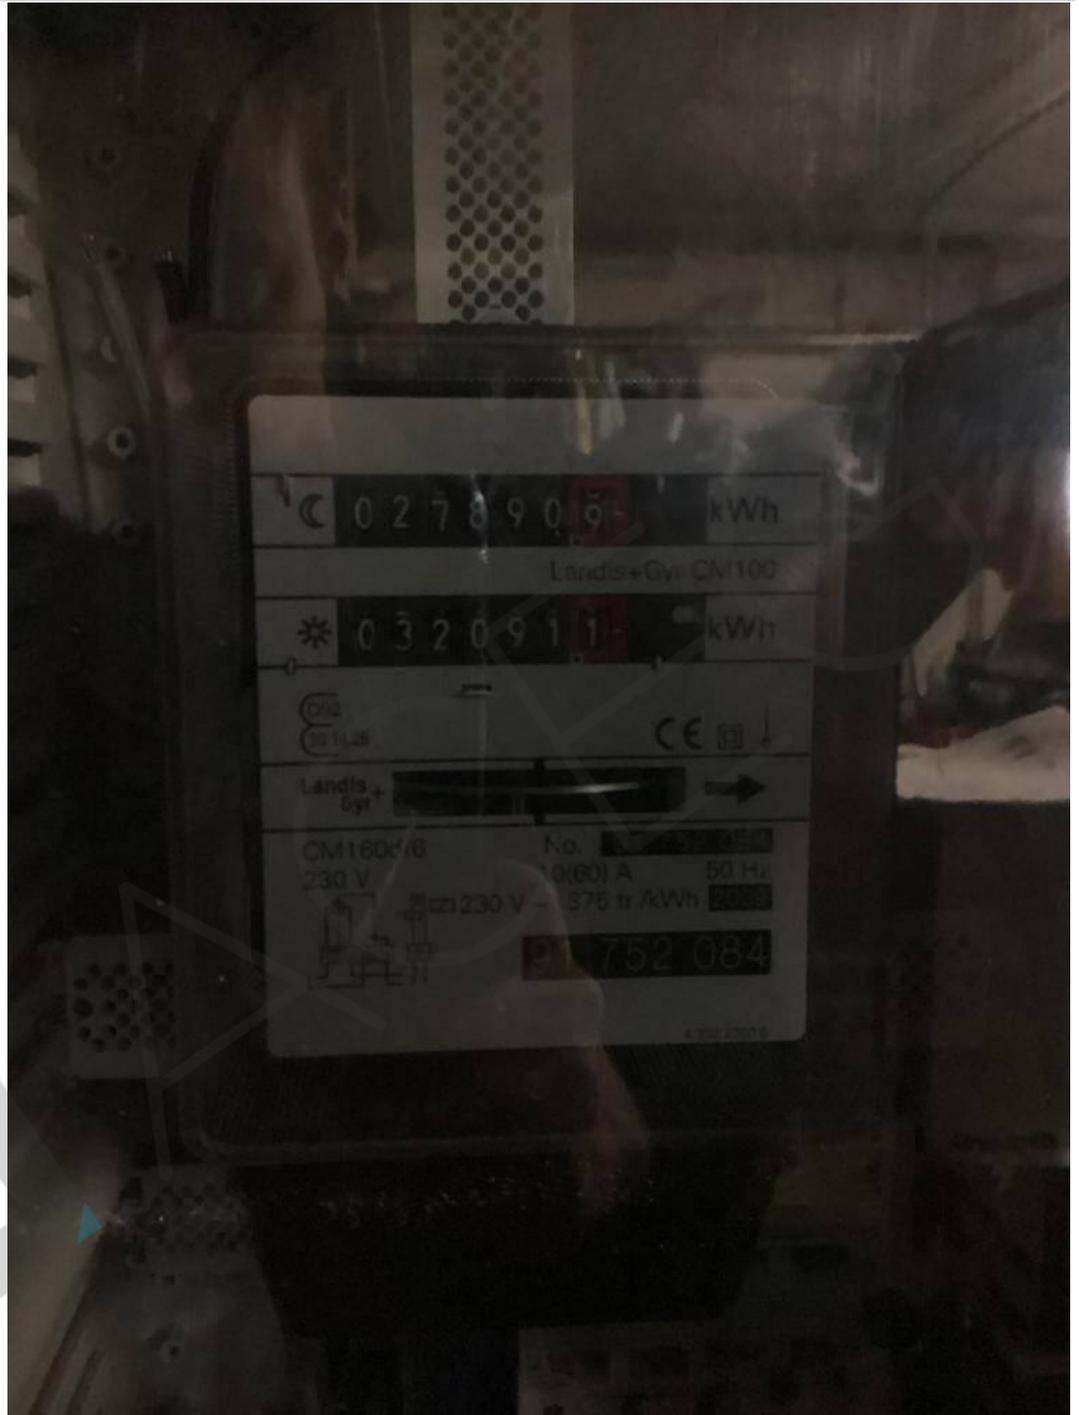

COMPTEUR VERT

Phase	N° série	Affichage du compteur	CE marquage	MID marquage
-------	----------	-----------------------	-------------	--------------

ONDULEUR

Nombre: 1	Series: SUN2000	Type: 4KTL-L1	Raccordement: 1-phase
Marque: HUAWEI	Smax (VA): 4400	I AC - nom (A): 19.13	Convient pour le stockage de la batterie: Oui
Numéro de serie: TA22801179355	IN (A): 25	UDC Max > UDC panelen/string: BON	IDC Max > I str1 + Istr2 + ...: BON
Courbe: C			

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE

Nombre	Marque	Type	Puissance de crête (Wc)	Puissance de crête totale (Wc)
12	Stern	FB	415	4980

BATTERIE DOMESTIQUE

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 2 Aucune infraction .
 nota/note 6 Cette inspection ne comprend que le système PV .

CONCLUSION

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 9/11/2048
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s): 12

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Robin Dardenne



Robin Dardenne
 ACEG VZW - #363

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité


- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:


Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 9/11/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

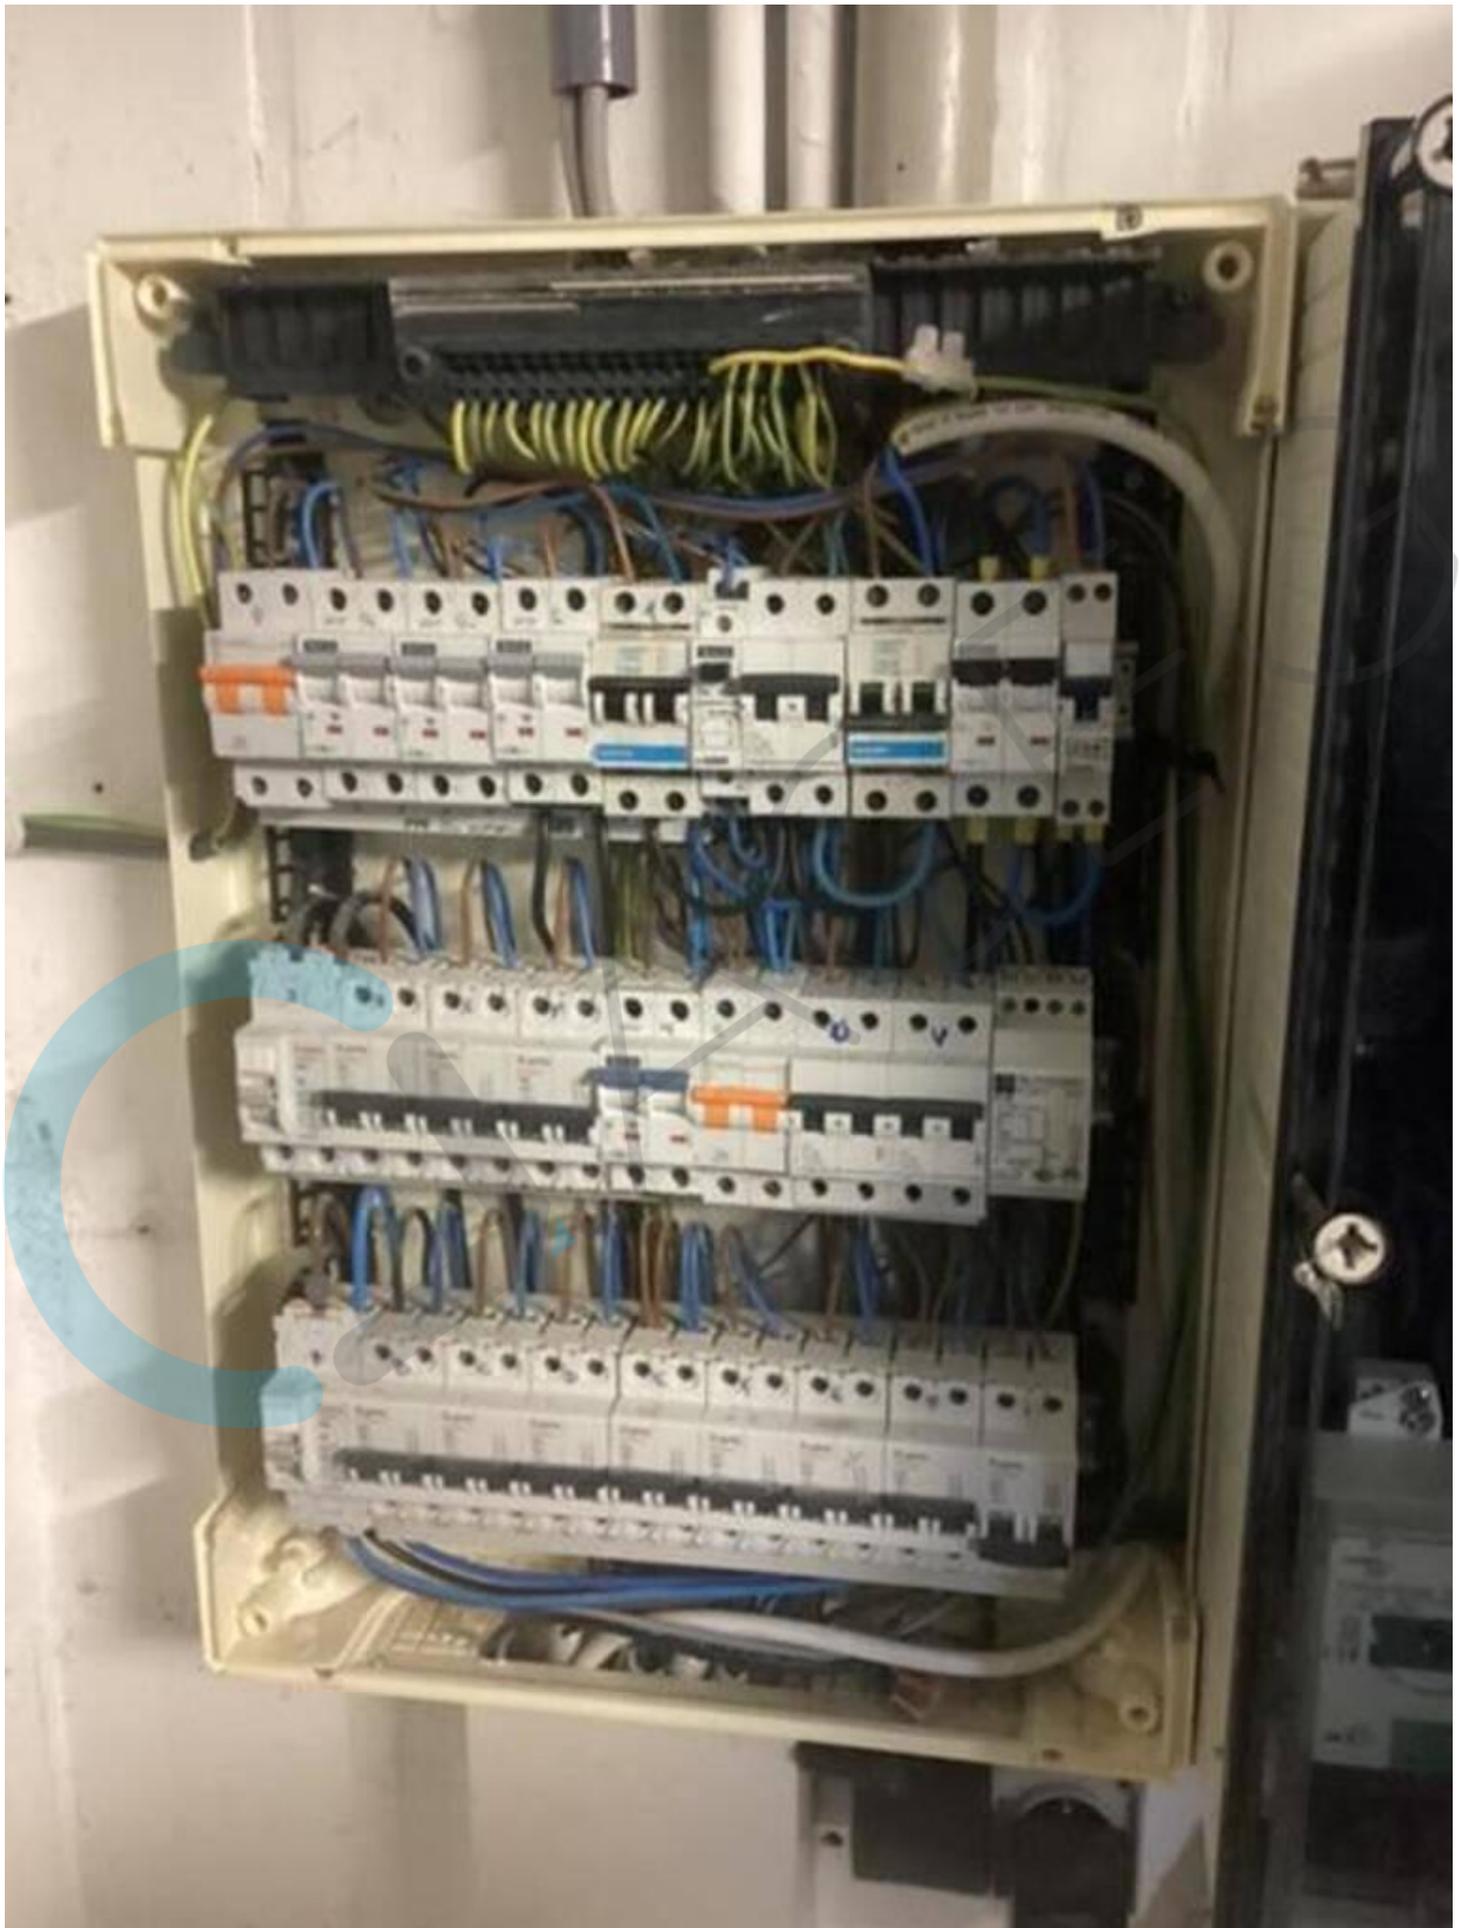







Lokaal Gorge


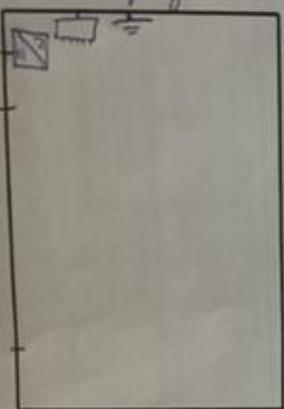



Lokaal _____




Dak _____



Naam School organisatie 	Ingebruik afgeleverd door <u>Van der Pijper 13E</u> <u>Elis Buijsse</u>	Verenigde aflevering 	 <small>MR</small>	Vereniging 224 2170 Merksom
<small>Bevestigingsnummer</small> <u>51103</u>	<small>Naam</small> <u>John Buitalet</u>	<small>Vereniging</small> 	<small>Vereniging</small> 	<small>Vereniging</small> 

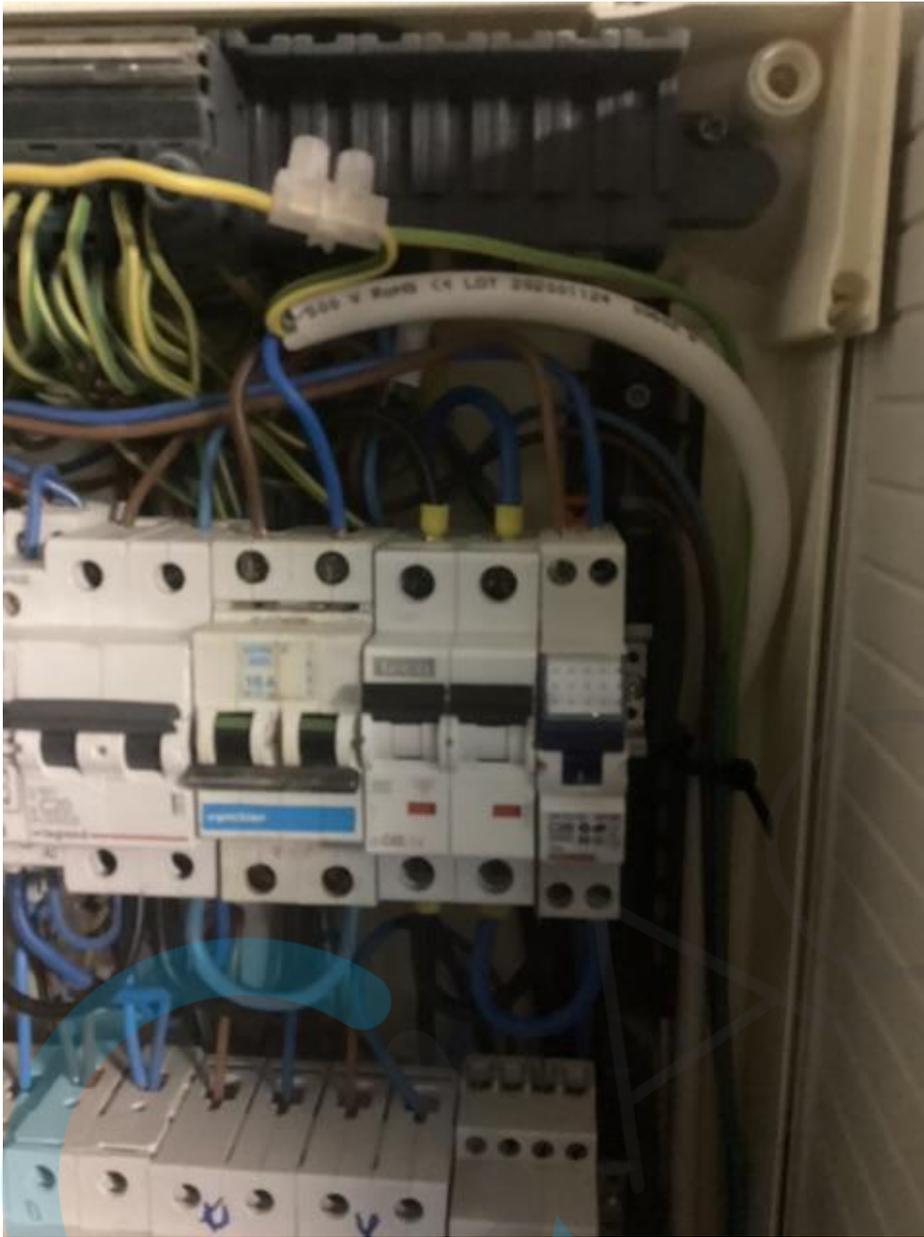


EEG

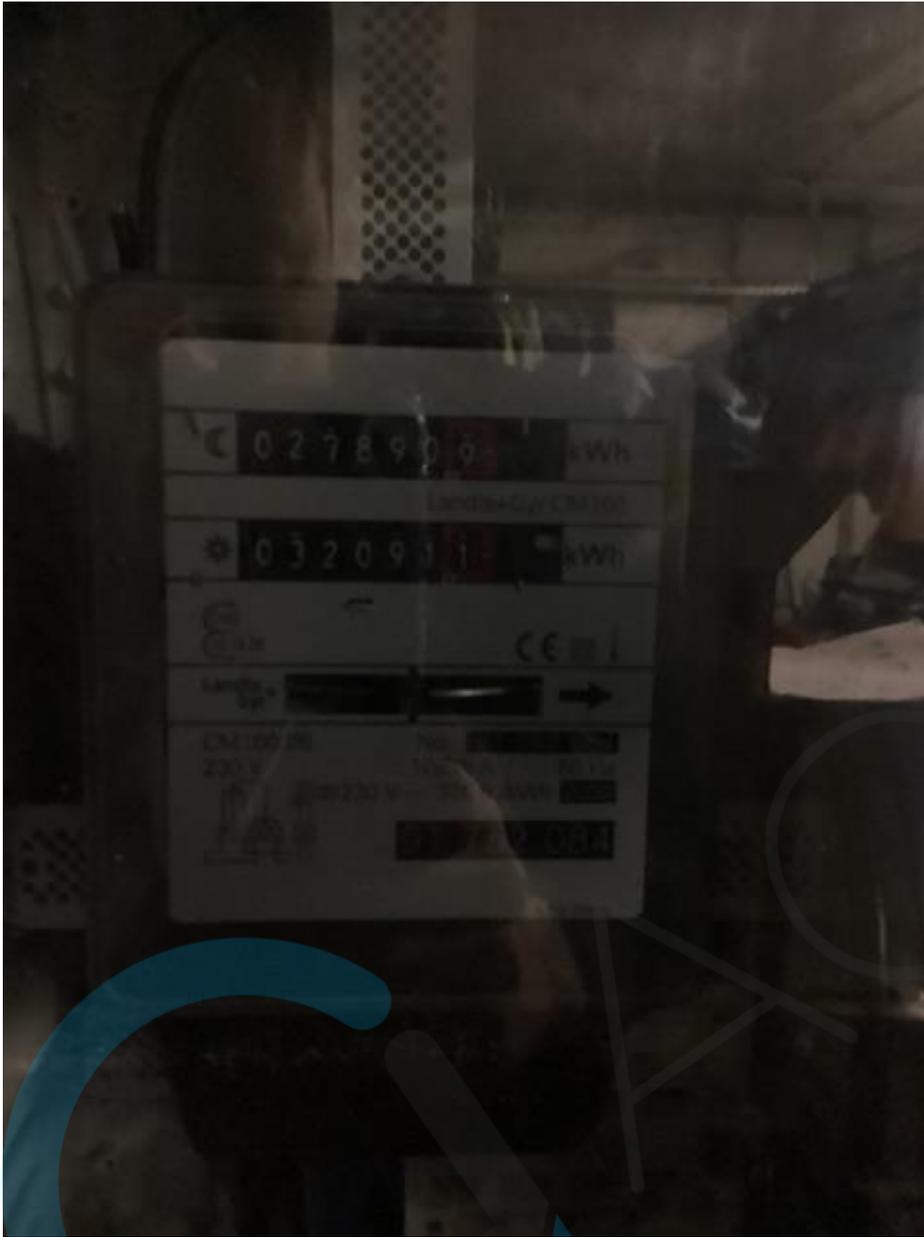








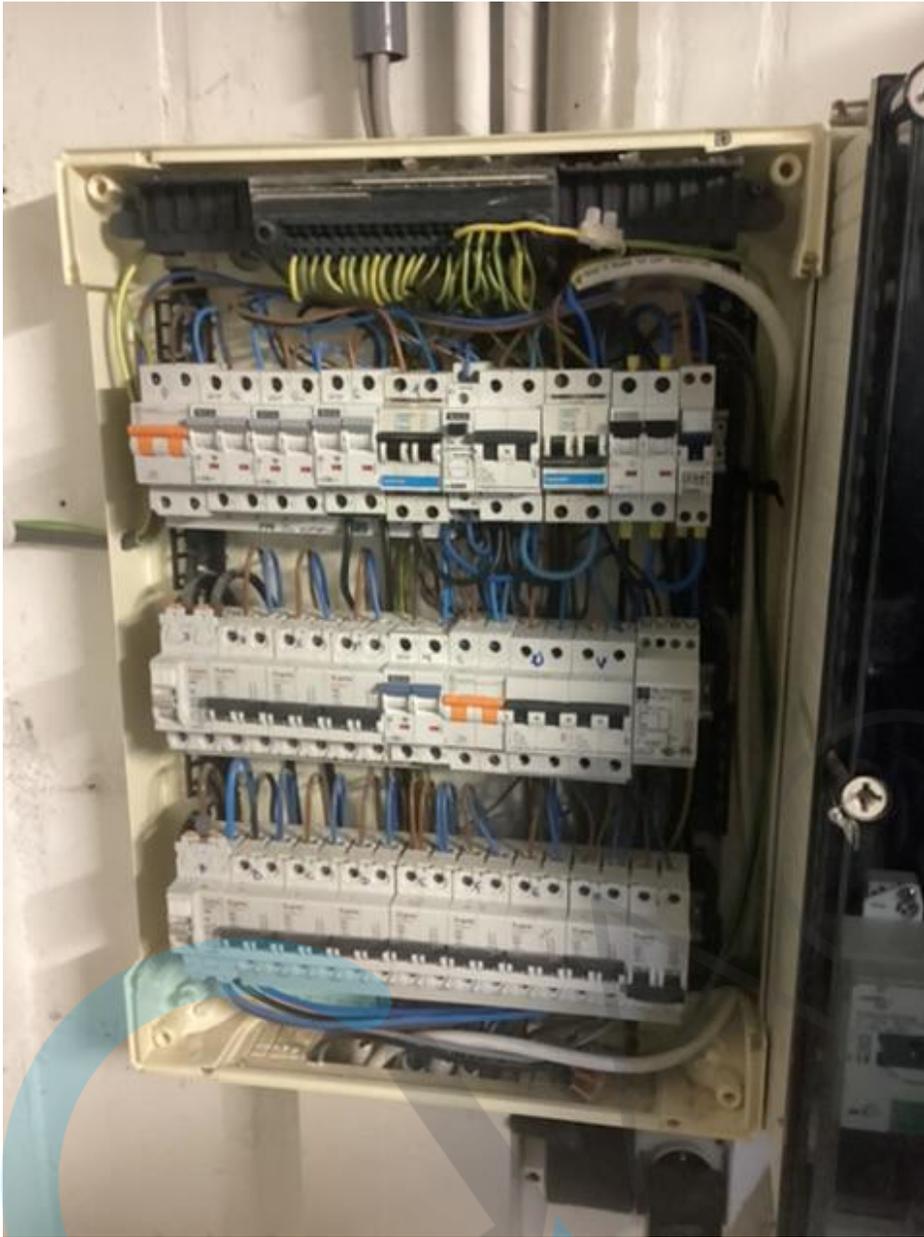










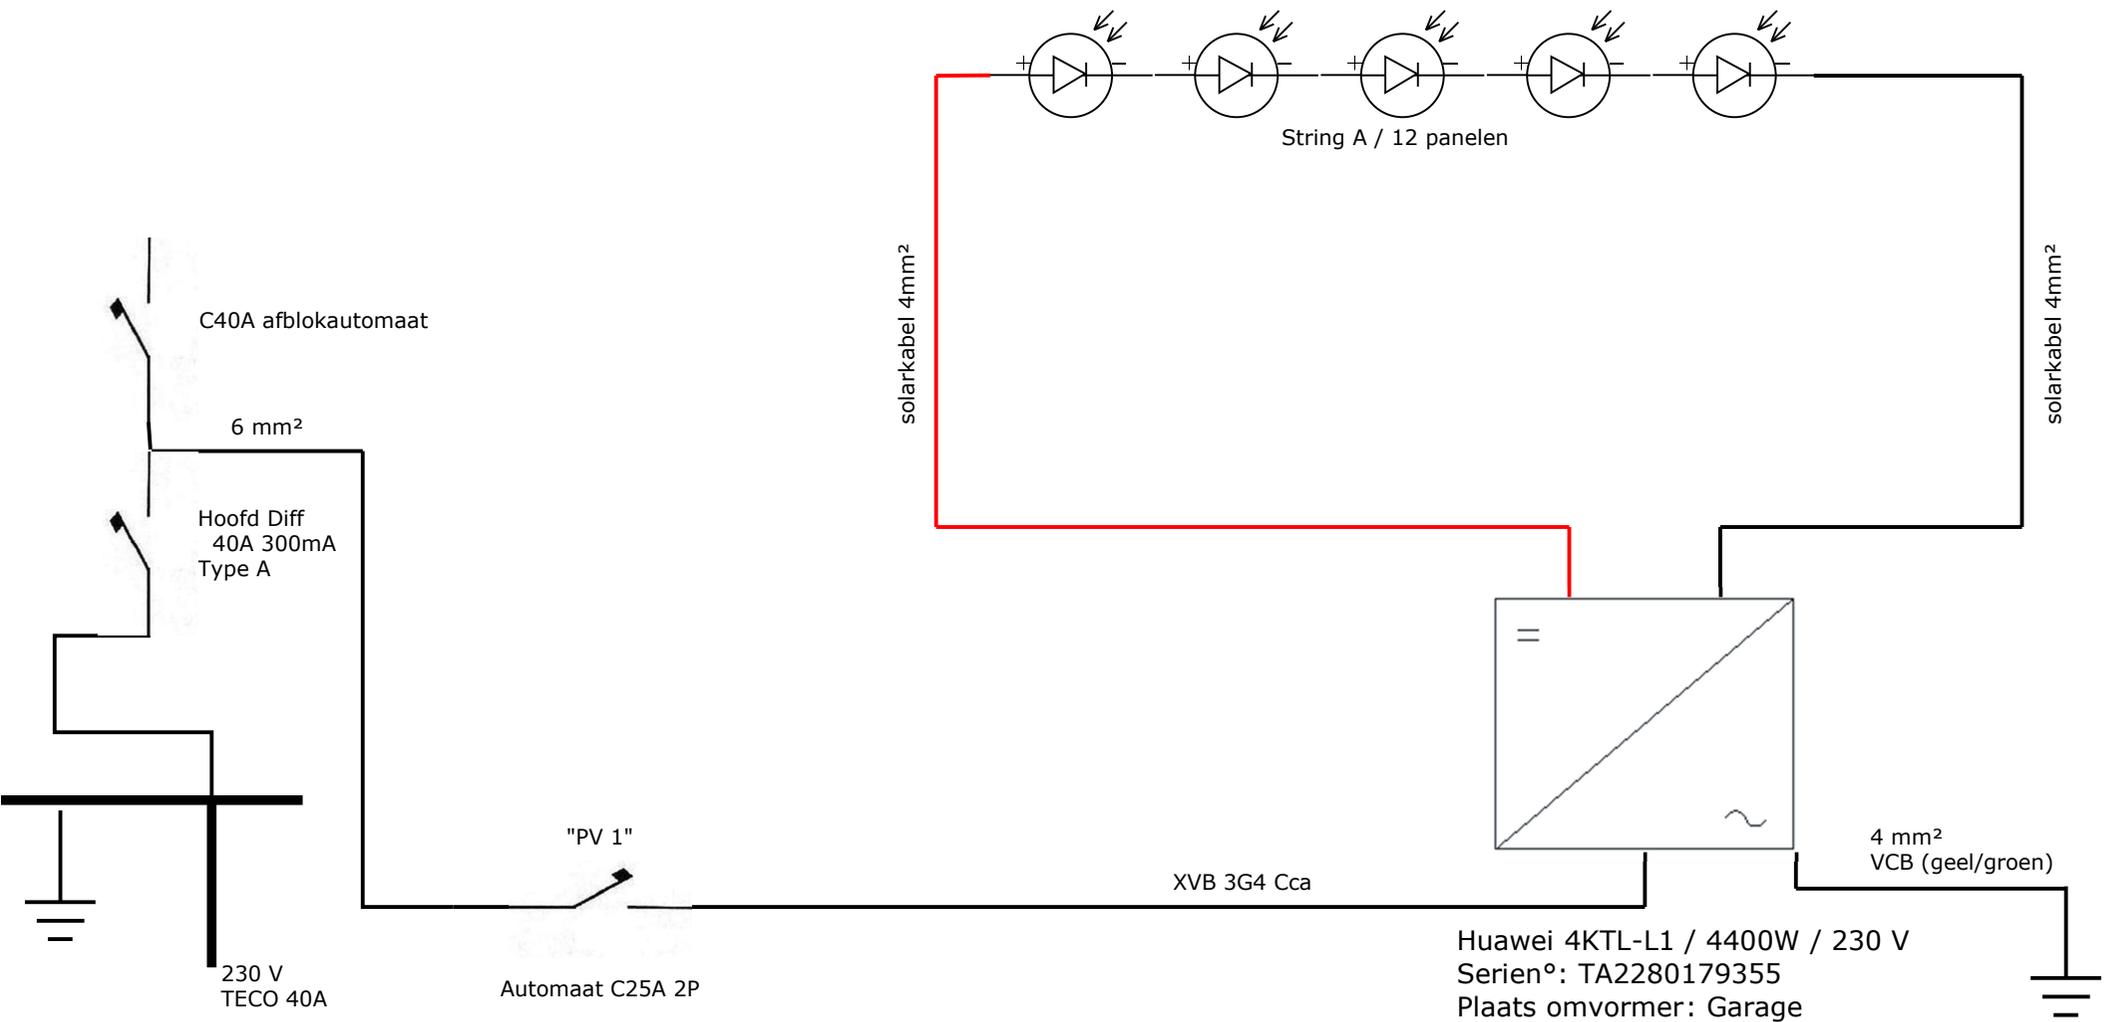

<p>Afgev. Erkend organisme</p> <p>363</p>	<p>Installatie adres: Rue des Pages 13e 4210 Burdinne Marneffe</p>	<p>Verantw.uitvoering</p>	<p>Pluim 7 8550 Zwevegem</p>
<p>Robijn Dardenne 10/11/2023</p>	<p>Klant: Justin Bertholet justin.bertholet@live.be Mobile +32 498 40 40 41</p>	<p>Verantw. MR solar: 056 90 00 00</p> <p>MR GROUP De Pluim 7 8550 Zwevegem info@mrgroup.be - 056/90 00 00 BE0842 498 864 SOLAR + HVAC</p>	<p>12 x 415WP Stern Full Black Huawei 4KTL-L1 / 4400W / 230 V EAN: 541456700003547290 Netsp.: 230 V</p>
