

Resp. client:
N° commande.
N° client: 141516
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: cojasonth@gmail.com



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS18
N° rapport : 6331347-002-+1
N° rapp. prov.:
Date: 24/09/2024

Client / Mandant :
COEMOTH JASON
RUE HENRI LAMBLLOT 15
6591 MACON

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 541 GOUDESEUNE PATRICK
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: DELENNE JACQUES Adresse: RUE DU GOUTY 14
6440 FROIDCHAPELLE
Installat. / respons. travaux: Nom: COEMOTH JASON Adresse: RUE HENRI LAMBLLOT 15
6591 MACON T.V.A.: BE0721673268
Adresse installation: DELENNE JACQUES RUE DU GOUTY 16A2 +1 Cabine HT - privée: NON
FROIDCHAPELLE 6440
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:
EAN nr.: 542501390000xxxxxx Gestionn. Rés.: AIESH Compteur: à placer Compteur nuit :

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4)
Kies een item.
Date installation: avant 01/10/1981 entre 01/10/1981 et 01/06/2020 entre 01/06/2020 et 01/06/2023 dès 01/06/2023
Dérogations: partie 8 du livre 1: pas d'appl. et point 1 du sous-section 6.5.8.1: pas d'appl.
Date: 24/09/2024 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 30/09/2049

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente Raccordement: réseau aérien Fourreau: - Plaque d'isolat.: présente
Tension nominale: 3N400V Protection max.: 40A Protection princip.: aut. 4p Interr. princip.: interr. diff. général
40A
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: XVB nombre conduct.: 4 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 25 mm²
Prise de terre genre: commune accessibilité: en ordre - sectionn.de terre commune est accessible
Électrode de terre: type: boucle section: 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA supplémentaire: 4p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe références:
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre État du matériel fixe ou - à pose fixe: en ordre
Installations spéciaux: photovoltaïque piscine sauna aliment. véhic. électrique -
Ne sont pas encore cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau
placés: luminaires principale - supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 16

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 6 MOhm Résistance de dispersion: 20 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

1/2

N	Néant
I	Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**. Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.


Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRESLisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

Installation contrôlée par
 Agent 541
 Mr Patrick Goudeseune
 0493.246.121
 Date 24/09/2024
 Rapport N° 6331347
 Signature


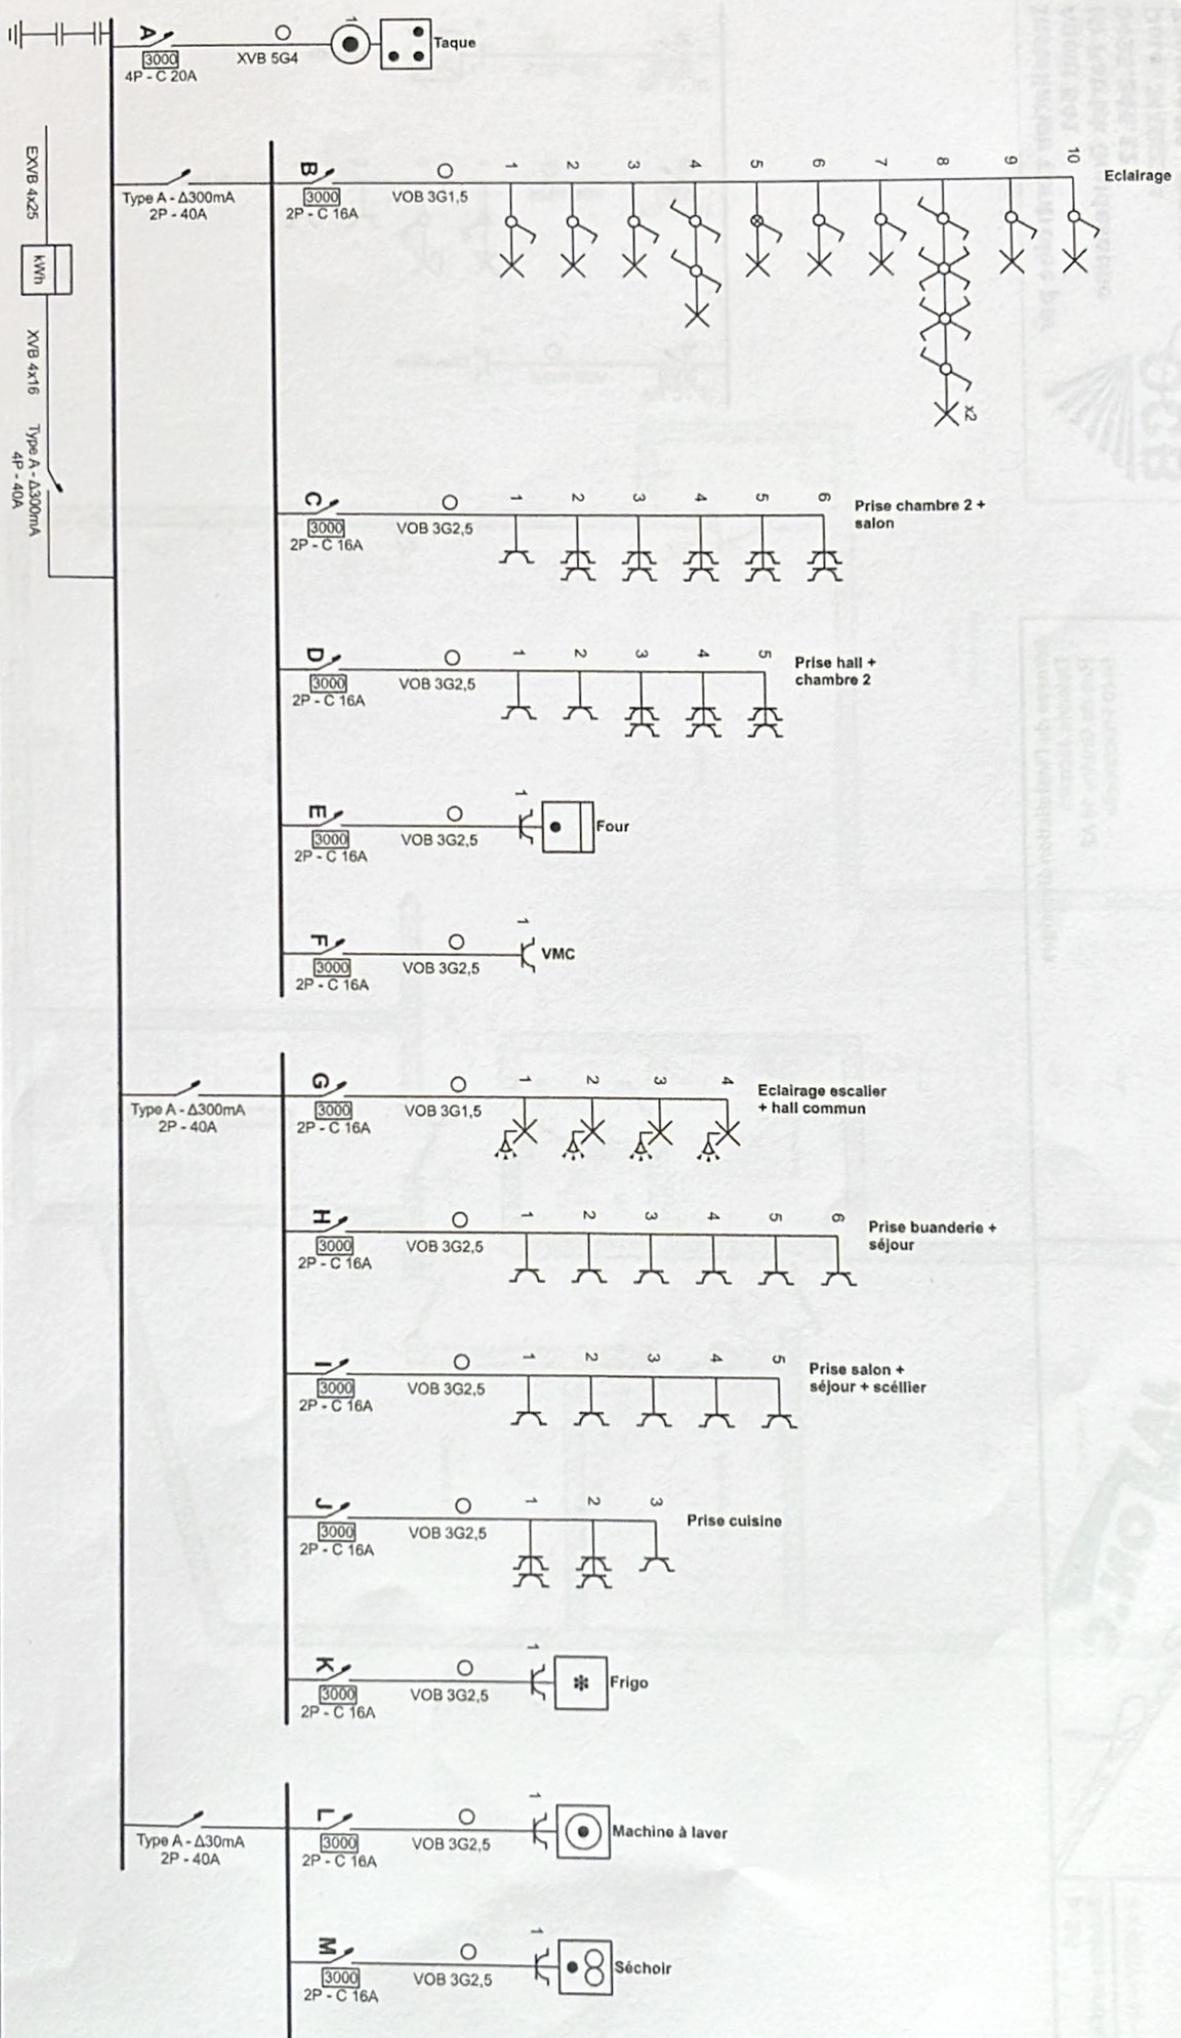


Adresse de l'installation électrique
 Delienne Jacques
 Rue du Gouthy 16 A2
 6440 Frolichapelle

Schema dessiné par: Jason Coemth - TVA BE 0721.673.268



p. 1/5
 Schéma unifilaire
 3 x 400V + N ~ 50Hz

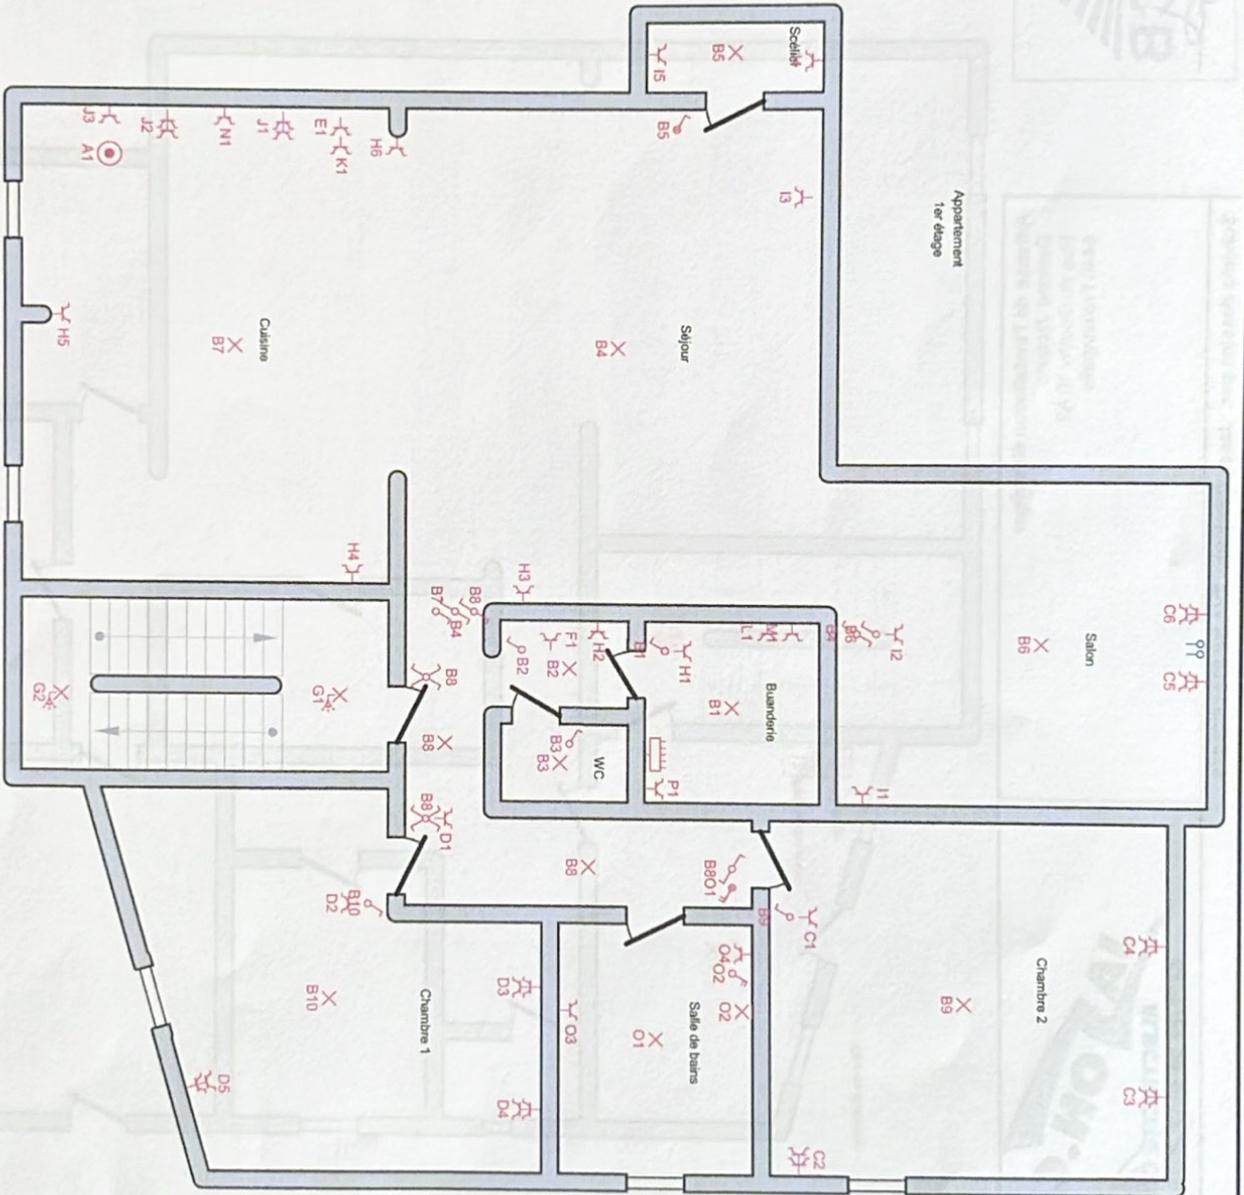

Installation contrôlée par
 Agent 541
 Mr Patrick Goudeseune
 0493.246.121
 Date 24/09/2024
 Rapport N° 6331347
 Signature




Adresse de l'installation électrique
 Delenne Jacques
 Rue du Gouthy 16 A2
 6440 Froichapelle

Schéma dessiné par: Jason Coemth - TVA BE 0721.673.268



P. 3/5
 Schéma de position
 3 x 400V + N - 50Hz

Installation contrôlée par
 Agent 541
 Mr Patrick Goudeseune
 0493.246.121
 Date 24/09/2024
 Rapport N° 6331347
 Signature

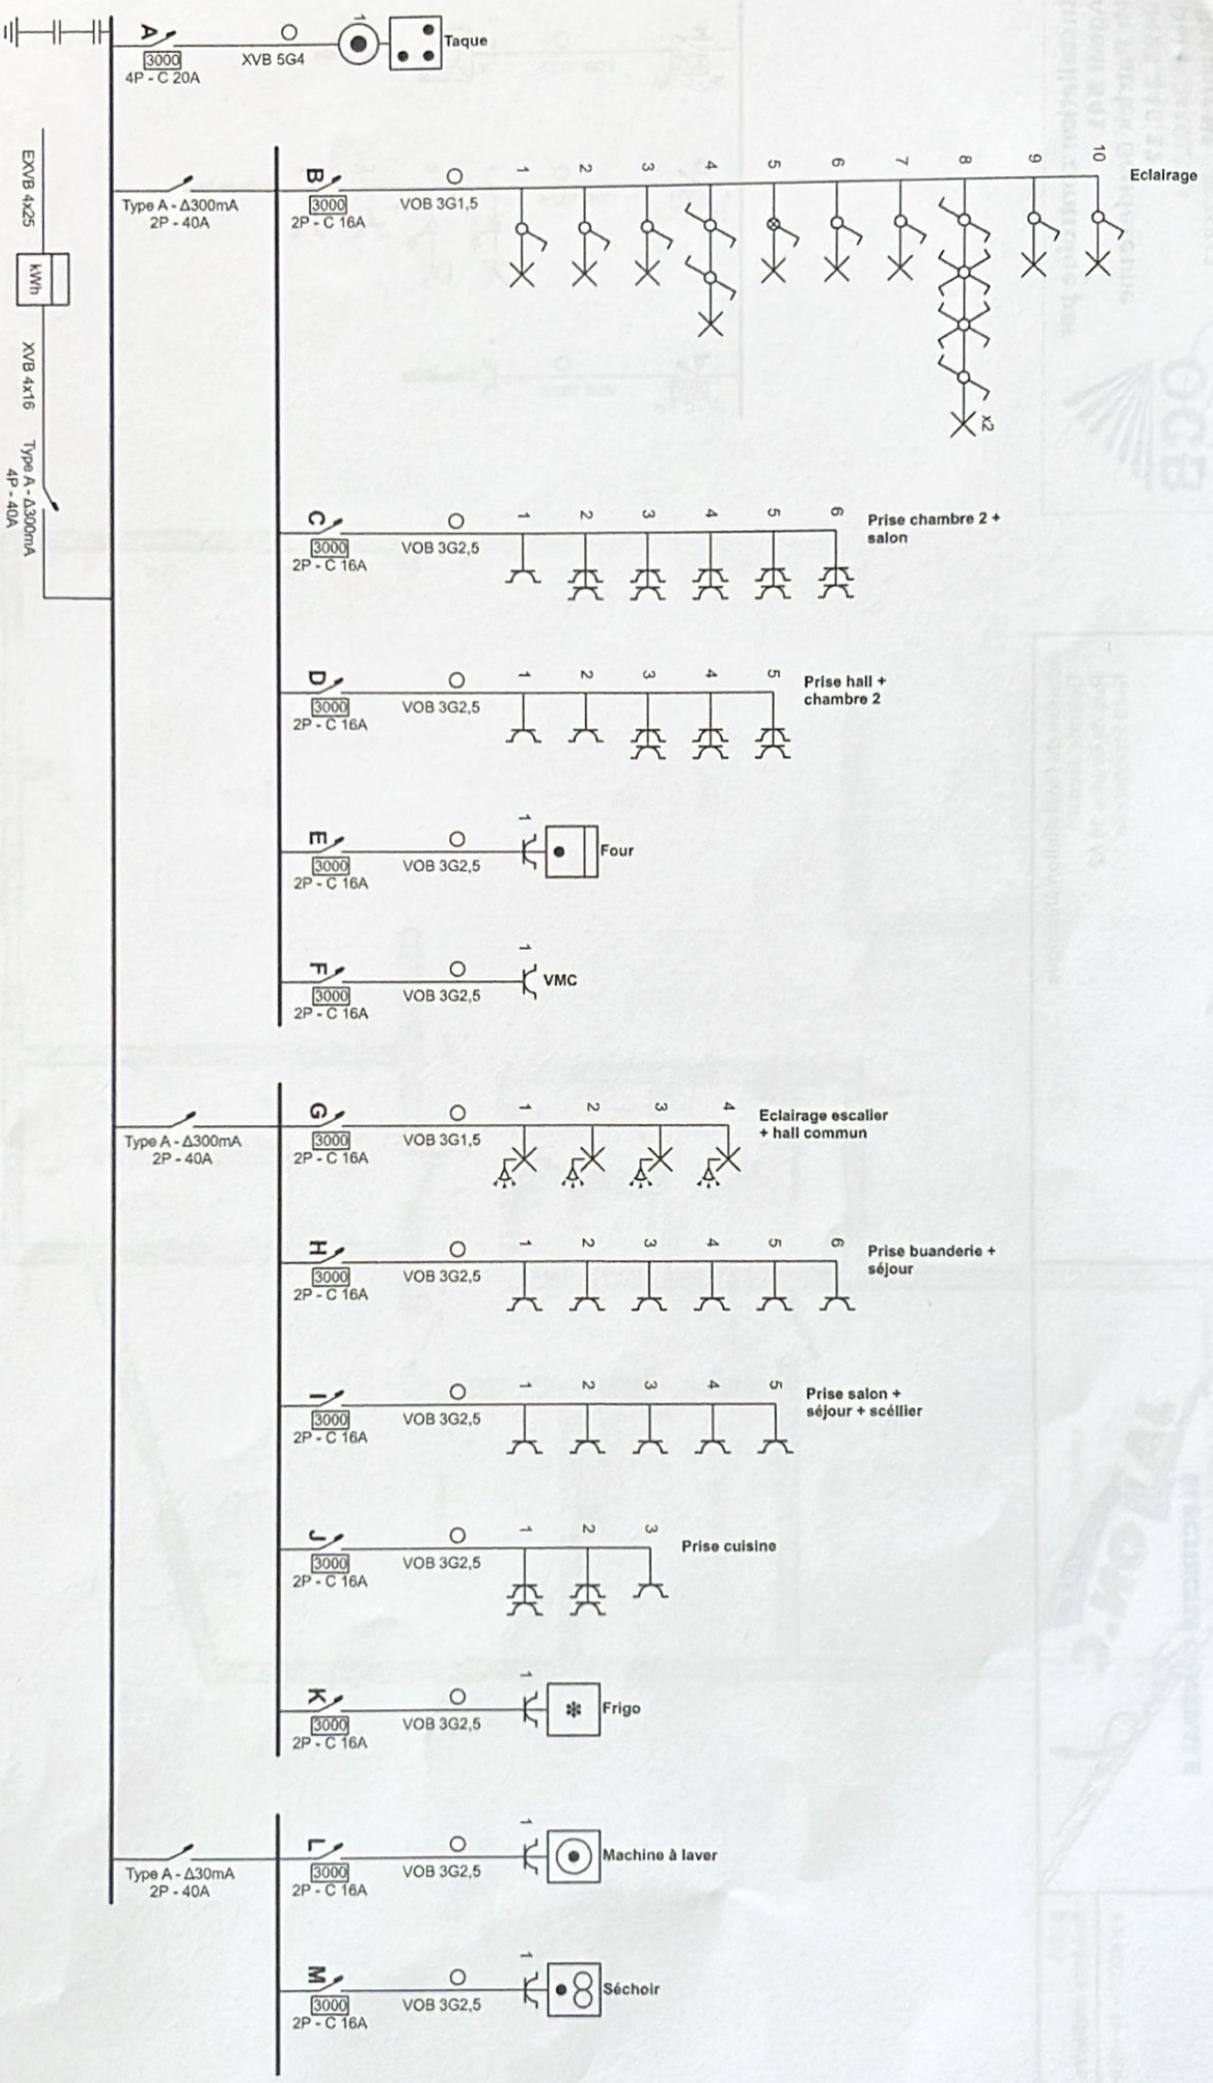

EXVB 4x25
 kWh
 XVB 4x16
 Type A - Δ300mA
 4P - 40A

Adresse de l'installation électrique
 Delenne Jacques
 Rue du Gouthy 16 A2
 6440 Froichappelle

p. 1/5
 Schéma unifilaire
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema dessiné par: Jason Coemont - TVA BE 0721.673.268




0477/07.20.50
 0493.246.121
 6331347
 24/09/2024



0477/07.20.50
 0493.246.121
 6331347
 24/09/2024



P. 215
 Schéma unifilaire
 3 x 400V + N ~ 50Hz

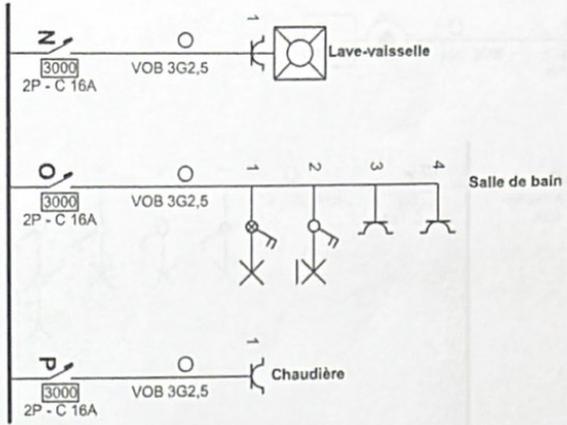

Installation contrôlée par

Agent 541
Mr Patrick Goudeseune

0493.246.121
Date 24/09/2024

Rapport N° 6331347
Signature



Adresse de l'installation électrique

Delenne Jacques
 Rue du Gouthy 16 A2
 6440 Frolichapelle

Schéma dessiné par: Jason Coemth - TVA BE 0721.673.268



0477/07.20.50
