Resp. client:
N° commande.
N° client: 146204
Pers.cont.: JACOB BENJAMIN
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0474/83.11.15
e-mail: benjamin.jacob.hesbaye@gmail.com

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 5591571
N° rapp. prov.:
Date: 01/04/2021

Client / Mandant :

JACOB BENJAMIN
RUE DE HUY 110A
4280 HANNUT

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 473 MOSBEUX ALEX
Propriét. / exploit./gestionn.: **Nom:** JACOB BENJAMIN **Adresse:** RUE DE HUY 110A HANNUT
Installat. / respons. traveaux: **Nom:** JACOB BENJAMIN **Adresse:** RUE DE HUY 110A HANNUT **T.V.A.:**
Adresse installation: JACOB BENJAMIN RUE DE HUY 110A HANNUT 4280 **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: Appartement 1 ETAGE **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: NF **Fournisseur:** RESA **Compteur:** 33937975 **Compteur nuit :** //////

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4) **Dérogat. partie 8 livre 1 *:** pas appliqué
(*) En cas contrôle chap. 6.4., référ. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Pas d'application
Date: 01/04/2021 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 30/04/2046 **Date installation:** après 01/06/2020

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** //// **Plaque d'isolat.:** ////
Tension nominal: 1N400V **Protection max.:** ///// **Protection princip.:** aut. 2p 50A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 **mm²**
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 **mm²**
Electrode de terre: **type:** PAS ACCES **section:** ?? **mm²**
Interrupteur Diff.: **général:** 2p 63A/300mA **supplémentaire:** 2p 63A/30mA
Schéma unifiliaire et plan de position: ■ voir annexe ☐ **références:** /////
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre
Ne sont pas encore placés: ☐ **cuisine** ☐ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ☐ **compteur d'eau** ☐ **luminaires**
Ne sont pas encore raccordé: **liaison équipotentielle** ☐ **principale** ☐ **supplémentaire**
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** VOIR SCHEMAS

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 10 **MOhm** **Résistance de dispersion:** 11 **Ohm**
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** p.a.

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	Néants
I	Néant

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 0404.312.034
Banque KBC BE97 4053 0205 0149

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions reglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

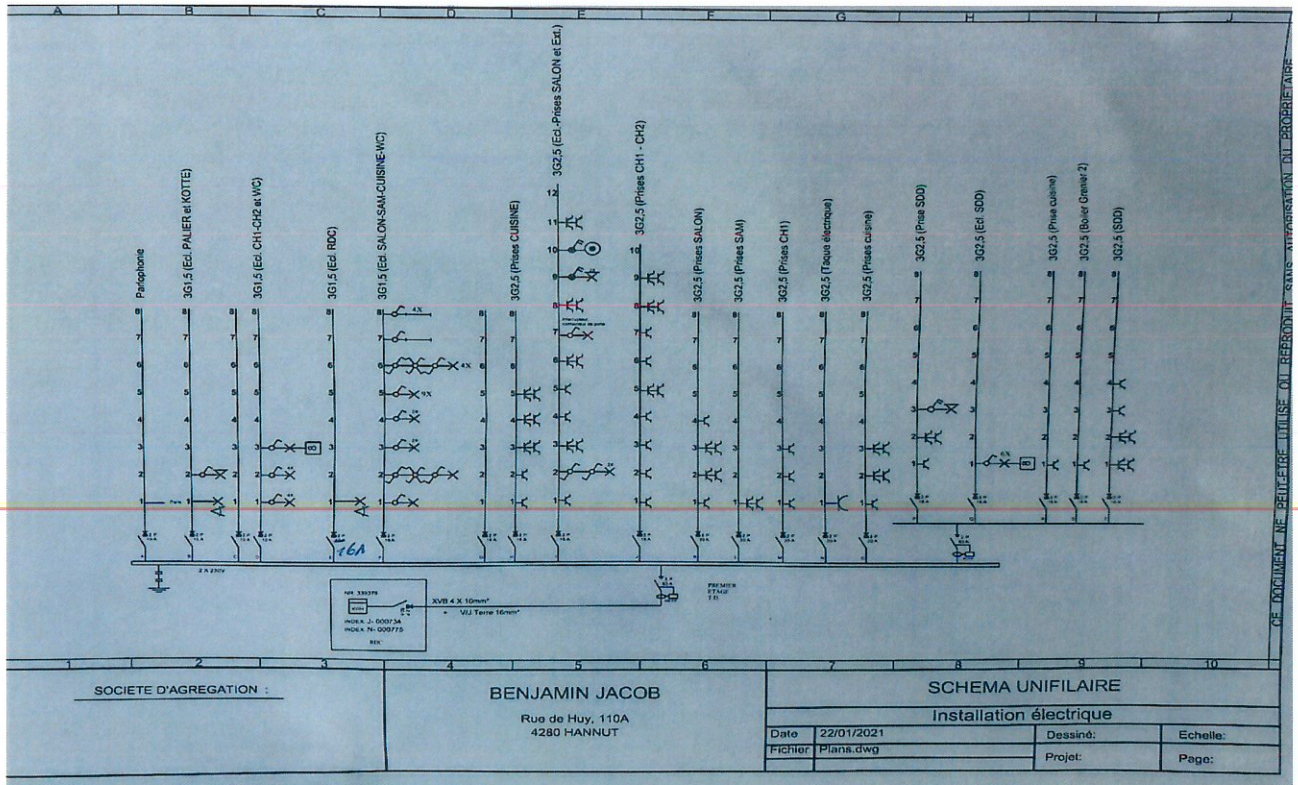

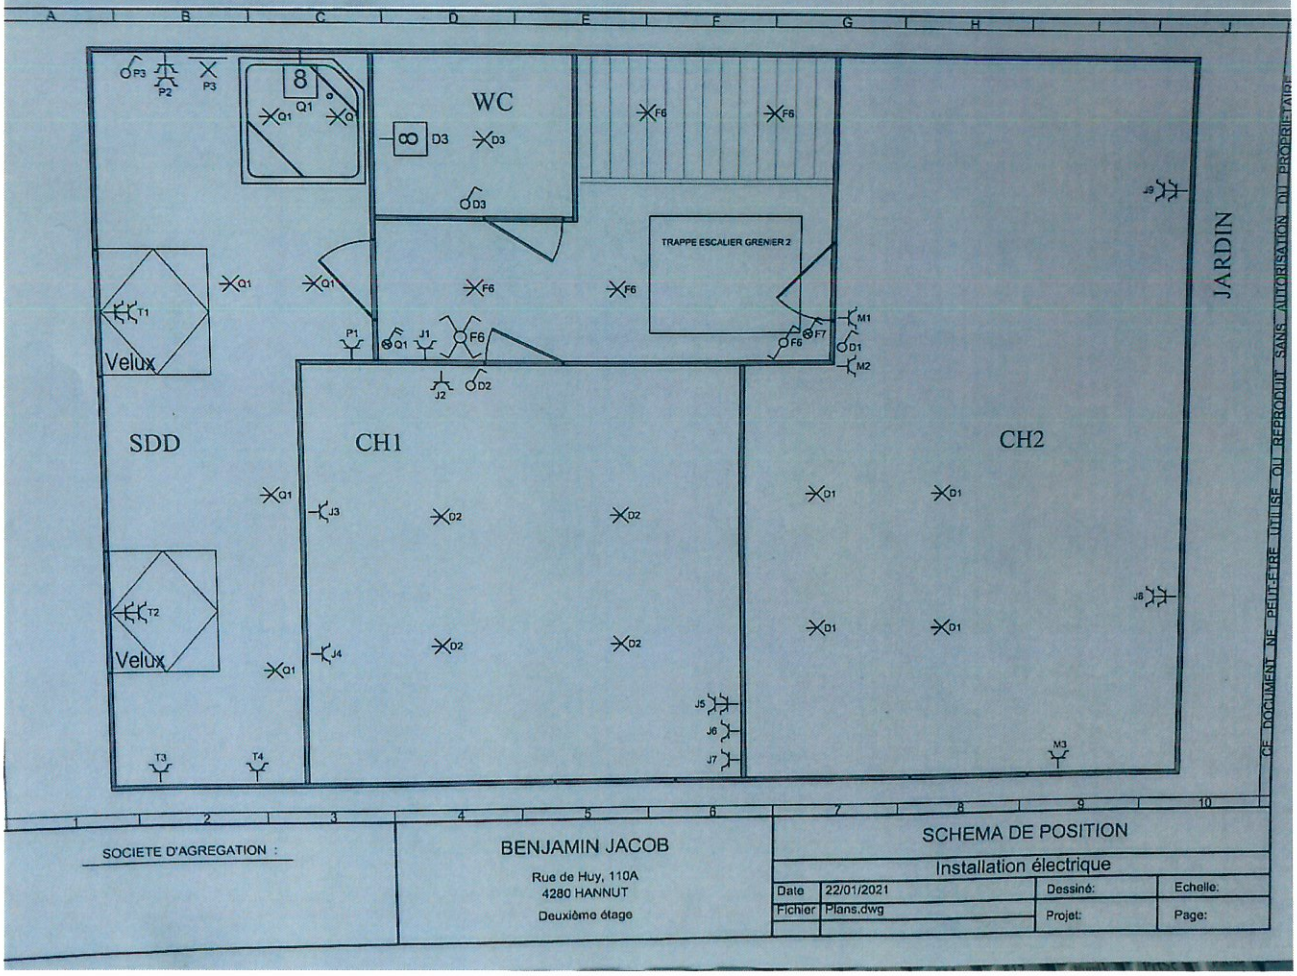

CE DOCUMENT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION DU PROPRIETAIRE

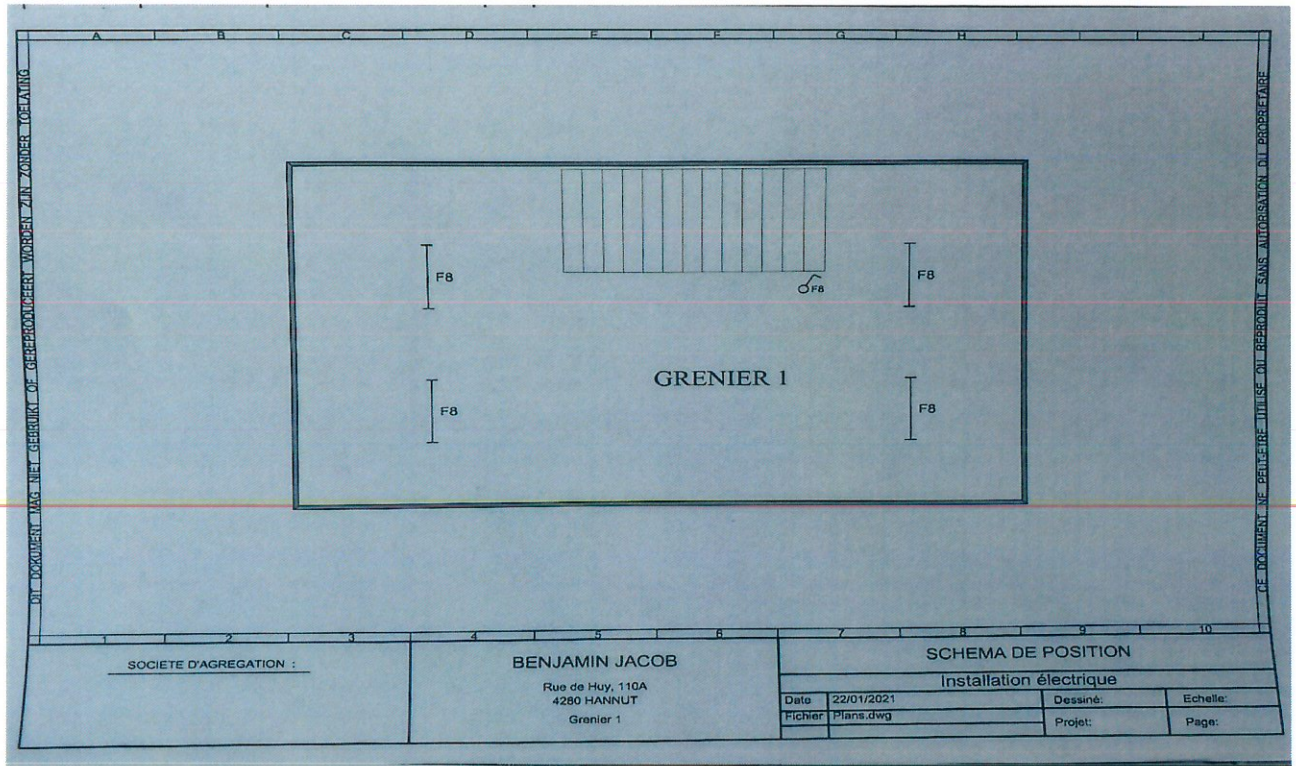
F8
F8
F8
F8
GRENIER 1
SOCIETE D'AGREGATION :
BENJAMIN JACOB
Rue de Huy, 110A
4280 HANNUT
Grenier 1
SCHEMA DE POSITION
Installation électrique
Date 22/01/2021
Fichier Plans.dwg
Dessiné:
Projet:
Echelle:
Page:

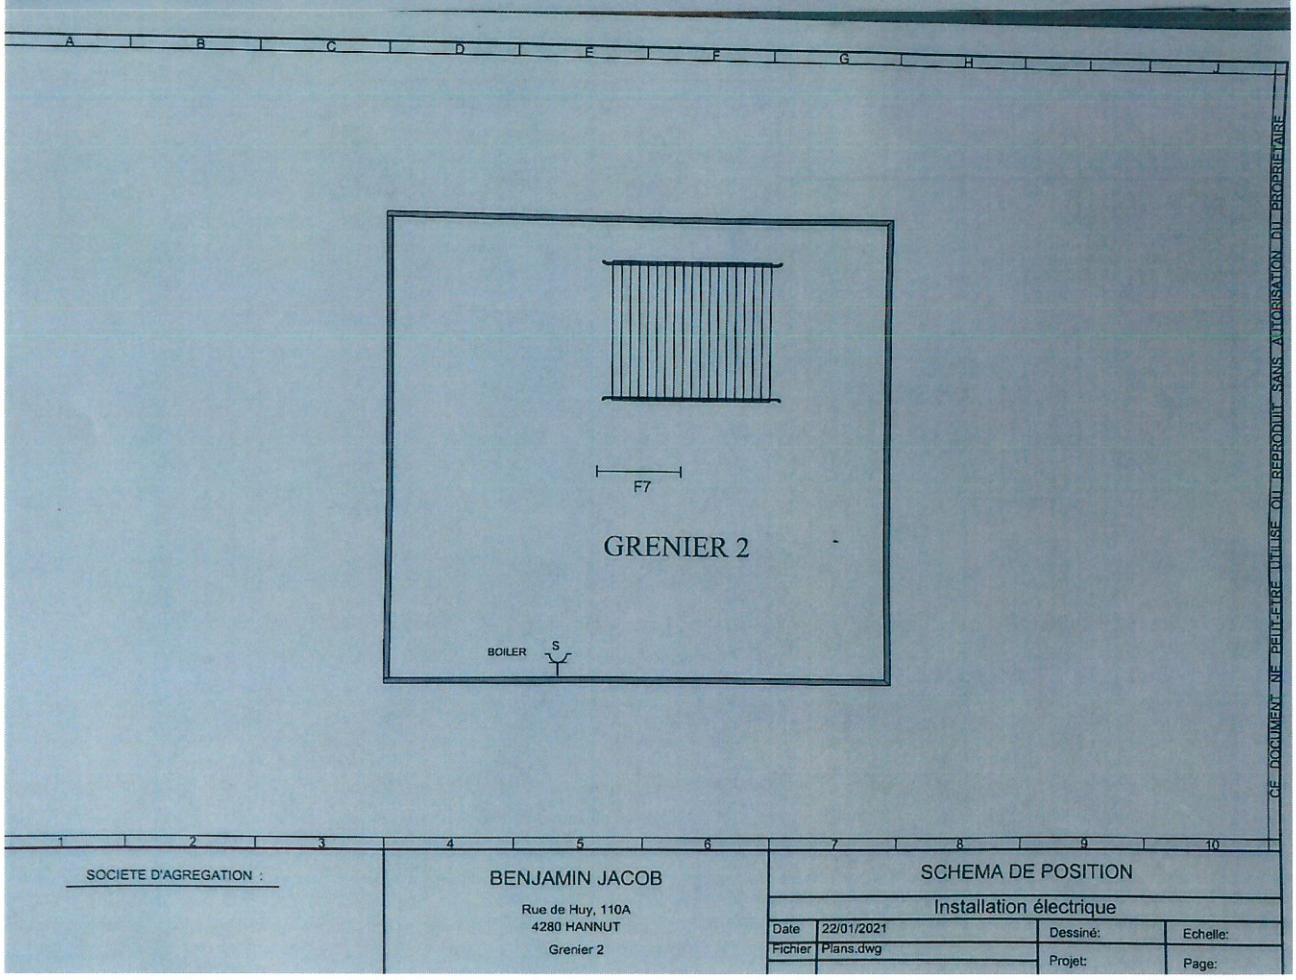
F7
GRENIER 2
BOILER
S
SOCIETE D'AGREGATION :
BENJAMIN JACOB
Rue de Huy, 110A
4280 HANNUT
Grenier 2
SCHEMA DE POSITION
Installation électrique
Date 22/01/2021
Fichier Plans.dwg
Dessiné:
Projet:
Echelle:
Page:

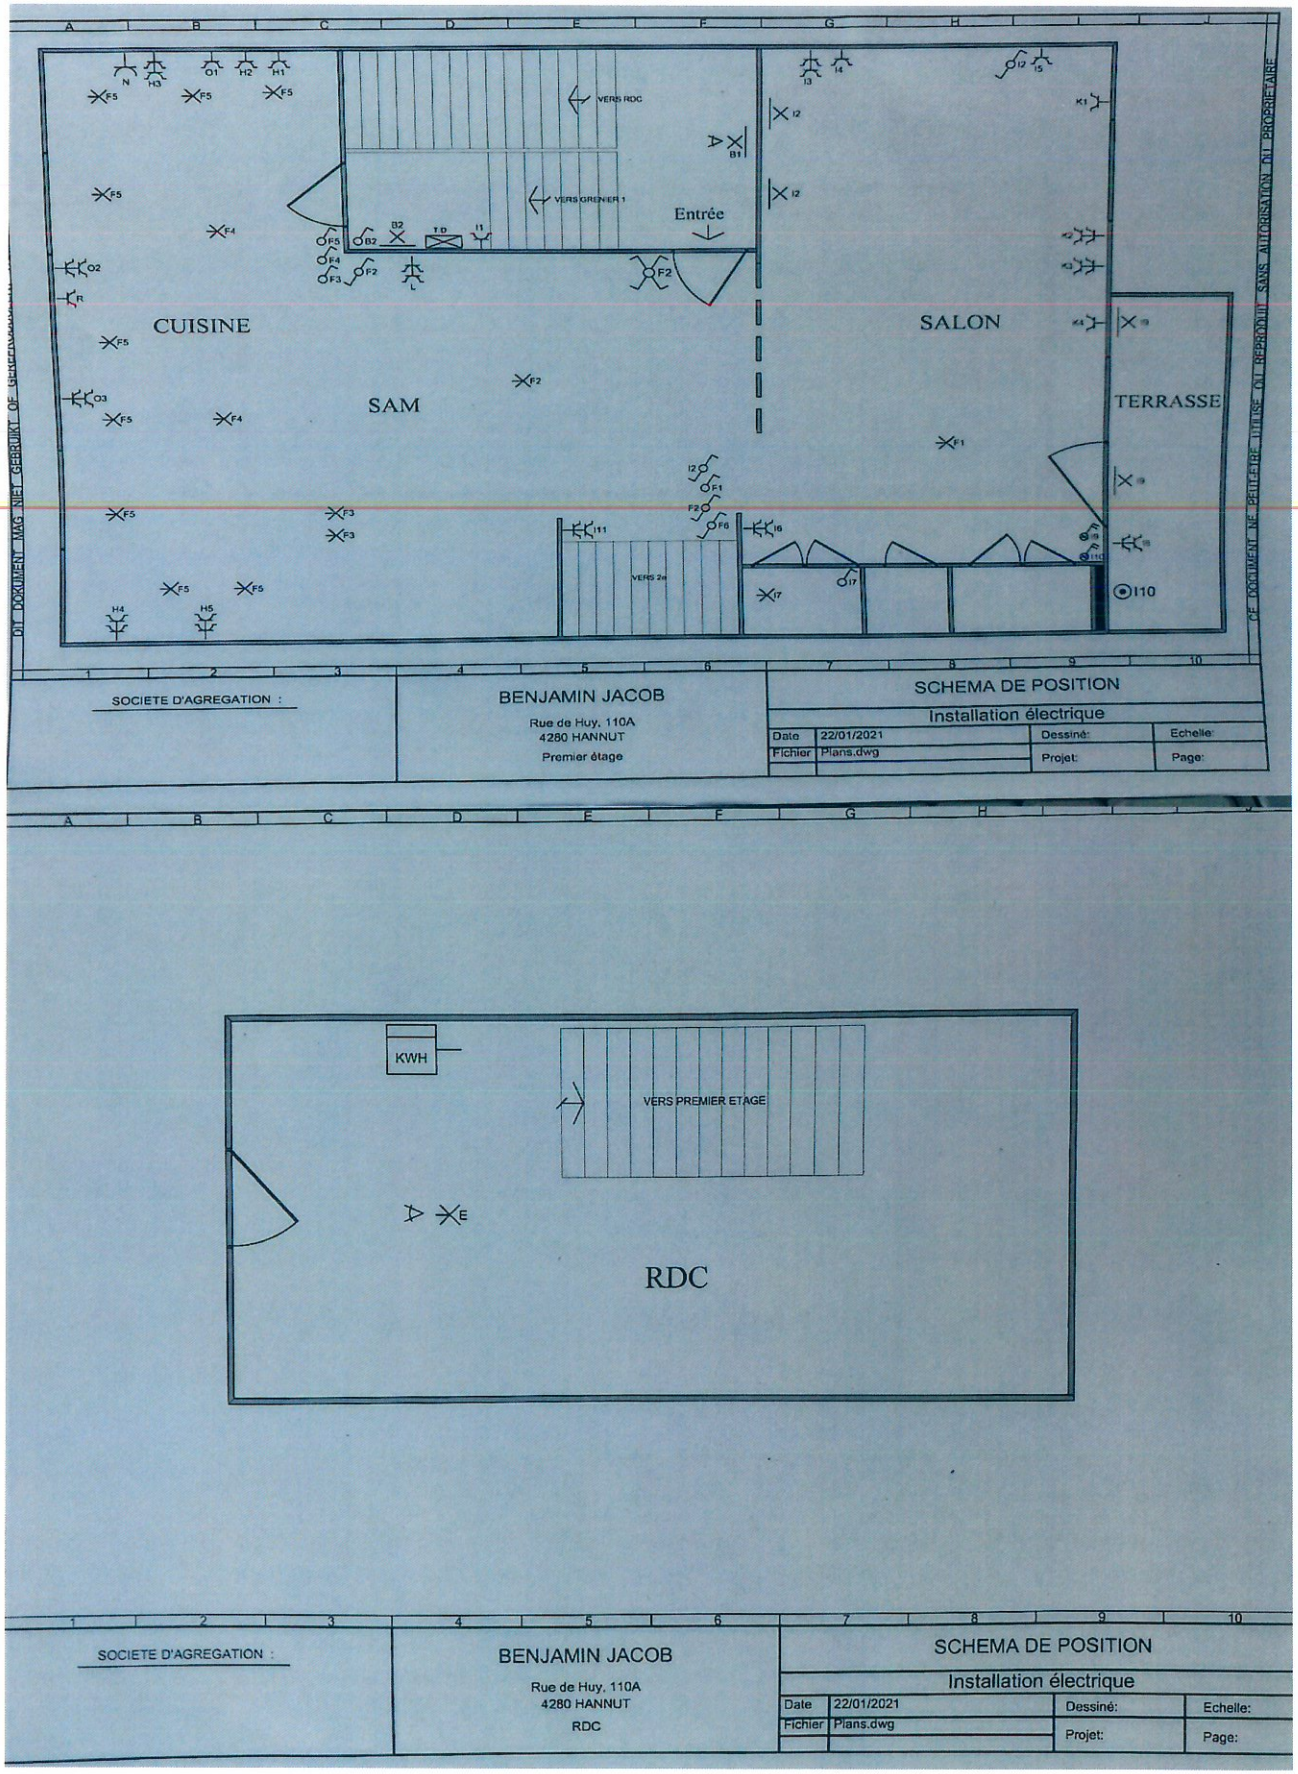
CUISINE
SAM
SALON
TERRASSE
Entrée
VERS RDC
VERS GRENIER 1
VERS 2e
SOCIETE D'AGREGATION :
BENJAMIN JACOB
Rue de Huy, 110A
4280 HANNUT
Premier étage
SCHEMA DE POSITION
Installation électrique
Date 22/01/2021
Fichier Plans.dwg
Dessiné:
Projet:
Echelle:
Page:
KWH
VERS PREMIER ETAGE
RDC
SOCIETE D'AGREGATION :
BENJAMIN JACOB
Rue de Huy, 110A
4280 HANNUT
RDC
SCHEMA DE POSITION
Installation électrique
Date 22/01/2021
Fichier Plans.dwg
Dessiné:
Projet:
Echelle:
Page:
